

ANEXO I – REGISTRO FOTOGRÁFICO LUZIÂNIA



Foto 1 – Visão geral do prédio a ser reformado



Foto 2 – Vista geral do prédio – Fachada frontal – Avenida Sarah Kubitschek



Foto 3 – Acesso de pedestres – Vista externa – Acesso a ser readequado



Foto 4 – Acesso de pedestres – Vista interna – Percurso a ser readequado



Foto 5 – Vista interna – Vaga reservada de veículos com pintura da sinalização a ser retocada



Foto 6 – Jardim lateral ao prédio com mudas a serem removidas



Foto 7 – Calçada no contorno da marquise circular, a ser demolida e reconstruída, com suave inclinação até o nível do piso da marquise e piso a em blocos intertravados



Foto 8 – Acesso de veículos – vista externa



Foto 9 – Passeio Rua 8



Foto 10 – Gradil a receber nova pintura com recuperação de alguns postes



Foto 11 – Partes do gradil a serem recuperadas – Substituição dos postes por novas peças, concretagem do interior, chumbamento, solda aos painéis laterais e nova pintura na cor cinza platina



Foto 12- Substituição da caixa do hidrômetro



Foto 13 – Abrigo do medidor de eletricidade - vedação de trinca na alvenaria, reboco nas partes onde a alvenaria estiver aparente, execução da laje em concreto armado e impermeabilização da mesma



Foto 14 – Fachada posterior – Pintura do gradil na cor cinza platina, reboco e pintura nas muretas abaixo do gradil e texturização da fachada conforme cores especificadas em projeto



Foto 15 – Fachada lateral do bloco III – Aplicação de textura nas fachadas em geral, após remoção das partes com esfarelamento e aplicação de fundo preparador



Foto 16 – Blocos I, II e III – Aplicação de texturas nas fachadas conforme cores especificadas em projeto.



Foto 17 – Muro a receber chapim pré-moldado de concreto e pintura acrílica, na cor branco gelo



Foto 18 – Telhado da marquise circular a ser reconstruído (incluindo calhas e rufos), janela a ser demolida e vão vedado com alvenaria de blocos cerâmicos



Foto 19 – Telhado do Bloco II – Telhas e estrutura sob telhado a serem lavadas com água e sabão neutro para posterior pintura sobre tratamento antiferrugem (estrutura metálica)



Foto 20 – Telhado bloco I – parte central – Instalação de chapim de concreto pré-moldado, substituição de telhado por telhas galvalume e substituição de rufos



Foto 21 – Telhado bloco I – parte lateral - Instalação de chapim de concreto pré-moldado, substituição de telhado por telhas galvalume e substituição de rufos.



Foto 22 - Pilares abaixo da marquise circular – revestimento em pastilhas a ser complementado com peças removidas da fachada lateral do bloco I – parte central. Remoção do revestimento existente abaixo da marquise e aplicação de faixa de 30 cm de massa acrílica e pintura acrílica na cor branco neve



Foto 23 – Blocos I, II e III – Fachadas a receberem textura nas cores indicadas em projeto – Prancha 07/12



Foto 24 – Bloco I – Área de atendimento -
Remoção de esquadria, vedação do vão,
demolição de balcão em tijolo de vidro,
instalação de grades nos vãos das esquadrias

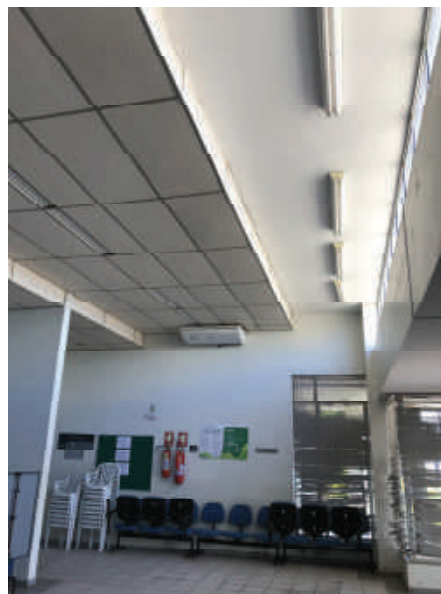


Foto 25-Área de atendimento – Forro mineral a
ser demolido e reconstruído novo forro em gesso
em placas, remoção de persianas para instalação
de grades – Prancha 08/12



Foto 26 – Atendimento Bloco I – Piso e forro a serem demolidos, paredes a serem demolidas e
construídas para adaptações nos banheiros de uso público



Foto 27 – Balcão em tijolo de vidro a ser demolido



Foto 28 – Paredes com umidade ascendente a receber tratamento impermeabilizante com remoção de reboco até a altura de 70 cm e execução de novo revestimento



Foto 29 – Banheiro de uso público, loco I – Pisos, bancadas, divisórias e louças a serem demolidos e reconstruídos com novos materiais



Foto 30 - Banheiros de uso público feminino Bloco I – Piso, revestimento, bancadas a serem demolidos e reconstruídos; torneiras a serem removidas e instaladas nos sanitários de servidores, espelho a ser instalado



Foto 31 – Vão da porta a ser aumentado



Foto 32 – Porta a ser removida, juntamente com portais, vão a ser aumentado e instalada nova porta



Foto 33 – Piso, revestimentos, louças e portas a serem demolidos e reconstruídos; Barras de apoio horizontais a serem reutilizadas – Ver detalhes nas Pranchas 09 e 10/12



Foto 34 – Banheiros de uso público masculino a serem transformados em feminino após reforma - Mictórios a serem removidos e instalações hidrossanitárias isoladas. Barras de apoio ao lado dos mictórios a serem reutilizadas nos boxes acessíveis, instaladas na vertical



Foto 35 – Circulação Áreas administrativas do Cartório – Pisos, Divisórias (2,75 m de altura), portas a serem, demolidos e reconstruídos; portas a serem substituídas por portas de vidro temperado e metálica de uma folha.



Foto 36 – Remoção de eletrocalhas de parede para execução de instalações embutidas



Foto 37- Limpeza de esquadrias com água, sabão neutro e pano macio. Troca de borrachas EPDM



Foto 38 – Circulação entre blocos I e II – Piso a ser demolido e reconstruído; estrutura metálica da cobertura do Bloco II – a ser lavada, lixada, aplicado fundo neutralizador de oxidação e pintura com esmalte sintético, na cor azul del rey



Foto 39 – Marquises/ Beiral das áreas laterais do Bloco I – Recomposição de textura na cor branco gelo, emassamento e pintura acrílicos no teto



Foto 40 – Janela e peitoril/ bancada a serem demolidos para instalação de nova esquadria em vidro temperado de correr e instalação de grade na face interna



Foto 41 – Portas de madeira Bloco II e piso a serem demolidos e reconstruídos – Piso em granitina e portas metálicas



Foto 42 - Copa Bloco II – Piso e revestimento a serem demolidos e reconstruídos; peitoril/ bancada a ser demolido e reconstruído novo peitoril e instalada nova janela



Foto 43 – Piso e revestimentos a serem demolidos e reconstruídos; bancada a ser mantida



Foto 44 – Piso e revestimentos a serem demolidos e reconstruídos; mictórios a serem demolidos e reinstalados novas peças



Foto 45 – Banheiros de servidores Bloco II – Demolição de pisos, revestimentos e divisórias com instalação/assentamento de novos acabamentos; instalação de espelho e novos acessórios; bancada com lavatório a ser mantida e instalado rodamão



Foto 46 – Serviço bloco II – Demolição de pisos e revestimentos, divisórias, troca de louças (bacias sanitária, lavatório, chuveiro)



Foto 47 – Serviço Bloco II – Demolição de piso, revestimento, divisórias, louças e portas de madeira para instalação /assentamentos de novos acabamentos



Foto 48 –Serviço Bloco II – Troca revestimentos, tanque e instalação de novo sifão

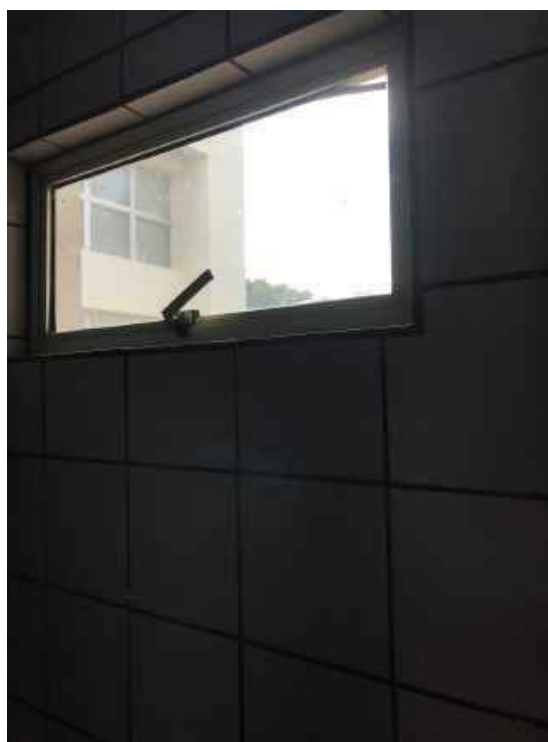


Foto 49 –Serviço Bloco II – Troca de borrachas EPDM e instalação de grades na face interna da esquadria

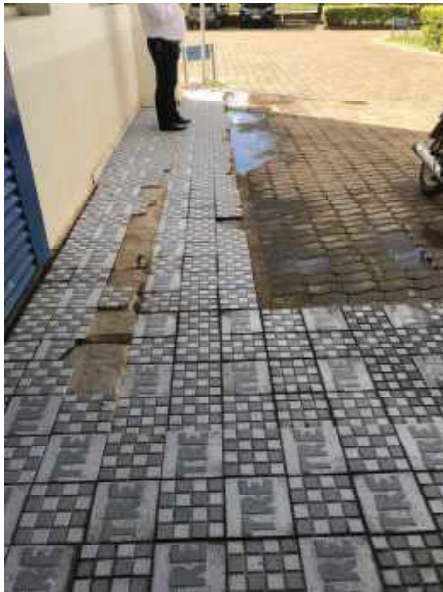


Foto 50 – Depósito de urnas – Recomposição da calçada – Peças em falta devem ser complementadas e quebradas deverão ser substituídas

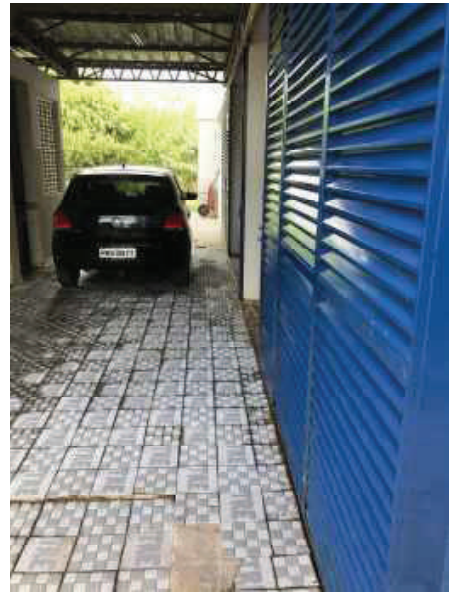


Foto 51 – Portão do depósito de urnas – Bloco III – Restauração da base do portão e nova pintura a ser executada

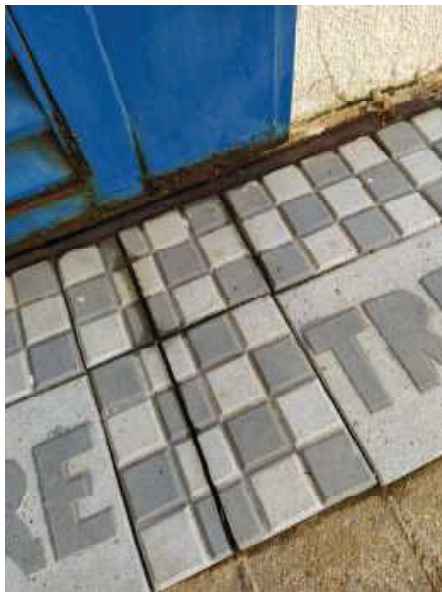


Foto 52 – Portões do depósito de urnas e arquivo no Bloco III – Parte do portão a ser removida e recomposta, Prancha 08/12 (arquitetura)



Foto 53- Portões do depósito de urnas e arquivo no bloco III – Maçanetas a serem substituídas



Foto 54 – Depósito de urnas – Remoção de reboco e tratamento da umidade ascendente. Pintura de paredes e das grades existente

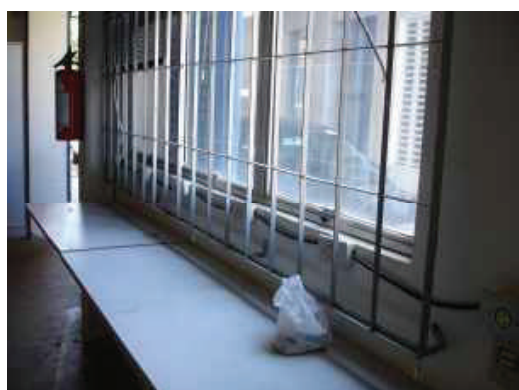


Foto 55 – Bancada de testes de urnas, no Bloco III, a ser demolida e instalada nova bancada em MDF com suporte por mãos francesas em perfil “T”



Foto 56 – Instalações elétricas a serem removidas e executada nova instalação conforme projeto elétrico

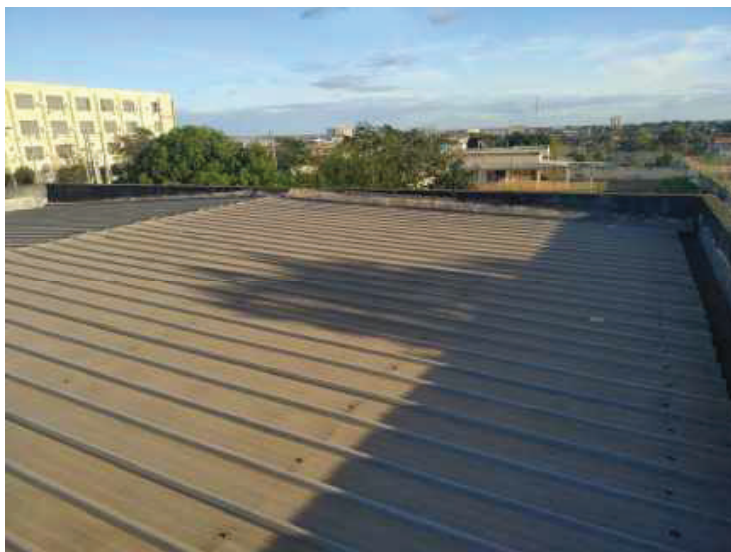


Foto 57 – Bloco III – Depósito de urnas – Acréscimo de altura da platibanda, instalação de chapim de concreto, instalação de telha galvalume. Aplicação de textura acrílica nas cores indicadas em projeto nas faces internas e externas.
