



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
PRAÇA CÍVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiânia - GO - www.tre-go.jus.br

ATA

REUNIÃO CTGTI - 3/2025

1. Identificação

Data: 26/02/2025	Início: 14:40 Término: 15:32	Local: Sala de reunião da STI
Finalidade: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2024		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

4. Pauta

- Questionamentos acerca dos projetos:
 - o Qual é o percentual de execução do projeto?
 - o Que etapa foi executada?
 - o Qual etapa será executada na semana?
 - o Existe alguma observação ou impedimento?
 - o A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados;
- Apresentação do andamento dos processos de aquisição.


5. Participantes

Nome	Cargo	E-mail
Augusto César de Castro Ovelar	Coordenador de Sistemas Corporativos	augusto.ovelar@tre-go.jus.br
Frank Wendell Ribeiro	Secretário de Tecnologia da Informação	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	Coordenador de Sistemas Eleitorais	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Marcos Rogério Santiago	Coordenador de Infraestrutura - Substituto	marcos.santiago@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	Assessor de Planejamento, Governança e Gestão	paulo.taira@tre-go.jus.br


6. Encaminhamentos

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas;
- O projeto Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG foi incluído no programa PDI;
- O projeto ELE24-24-R1-07 - Recolhimento das Urnas Eletrônicas - Eleições 2024 foi concluído;
- A próxima reunião foi agendada para o dia 10/03/2025
 - o Pauta: deliberação sobre os projetos a serem encaminhados para apreciação do CGTIC.

7. Portfólio de projetos

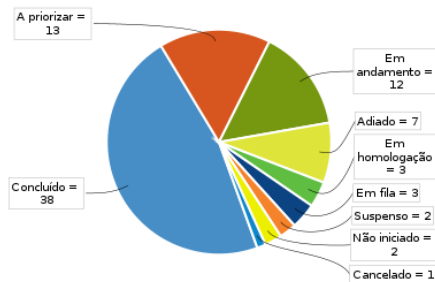

Total: 81 . Gráfico por: Status

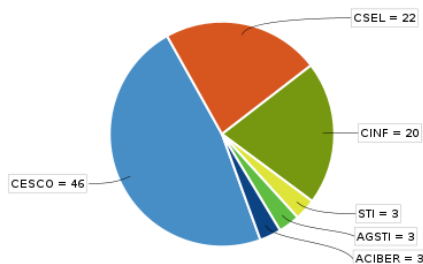

Total: 81 . Gráfico por: Unidade responsável

7.1. Programa: Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos Não iniciados/Em Andamento/Em Homologação

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO	SGP
PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto	Em homologação	80	CESCO	EJE
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em homologação	90	CESCO	SAO
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	30	CESCO	VPCRE
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	50	CESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS
PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição	Em andamento		CESCO	PRES, SGP
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	30	CESCO	STI
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI	Em andamento	80	CESCO	DG
PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes	Em andamento	10	CESCO	STI
PDI-24-R1-N-10 - Eleição dos Dirigentes para os Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores - PT	Em andamento	10	CSEL	DG
PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)	Em andamento	10	CINF	STI

PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG	Em andamento		CSEL	DG
---	--------------	--	------	----

12 itens

7.2. Programa: Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos Não iniciados/Em Andamento/Em Homologação

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
ENS-24-R1-01 - Implementação dos planos de ação pós-avaliação do CISControls	Não iniciado		ACIBER, CESCO, CINF	STI
ENS-24-R1-03 - Implementação de Política de Gestão de Dados no âmbito da STI	Não iniciado		AGSTI, CESCO, CINF, CSEL, STI	STI

2 itens

7.3. Programa: Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos Não iniciados/Em Andamento/Em Homologação

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	30	CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Em andamento	70	CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	80	CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS

3 itens

7.4. Projetos adiados, a priorizar e suspensos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
Automação da Fiscalização de Atos de Pessoal	A priorizar		CESCO	SAUD
Banco de Conhecimento Judicante Eleitoral	A priorizar		CESCO	GBD
Controle de Capacitação da EJE	A priorizar		CESCO	EJE
Informação de dados para alimentação de Planilha	A priorizar		CESCO	SGI
Monitoramento de impressões	A priorizar		CESCO	ATEND
PDI-24-R1-01 - Implementação da nova Legislação Compilada, com as melhorias acrescentadas pelo TSE	A priorizar		CESCO	SGI
PDI-24-R1-02 - Criar a Central de Atendimento Virtual ao Eleitor (CAVE)	A priorizar		CESCO	VPCRE
PDI-24-R1-03 - Plenário Virtual	A priorizar		CESCO	SJD
PDI-24-R1-05 - Desenvolvimento de nova versão do sistema Siapexo	A priorizar	10	CESCO	SAO
Sistema de controle da atualização das informações do Portal da Transparência	A priorizar		CESCO	SGI
Sistema de disponibilização de Acórdãos na internet	A priorizar		CESCO	SGI
Sistema de Gestão de Alimentação de Mesários	A priorizar		CESCO	SAO
Software para leitura e medição do consumo de energia elétrica.	A priorizar		CESCO	ATEND

ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40	CESCO, CINF	STI
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70	ACIBER, CESCO, CINF	STI
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40	CINF	STI
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Adiado	40	CINF	STI
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Adiado	90	CINF, STI	STI
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Adiado	80	CESCO, CINF	STI
PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede sem fio	Adiado	60	CINF	STI
PDI-21-R1-22 - SIS07 - Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Licenças Médicas	Em fila	10	CESCO	SGP
PDI-22-R1-05 - Implantar Banco de Talentos (Portal TSE)	Em fila		CESCO	SGP
PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos	Em fila		CESCO	EJE
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Suspenso	10	CESCO	SGP
PDI-24-R1-06 - Implantação do SEI Federação	Suspenso		CESCO	SGI

25 itens

7.5. Projetos/macro atividades em andamento com término previsto de até 60 dias

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante	Término previsto
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	30	CESCO	VPCRE	30/nov/24
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Em andamento	70	CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	21/fev/25
PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes	Em andamento	10	CESCO	STI	14/mar/25
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI	Em andamento	80	CESCO	DG	28/mar/25
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	80	CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	28/mar/25
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	30	CESCO	STI	31/mar/25
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	50	CESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS	31/mar/25
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	30	CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	31/mar/25

8 itens

7.6. Projetos concluídos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas	Concluído	100	CSEL	STI
ELE24-22-R1-05 - Infraestrutura para o fechamento do cadastro 2024	Concluído	100	CINF	DG
ELE24-22-R1-06 - Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2024	Concluído	100	CSEL	DG
ELE24-22-R1-07 - 14º Simulado Nacional de Hardware (14SNH)	Concluído	100	CSEL	DG
ELE24-24-R1-01 - SNTOTUE2024 - Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna 2024	Concluído	100	CSEL	STI
ELE24-24-R1-02 - TDTOT2024-V - 5º Teste de Desempenho da Totalização 2024	Concluído	100	CSEL	STI
ELE24-24-R1-03 - TDTOT2024-VI - 6º Teste de Desempenho da Totalização 2024	Concluído	100	CSEL	STI
ELE24-24-R1-04 - Envio das urnas eletrônicas	Concluído	100	CSEL	STI
ELE24-24-R1-05 - Carga e Lacre das Urnas	Concluído	100	CSEL	STI
ELE24-24-R1-06 - Geração de Mídias	Concluído	100	CSEL	STI
ELE24-24-R1-07 - Recolhimento das Urnas Eletrônicas - Eleições 2024	Concluído	50	CSEL	STI
ELE24-24-R1-08 - Apuração e Totalização	Concluído	100	CSEL	DG
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Concluído	100	CESCO	STI
ENS-22-R1-08 - Solução de Antivirus	Concluído	100	CINF	STI
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Concluído	100	CINF	STI
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Concluído	100	CINF	STI
ENS-24-R1-04 - Implantação da ferramenta Varonis	Concluído	100	CINF	STI
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Concluído	100	CESCO	SGP
PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO	Concluído	100	STI	SAO
PDI-22-R1-N-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS)	Concluído	100	CESCO	DG
PDI-22-R1-N-57 - Eleição Suplementar de Turvelândia	Concluído	100	CSEL	PRES
PDI-22-R1-N-62 - Implantação do Sistema CERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social	Concluído	100	CESCO	SJD
PDI-22-R1-N-63 - Eleitor do Futuro: Prefeito Estudantil - UNIALFA	Concluído	100	CSEL	DG
PDI-22-R1-N-64 - Eleitor do Futuro: Escola Municipal - Godofredo Perfeito - Ipameri - GO	Concluído	100	CSEL	DG
PDI-22-R1-N-65 - Eleitor do Futuro: 10 Escolas - Vereador Mirim	Concluído	100	CSEL	DG
PDI-22-R1-N-66 - Desenvolvimento de Sistema de Diplomação	Concluído	100	CESCO	STI
PDI-22-R1-N-67 - Implantação do sistema Atena	Concluído	100	CESCO	SJD
PDI-22-R1-N-68 - Eleitor do Futuro: CEPI Maria Rosilda Rodrigues (Eleição Simulada das Personalidades Goianas)	Concluído	100	CSEL	DG

PDI-24-R1-07 - Eleição da Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar de GO e DF	Concluído	100	CSEL	DG
PDI-24-R1-08 - Eleição suplementar de Castelândia	Concluído	100	CSEL	DG
PDI-24-R1-09 - Reabertura do Cadastro Eleitoral	Concluído	100	CINF, CSEL	STI
PDI-24-R1-N-12 - Implantação de Módulo de Consulta Externa dos Processos Administrativos	Concluído	100	CESCO	
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Concluído	100	AGSTI	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Concluído	100	AGSTI	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Concluído	100	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Concluído	100	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Concluído	100	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Concluído	100	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS

38 itens

8. Detalhamento dos projetos

ELE24-24-R1-07 - Recolhimento das Urnas Eletrônicas - Eleições 2024

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/jan/25	20/jan/25	28/fev/25	27/fev/25	CSEL	DG	100

PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE

Descrição							
SEI: 24.0.000003403-3 Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online dos servidores ao seu próprio dossiê funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/21	07/jan/21	29/mar/24		CESCO	SGP	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
Aguardando homologação do sistema pela SGP.	

PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto

Descrição							
SEI nº: 24.0.000007445-0 Adoção de um sistema de votação online E-voto desenvolvido pelo TRE-SC.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	01/mai/24	01/mai/24	31/mar/25		CESCO	EJE	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
O término previsto foi alterado para 31/03/2025. Em homologação pela unidade demandante.	

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)

Descrição							
Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal. Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	29/abr/22	29/abr/22	26/abr/24		CESCO	SAO	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Análise de requisitos	Concluído
Desenvolvimento funcionalidades	Concluído
Testes de funcionalidades	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Em andamento
Observações	
Em fase de elaboração do termo de homologação para envio à unidade demandante; O término previsto foi alterado para 26/04/2024.	

PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória

Descrição							
SEI 23.0.000002275-6 Finalidade: desenvolvimento de uma solução informatizada para o controle de informações judiciais relacionadas a medidas que envolvem gestão e destinação de valores oriundos de fianças e penas pecuniárias. Ao final, haverá a conversão do controle dos registros manuais em livros de guarda obrigatória pelos cartórios eleitorais para meio eletrônico.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	30/ago/23	30/ago/23	30/nov/24		CESCO	VPCRE	30

Atividades	Situação
Levantamento de requisitos	Concluído

Desenvolvimento da etapa I do sistema	Em andamento
Disponibilização do módulo I do sistema em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
O projeto teve o seu andamento retomado.	

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Descrição							
http://wp.tre-go.jus.br/							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento		07/nov/22	31/mar/25		CESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS	50

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela equipe de desenvolvimento	Em andamento
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
O término previsto foi alterado para 31/05/2025. A demanda necessita de uma comissão multidisciplinar com representantes das áreas de negócio para gerir o projeto.	

PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento			30/mai/25		CESCO	PRES, SGP	

Observações							
Após reunião com a unidade demandante ficou definido que será retirado um aparelho de leitura facial para realização de teste. O término previsto foi definido para 30/05/2025, conforme informado pela unidade demandante no formulário da ASPLAN.							

PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jun/23	01/jun/23	31/mar/25		CESCO	STI	30

Atividades	Situação
Instalação/ativação da feature	Concluído
Implementação das primeiras funcionalidades	Não iniciado
Testes em ambiente real	Em andamento
Aplicação em ambiente virtual	Em andamento
Estudos sobre as funcionalidades	Em andamento

Observações
O término previsto foi alterado para 31/03/2025. Será agendada uma reunião com a ASPLAN para definição da classificação dos dados a serem protegidos no escopo do projeto.

PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI

Descrição							
SEI: 23.0.000016671-5							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	16/fev/24	16/fev/24	28/mar/25		CESCO	DG	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Levantamento de requisitos	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Realização de testes pela equipe técnica	Em andamento
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
O módulo de peticionamento desenvolvido pela Anatel apresenta vulnerabilidades. Vários TREs e o TSE deixaram de utilizá-lo. A equipe da CESCO está testando solução que está em desenvolvimento no TSE para o peticionamento. O sistema retornou para o status Em andamento em razão dos motivos acima. O término previsto foi alterado para 28/03/2025.	

PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	19/ago/24	19/ago/24	14/mar/25		CESCO	STI	10

Atividades	Situação
Planejamento	Em andamento
Criação e configuração de ambiente de teste interno	Em andamento
Criação e configuração do ambiente de testes em nuvem	Suspenso
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
A reunião que estava agendada para o dia 20/11 entre as equipes da CINF e CESCO será reagendada para a partir do dia 10/12, em razão do comprometimento das equipes com o desenvolvimento do sistema de diplomação.	

PDI-24-R1-N-10 - Eleição dos Dirigentes para os Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores - PT

Descrição							
SEI Nº 24.0.000019889-3							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	03/fev/25	03/fev/25	31/jul/25		CSEL	DG	10

Atividades	Situação
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Em andamento
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade - até 5 dias depois do pedido	Concluído
Configuração da Eleição - duração de 10 dias	Não iniciado
Elaboração do Acordo de Colaboração - 10 dias após o pedido	Não iniciado
Entrega da Base de Candidatos - 15 dias antes da eleição	Não iniciado
Entrega da Base de Eleitores - 15 dias antes da eleição	Não iniciado
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores) - 10 dias antes da eleição	Não iniciado
Entrega das Listas de Eleitores - 10 dias antes da eleição	Não iniciado
Geração de Mídias - 01 dia antes da carga e lacre	Não iniciado
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas - até antevéspera da eleição	Não iniciado
Retirada das Urnas Eletrônicas - até a véspera da eleição	Não iniciado
Suporte às Eleições - no dia da eleição	Não iniciado
Devolução das Urnas Eletrônicas - até 2 dias após a eleição	Não iniciado

PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	03/fev/25	03/fev/25	30/abr/25		CINF	STI	10

PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	21/fev/25		09/mai/25		CSEL		10

Atividades	Situação
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade - até 5 dias depois do pedido	Em andamento
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Em andamento
Configuração da Eleição - duração de 10 dias	Não iniciado

ENS-24-R1-01 - Implementação dos planos de ação pós-avaliação do CISControls

Descrição							
SEI: 24.0.000006319-0							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Não iniciado	01/abr/25		19/dez/25		ACIBER, CESCO, CINF	STI	

Atividades	Situação
Planejamento	Não iniciado
Elaboração dos planos de ação	Não iniciado
Execução das atividades definidas	Não iniciado

ENS-24-R1-03 - Implementação de Política de Gestão de Dados no âmbito da STI

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
----------	-----------------	-------------	------------------	--------------	---------------------	--------------------	-----------

Não iniciado	01/abr/25		19/dez/25		AGSTI, CESCO, CINF, CSEL, STI	STI	
--------------	-----------	--	-----------	--	-------------------------------	-----	--

Atividades	Situação
Planejamento	Não iniciado
Elaboração da minuta do documento normativo	Não iniciado
Mapeamento do processo de trabalho	Não iniciado
Aprovação do documento normativo	Não iniciado
Implantação do documento normativo	Não iniciado

PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.

Descrição							
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	31/mar/25		CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	30

Atividades	Situação
Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	Em andamento
Observações	
O término previsto foi alterado para 31/03/2025. Reunião do dia 14/11/2024 entre as equipes da CINF e CESCO será reagendada.	

PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/24		21/fev/25		CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	70

Atividades	Situação
Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ Resolução 335/2020 na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados	Concluído
Elaboração do Termo de Referência	Concluído
Realização da licitação	Em andamento
Observações	
O término previsto foi alterado para 21/02/2025.	

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

Descrição

Objetivo da demanda:

Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.

Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

A falta catalogação dos ativos de TI, tanto *hardware* quanto *software*, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataques cibernéticos de qualquer natureza.

Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Gestão de TI e apoio à Governança

Desenvolvimento e administração de soluções de TIC

Gestão de infraestrutura de TIC

Suporte técnico das soluções de TIC

Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

1. Visibilidade de todo o parque de *hardware* do Tribunal.

2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional.

3. Visibilidade de todos os *softwares* em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.

Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados

Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados.

Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026

Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):**Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?**

Não

Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:**Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):**

Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em *Software Livre*, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	28/mar/25		CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Aquisição da solução	Concluído
Implementação de protocolo seguro SNMP com https no OCS.	Concluído
Instalação e configuração da solução	Concluído
Implantação	Concluído
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	Em andamento
Observações	
O término previsto foi alterado para o dia 28/03/2025.	



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 06/03/2025, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 06/03/2025, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 07/03/2025, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ROGÉRIO SANTIAGO, CHEFE DE SEÇÃO**, em 07/03/2025, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **AUGUSTO CÉSAR DE CASTRO OVELAR, COORDENADOR(A)**, em 07/03/2025, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1054898** e o código CRC **598D8695**.

25.0.000001155-2

1054898v7

