



ATA

Reunião do Comitê Técnico Gestor de TI (CTGTI) - 7/2025

1. Identificação

Data: 15/04/2025	Início: 14:40 Término: 15:40	Local: Sala de reunião da STI
Finalidade: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2024		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

4. Pauta

- Questionamentos acerca dos projetos:
 - Qual é o percentual de execução do projeto?
 - Que etapa foi executada?
 - Qual etapa será executada na semana?
 - Existe alguma observação ou impedimento?
 - A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados;
- Apresentação do andamento dos processos de aquisição.

5. Participantes

Nome	Cargo	E-mail
Augusto César de Castro Ovelar	Coordenador de Sistemas Corporativos	augusto.ovelar@tre-go.jus.br
Frank Wendell Ribeiro	Secretário de Tecnologia da Informação	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Marcilio Zaccarelli Bersaneti	Coordenador de Infraestrutura	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	Coordenador de Sistemas Eleitorais	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	Assessor de Planejamento, Governança e Gestão	paulo.taira@tre-go.jus.br


6. Encaminhamentos

O Comitê Técnico Gestor de TI (CTGTI) estabeleceu direcionamento para o acompanhamento do portfólio de projetos de responsabilidade da STI, de acordo com os seguintes critérios:


- A execução dos projetos que envolvem o desenvolvimento ou implantação de sistemas informatizados estará condicionada à capacidade operacional das equipes:
 - Seção de Desenvolvimento e Implantação de Sistemas (SEDIS): 2 (dois) projetos simultâneos;
 - Seção de Administração e Inteligência de Dados (SEAD): 1 (um) projeto;
 - Seção de Suporte aos Sistemas Corporativos (SESCO): 1 (um) projeto.
- Serão acompanhados apenas os projetos que estiverem com os status: Em andamento, Em Fila, Em homologação e Sobrestados;
 - Descrição dos status dos projetos:
 - Em andamento: projeto em execução;
 - Em Fila: próximo projeto priorizado a ser executado;
 - Em homologação: projeto em fase de aceite/aprovação por parte da unidade demandante;
 - Sobrestado: projeto que teve o seu andamento interrompido temporariamente, aguardado ação de unidade(s) externa(s) à STI.
- O Coordenador de Infraestrutura solicitou a inclusão dos projetos abaixo no portfólio:

- PDI-24-R1-N-24 - Customização da solução GLPI para uso como ITSM;
- PDI-24-R1-N-26 - Implantação de solução de virtualização;
- PDI-24-R1-N-25 - Implantação de equipamentos e softwares nos Datacenters da JE-GO;
- PDI-24-R1-N-27 - Implantação do Windows 11 nos PCs/Notebooks da JE-GO.
- O Coordenador de Sistemas Eleitorais solicitou a inclusão do projeto Manutenção preventiva das urnas eletrônicas no programa Suporte às Eleições 2026;
- Dessa forma, teremos 21 (vinte e um) projetos a serem acompanhados quinzenalmente, sendo 16 (dezesesseis) priorizados pelo CTGTI nas reuniões ocorridas nos dias 21/03/2025 e 02/04/2025 e 5 (cinco) na reunião do dia 15/04/2025;
- Do portfólio anterior, restaram 22 (vinte e dois) projetos com os seguintes status: A priorizar (9), Suspenso (5), Adiado (4), Em Análise (4). Estes, não serão acompanhados pois farão parte de uma relação de iniciativas que dependerão de priorização pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC), em momento oportuno.
- Os registros de informações detalhadas dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas.

7. Gráficos do Portfólio de Projetos

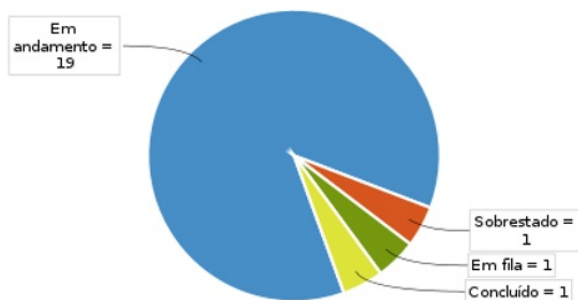

Total: 22 . Gráfico por: Status

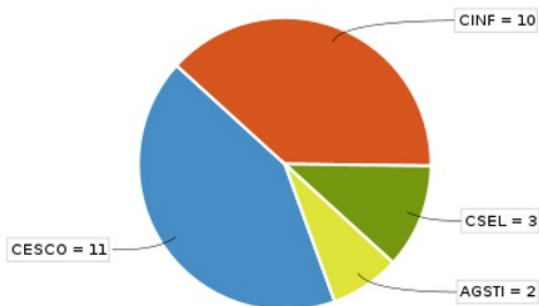

Total: 22 . Gráfico por: Unidade responsável

7.1. Relação sintética dos projetos

Descrição	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
ELE26-25-R1-01 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	Em andamento	40	CSEL	DG
PDI-24-R1-N-24 - Customização da solução GLPI para uso como ITSM	Em andamento	50	CINF	CINF
PDI-24-R1-N-26 - Implantação de solução de virtualização	Em andamento	40	CINF	CINF
PDI-24-R1-N-25 - Implantação de equipamentos e softwares nos Datacenters da JE-GO	Em andamento	40	CINF	CINF
PDI-24-R1-N-27 - Implantação do Windows 11 nos PCs/Notebooks da JE-GO	Em andamento	20	CINF	CINF
PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan	Em andamento	90	CESCO	INTEGRAZONAS
PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho	Em andamento	20	CESCO	SGP
PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG	Em andamento	50	CSEL	DG
PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)	Em andamento	40	CINF	STI

22 itens

Descrição	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante	Término previsto
PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG	Em andamento	50	CSEL	DG	09/mai/25
PDI-24-R1-06 - Implantação do SEI Federação	Em andamento	60	CESCO	SJD	14/mai/25
PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan	Em andamento	90	CESCO	INTEGRAZONAS	15/mai/25
PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho	Em andamento	20	CESCO	SGP	20/jun/25
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Em andamento	30	AGSTI, CINF	CGSI	30/jun/25
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	80	CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	30/jun/25

6 itens

ELE26-25-R1-01 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas

Atividades	Situação
Realização do 1º Run In 2025	Em andamento
Realização do 2º Run In 2025	Não iniciado
Realização do 3º Run In 2025	Não iniciado
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 1º Lote (Qtde: 0)	Não iniciado
Certificação das Urnas 2022 - 1º Lote (Qtde: 0)	Não iniciado
Realização do 1º Run In 2026	Não iniciado
Realização do 2º Run In 2026	Não iniciado

Descrição

Adequação da solução GLPI para uso como ITSM.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	10/abr/25	10/abr/25	31/jul/25		CINF	CINF	50

Atividades	Situação
Instalação da solução GLPI.	Concluído
Customização da solução GLPI para uso como ITSM.	Em andamento

PDI-24-R1-N-26 - Implantação de solução de virtualização

Descrição
Estudo de soluções de virtualização existentes no mercado e contratação do VmWare.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	31/jan/25	31/jan/25	31/jul/25		CINF	CINF	40

Atividades	Situação
Testes com a solução Microsoft.	Em andamento
Testes com a solução Suse.	Em andamento
Contratação do Vmware (licenciamento como serviço).	Em andamento

Observações
A equipe técnica da SESRE finalizou a integração do system center VMM com hyperv e realizará a atualização do netbackup.

PDI-24-R1-N-25 - Implantação de equipamentos e softwares nos Datacenters da JE-GO

Descrição
Instalação de equipamentos e softwares nos Datacenters deste Regional.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	03/fev/25	03/fev/25	30/set/25		CINF	CINF	40

Atividades	Situação
Instalação dos storages IBM.	Em andamento
Instalação de 5 servidores Lenovo.	Em andamento
Aquisição do restante dos equipamentos necessários para o funcionamento dos Datacenters.	Em andamento

PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan

Descrição
SEI nº: 22.0.000007683-3

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	10/mar/25	10/mar/25	15/mai/25		CESCO	INTEGRAZONAS	90

Atividades	Situação
Instalação e configuração	Concluído
Testes e homologação	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
Aguardando homologação pela unidade demandante.

PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	14/abr/25	14/abr/25	20/jun/25		CESCO	SGP	20

Atividades	Situação
Planejamento	Em andamento
Desenvolvimento	Não iniciado
Realização de teste pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação pela unidade demandante	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
Em fase de análise das funcionalidades.

PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	21/fev/25	24/fev/25	09/mai/25		CSEL	DG	90

Atividades	Situação
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade - até 5 dias depois do pedido	Concluído
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Concluído
Elaboração da Minuta do Acordo de Colaboração	Concluído
Recebimento da base de Eleitores	Concluído
Recebimento da base de Candidatos	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Validação das Bases de candidatos, eleitores e seções	Concluído
Entrega das Listas de Eleitores	Concluído
Geração das Mídias	Concluído
Carga e Lacre das urnas eletrônicas	Concluído
Retirada das urnas eletrônicas	Concluído
Suporte no dia da Eleição	Não iniciado
Devolução das urnas eletrônicas	Não iniciado

PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	03/fev/25	03/fev/25	25/jul/25		CINF	STI	40

Atividades	Situação
Realização de testes com o keycloak	Em andamento
Inserção de sistemas no Portal	Em andamento

PDI-24-R1-N-10 - Eleição dos Dirigentes para os Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores - PT

Descrição							
SEI Nº 24.0.000019889-3							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	03/fev/25	03/fev/25	08/jul/25		CSEL	DG	20

Atividades	Situação
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Concluído
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade	Concluído
Elaboração do Acordo de Colaboração	Em andamento
Entrega da Base de Candidatos	Não iniciado
Entrega da Base de Eleitores	Não iniciado
Configuração da Eleição	Não iniciado
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Não iniciado

Entrega das Listas de Eleitores	Não iniciado
Geração de Mídias	Não iniciado
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Retirada das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Suporte às Eleições	Não iniciado
Devolução das Urnas Eletrônicas - até 2 dias após a eleição	Não iniciado

Observações
Aguardando o encaminhamento de informações pelo demandante.

PDI-24-R1-N-20 - Controle de Capacitação da EJE

Descrição
SEI: 24.0.000019107-4 Objetivo do Sistema: Promover o registro e o controle dos inscritos em todas as capacitações da EJE. Serviço a ser transformado digitalmente: Serviço de admissão e registro de inscrições Serviço de controle da frequência dos inscritos Serviço de emissão de certificados com controle de autenticidade. Proposta resumida: Desenvolvimento de aplicativo/software que registre e controle todas as etapas do processo de capacitação da EJE.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	31/dez/24	07/abr/25	31/jul/25		CESCO	EJE	10

Atividades	Situação
Formalização da demanda	Concluído
Desenvolvimento	Em andamento
Testes e conclusão	Não iniciado

Observações
Em fase de especificação da etapa de inscrição; Término previsto alterado para 31/07/2025.

PDI-24-R1-N-15 - Sistema de Gestão de Alimentação de Mesários

Descrição
SEI: 24.0.000019107-4 Objetivo do Sistema: Confecção, por meio de sistema informatizado, de lista de pagamento do benefício alimentação de mesários e colaboradores de cada uma das zonas eleitorais, para a sua melhor gestão. Serviço a ser transformado digitalmente: Serviço de criação de lista de pagamento para alimentação de mesários e colaboradores a serem pagos por pix e em dinheiro. Proposta resumida: A forma de distribuição de alimentação de mesários vem ao longo dos anos modificando. Desde 2022, surgiu a possibilidade de pagamento por pix. Esse serviço vem sendo realizado centralizadamente na AGSAO por meio de planilhas e de forma manual e interação com as zonas eleitorais, para excluir nomes, incluir nomes, pagar algumas pessoas por pix, outras por dinheiro. Considerando que essa atividade gera diversos riscos financeiros, inclusive para a imagem do Tribunal, faz-se necessário a criação de sistema que possibilite esse gerenciamento pela própria zona eleitoral, permitindo que ela trate os dados de sua zona eleitoral e, ao final, gere lista de pagamento, podendo ser pago por unidade Centralizada deste Tribunal

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	17/mar/25		28/nov/25		CESCO	SAO	10

Atividades	Situação
Formalização da demanda	Concluído
Desenvolvimento	Em andamento
Testes e conclusão	Não iniciado

Observações
Em fase de especificação dos requisitos. Modelagem do processo pela unidade demandante. Término previsto alterado para 28/11/2025.

PDI-24-R1-06 - Implantação do SEI Federação

Descrição
SEI: 24.0.000007689-5 Trata-se de um projeto gerenciado pelo TSE, onde existe uma sequência de disponibilização para os Regionais.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento			14/mai/25		CESCO	SJD	60

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Atualização do SEI para a versão 4.1	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Em homologação
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
O projeto teve o seu andamento retomado. Foi concluída a integração com o TSE e TRE-SE.

PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	19/ago/24	19/ago/24	19/dez/25		CESCO	STI	10

Atividades	Situação
Planejamento	Em andamento
Criação e configuração de ambiente de teste interno	Em andamento
Criação e configuração do ambiente de testes em nuvem	Suspensão
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
Em fase inicial de instalação da arquitetura. Término previsto alterado para 19/12/2025.

ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos

Descrição
O uso de recursos criptográficos visa proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos pelas redes de computadores, assim como dos dados em repouso, armazenados em servidores, microcomputadores, dispositivos móveis e bancos de dados.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/25		CESCO, CINF	CGSI	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.	Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Linux.	Concluído
Implantação de criptografia em conexões VPN.	Concluído
Implantação de criptografia do Portal de acesso externo - escritório remoto.	Concluído
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS	Concluído
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS	Concluído
Implantação de criptografia em notebooks standalone	Concluído
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.	Concluído
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores	Em andamento
Implantação da criptografia de dados armazenados nos novos storages IBM.	Em andamento
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores de aplicação e de Bancos de dados.	Em andamento

Mapeamento do processo de certificação de sites e sistemas de informação	Não iniciado
--	--------------

Observações
Aguardando a aquisição de outros equipamentos para finalização da implantação do storage.

ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)

Descrição
Dispõe sobre as regras e os procedimentos para a realização da gestão e monitoramento de registro de atividades (logs) no ambiente computacional do TRE-GO.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	31/out/25		AGSTI, CINF	CGSI	40

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração das minutas dos documentos normativos.	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Em andamento
Aprovação da norma e do procedimento.	Não iniciado
Implantação da norma e do procedimento.	Não iniciado

Observações
Aguardando apresentação pela ACIBER a partir do dia 05/05/2025.

ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	30/jun/25		AGSTI, CINF	CGSI	30

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Não iniciado
Transferência de conhecimento	Não iniciado
Implantação	Não iniciado

Observações
O projeto teve o seu andamento retomado em função de solicitação do TSE para implementação do referido normativo; O término previsto foi alterado para o dia 30/06/2025.

PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória

Descrição
SEI 23.0.000002275-6 Finalidade: desenvolvimento de uma solução informatizada para o controle de informações judiciais relacionadas a medidas que envolvem gestão e destinação de valores oriundos de fianças e penas pecuniárias. Ao final, haverá a conversão do controle dos registros manuais em livros de guarda obrigatória pelos cartórios eleitorais para meio eletrônico.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	30/ago/23	02/abr/25	28/nov/25		CESCO	VPCRE	30

Atividades	Situação
Levantamento de requisitos	Concluído
Desenvolvimento da etapa I do sistema	Em andamento
Disponibilização do módulo I do sistema em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
Em fase de desenvolvimento das funcionalidades previstas na sprint1; Será agendada reunião com o representante da unidade demandante para apresentação da primeira versão do sistema.

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

Descrição Objetivo da demanda: Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados. Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta): A falta catalogação dos ativos de TI, tanto <i>hardware</i> quanto <i>software</i>, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataque cibernéticos de qualquer natureza. Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)? Gestão de TI e apoio à Governança Desenvolvimento e administração de soluções de TIC Gestão de infraestrutura de TIC Suporte técnico das soluções de TIC Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução): 1. Visibilidade de todo o parque de <i>hardware</i> do Tribunal. 2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional. 3. Visibilidade de todos os <i>softwares</i> em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades. Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada): Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados. Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026 Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico): Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante? Não Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda: Custo (Informe a estimativa de custo do projeto): Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em <i>Software</i> Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	30/jun/25		CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Aquisição da solução	Concluído
Implementação de protocolo seguro SNMP com https no OCS.	Concluído
Instalação e configuração da solução	Concluído
Implantação	Concluído
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	Em andamento

Observações Em fase de análise do CMDB do GLPI; Término previsto alterado para 30/06/2025.
--

PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.

Descrição https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496
--

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	07/jan/22	07/jan/22	31/mar/25	31/mar/25	CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	30

Atividades	Situação
Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	Concluído

Observações A parte de sistemas judiciais foram integradas com o SSO do CNJ por meio do TSE; A parte de sistemas administrados pelo TRE-GO está sendo integrada com o keycloak.

Cadastro de Terceirizados

Descrição

SEI: 25.0.000002881-1
Construção de sistema para gerenciamento do cadastro de Terceirizados do Tribunal. Vide Termo de Abertura de Projeto em anexo.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em fila					CESCO	ASPLAN	

PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição

Descrição
SEI: 25.0.000002881-1
Construção de sistema para gerenciamento do cadastro de Terceirizados do Tribunal. Vide Termo de Abertura de Projeto em anexo.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Sobrestado			30/mai/25		CESCO	PRES, SGP	50

Observações
O status do projeto foi alterado para “Sobrestado” na última reunião do CTGTI ocorrida no dia 02/04/2025, a fim de aguardar a aquisição dos leitores biométricos.

-  Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 07/05/2025, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
-  Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 07/05/2025, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
-  Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 08/05/2025, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
-  Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 12/05/2025, às 10:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1100240** e o código CRC **56DF9E30**.

