



ATA

Reunião do Comitê Técnico Gestor de TI (CTGTI) - 9/2025

1. Identificação

Data: 14/05/2025	Início: 15:01 Término: 16:42	Local: Sala de reunião da STI
Finalidade: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2024		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

4. Pauta

- Questionamentos acerca dos projetos:
 - Qual é o percentual de execução do projeto?
 - Que etapa foi executada?
 - Qual etapa será executada na semana?
 - Existe alguma observação ou impedimento?
 - A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados, suspensos, sobrestados e em homologação;
- Apresentação do andamento dos processos de aquisição.

5. Participantes

Nome	Cargo	E-mail
Brayton Marques Santana	Coordenador de Sistemas Corporativos - Substituto	brayton.santana@tre-go.jus.br
Frank Wendell Ribeiro	Secretário de Tecnologia da Informação	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Marcilio Zaccarelli Bersaneti	Coordenador de Infraestrutura	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	Coordenador de Sistemas Eleitorais	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	Assessor de Planejamento, Governança e Gestão	paulo.taira@tre-go.jus.br

6. Encaminhamentos

- O Assessor de Planejamento da STI, explanou acerca da reunião do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) ocorrida no dia: 13/05/2025, em que foi realizada priorização dos projetos de sistemas informatizados, conforme planilhas abaixo:

Projetos sob a responsabilidade da equipe da SEDIS:

Iniciativa	Unidade demandante	Status	Prazo de Execução	Equipe	Pontuação
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	CRE	Em andamento	6M	SEDIS	17
Sistema de Gestão de Alimentação de Mesários	SAO	Em andamento	9M	SEDIS	16
PDI-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição	SGP	Sobrestado		SEDIS	13
Cadastro de terceirizados	ASPLAN	Em Fila	3M	SEDIS	10
PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em Eventos	EJE	Em Fila		SEDIS	10
PDI-22R1-08 - Implantar Sietma de Recadastramento de Servidores	SGP	Suspensão		SEDIS	1

Projeto sob a responsabilidade da equipe da SEAID:


Iniciativa	Unidade demandante	Status	Prazo de execução	Equipe	Pontuação
Sistema de Tele-Trabalho	SGP	Em andamento	3M	SEAID	5

Projetos sob a responsabilidade da equipe da SESCO:


Iniciativa	Unidade demandante	Status	Prazo de execução	Equipe	Pontuação
PSI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI	DG	Sobrestado		sesco	14
PDI-24-R1-N-20 - Controle de Capacitação da EJE	EJE	Em andamento	2M	SESCO	11
PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sitema WeKan	INTEGRAZON	Em homologação	2M	SESCO	7
Sistema de Disponibilização de Acórdãos na Internet (Ementário)	SGI	Em fila		SESCO	7
Agenda Institucional	APRISQ	Em fila		SESCO	5
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	ASCOM ASPLAN INTEGRAZONAS	Sobrestado		SESCO	3

- Desta forma, o portfólio em acompanhamento pelo CTGTI conta agora com 37 (trinta e sete) projetos, sendo 17 (dezessete) em andamento, 4(quatro) em fila, 5 (cinco) em homologação, 4(adiados), 3 (três) sobrestados e 4 (quatro) suspensos, incluindo os projetos priorizados pelo CGTIC e os projetos internos da Secretaria de Tecnologia da Informação (vide item 7.1).
- Os registros de informações detalhadas dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas;
- Próxima reunião agendada para o dia 29/05/2025 às 14:30.

7. Gráficos do Portfólio de Projetos

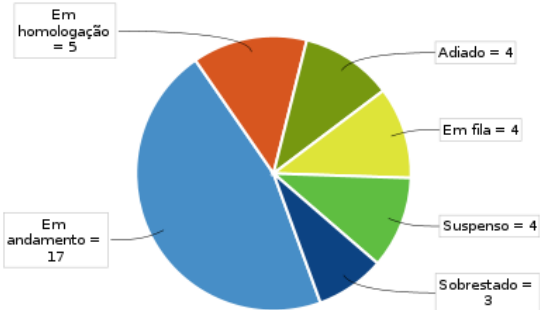

Total: 37 . Gráfico por: Status

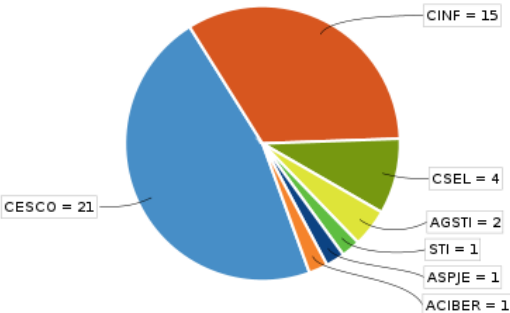

Total: 37 . Gráfico por: Unidade responsável

7.1. Relação dos projetos em acompanhamento pelo CTGTI (Internos + priorizados pelo CGTIC)

Projetos	Situação	Execução%	Unidade responsável	Equipe	Unidade demandante
ELE26-25-R1-01 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	Em andamento	40	CSEL	SEVIN	DG
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Em andamento	80	AGSTI, CINF	ACIBER	CGSI
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Em andamento	40	AGSTI, CINF	ACIBER	CGSI
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Em andamento	80	CESCO, CINF	SEDIS, SESRE	CGSI
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	30	CESCO	SEDIS	VPCRE
PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes	Em andamento	10	CESCO	SEDIS	STI

PDI-24-R1-N-10 - Eleição dos Dirigentes para os Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores - PT	Em andamento	50	CSEL	SESEL, SEVIN	DG
PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)	Em andamento	40	CINF	SEPRO, SESRE	STI
PDI-24-R1-N-15 - Sistema de Gestão de Alimentação de Mesários	Em andamento	10	CESCO	SEDIS	SAO
PDI-24-R1-N-20 - Controle de Capacitação da EJE	Em andamento	10	CESCO	SESCO	EJE
PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho	Em andamento	20	CESCO	SEAID	SGP
PDI-24-R1-N-24 - Customização da solução GLPI para uso como ITSM	Em andamento	50	CINF	SEGEC	STI
PDI-24-R1-N-25 - Implantação de equipamentos e softwares nos Datacenters da JE-GO	Em andamento	50	CINF	SEPRO	STI
PDI-24-R1-N-26 - Implantação de solução de virtualização	Em andamento	40	CINF	SEPRO	STI
PDI-24-R1-N-27 - Implantação do Windows 11 nos PCs/Notebooks da JE-GO	Em andamento	40	CINF	SEMIC	STI
PDI-25-1-1 - Eleição dos Dirigentes das Escolas Municipais de São Miguel do Passa Quatro	Em andamento	30	CSEL	SESEL, SEVIN	DG
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	80	CINF	CESCO, CINF, CSEL	ÓRGÃOS EXTERNOS
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Suspensão	10	CESCO	SEDIS	SGP
PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG	Suspensão	50	CSEL	SESEL, SEVIN	DG
PDI-25-1-2 - Plenário Virtual	Suspensão		ASPJE	ASPJE	SJD
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Suspensão	70	CESCO, CINF		ÓRGÃOS EXTERNOS
PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos	Em fila		CESCO	SEDIS	EJE
PDI-24-R1-N-17 - Sistema de disponibilização de Acórdãos na internet (Ementário)	Em fila	10	CESCO	SESCO	SGI
PDI-25-1-3 - Agenda Institucional	Em fila		CESCO	SESCO	APRISQ
PDI-25-1-4 - Cadastro de Terceirizados	Em fila		CESCO	SEDIS	ASPLAN
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO	SEDIS	SGP
PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto	Em homologação	80	CESCO	SEAID	EJE
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAAC (SISPLANO)	Em homologação	90	CESCO	SEAID	SAO
PDI-24-R1-N-16 - Monitoramento de impressões	Em homologação	90	CINF	CINF	ATEND
PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan	Em homologação	90	CESCO	SESCO	INTEGRAZONAS
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40	CESCO, CINF		CGSI
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70	ACIBER, CESCO, CINF	ACIBER, SEDIS, SESCO, SEPRO, SESRE	CGSI
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Adiado	90	CINF, STI	CESCO, CINF, STI	CGSI
PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede sem fio	Adiado	60	CINF		STI
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Sobrestado	50	CESCO	SESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS
PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição	Sobrestado	50	CESCO	SEDIS	PRES, SGP
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI	Sobrestado	80	CESCO	SESCO	DG

37 itens

7.2. Projetos/macro atividades em andamento com término previsto de até 60 dias

Projetos	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante	Término previsto
PDI-25-1-1 - Eleição dos Dirigentes das Escolas Municipais de São Miguel do Passa Quatro	Em andamento	30	CSEL	DG	02/jun/25
PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho	Em andamento	20	CESCO	SGP	20/jun/25

ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Em andamento	80	AGSTI, CINF	CGSI	30/jun/25
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	80	CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	30/jun/25

4 itens

8. Detalhamento dos projetos

ELE26-25-R1-01 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas

Descrição							
A manutenção preventiva envolve a verificação regular de hardware e software das urnas eletrônicas para identificar e corrigir problemas antes que eles causem falhas durante uma eleição. Isso ajuda a garantir que as eleições ocorram sem interrupções significativas. Conforme Orientação de Trabalho (OT20 - TSE - em anexo) faremos o Run in das UE 20 e UE22 apenas 02x por ano não eleitoral							
Painel de acompanhamento https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMzlhMmM4NzctNTEyZS00OThjLTljZTAzMzUzMmRkZmFjODY4liwidCI6IjI2ZjA4NzlyLTJfOWUtNGVhZS1iN2VkLThhMmI3N2ZmM2Q5YyJ9							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	06/mar/25	06/mar/25	18/dez/26		CSEL	STI	40

Atividades	Situação
Realização do 1º Run In 2025	Em andamento
Realização do 2º Run In 2025	Não iniciado
Realização do 3º Run In 2025	Não iniciado
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 1º Lote (Qtde: 0)	Não iniciado
Certificação das Urnas 2022 - 1º Lote (Qtde: 0)	Não iniciado
Realização do 1º Run In 2026	Não iniciado
Realização do 2º Run In 2026	Não iniciado

ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	30/jun/25		AGSTI, CINF	CGSI	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Análise da minuta pelo CGSI, DG e SGP	Em andamento
Aprovação e publicação do normativo	Não iniciado
Implantação	Não iniciado
Observações	
Foi encaminhada a minuta do documento normativo para apreciação do CGSI, DG e SGP.	

ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)

Descrição							
Dispõe sobre as regras e os procedimentos para a realização da gestão e monitoramento de registro de atividades (logs) no ambiente computacional do TRE-GO.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	31/out/25		AGSTI, CINF	CGSI	4

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração das minutas dos documentos normativos.	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Em andamento
Aprovação da norma e do procedimento.	Não iniciado
Implantação da norma e do procedimento.	Não iniciado
Observações	
Aguardando reunião da ACIBER com a CINF até o dia 30/05/2025.	

ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos

Descrição							
O uso de recursos criptográficos visa proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos pelas redes de computadores, assim como dos dados em repouso, armazenados em servidores, microcomputadores, dispositivos móveis e bancos de dados.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/25		CESCO, CINF	CGSI	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.	Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Linux.	Concluído
Implantação de criptografia em conexões VPN.	Concluído
Implantação de criptografia do Portal de acesso externo - escritório remoto.	Concluído
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS	Concluído
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS	Concluído
Implantação de criptografia em notebooks standalone	Concluído
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.	Concluído
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores	Em andamento
Implantação da criptografia de dados armazenados nos novos storages IBM.	Em andamento
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores de aplicação e de Bancos de dados.	Em andamento
Mapeamento do processo de certificação de sites e sistemas de informação	Não iniciado
Observações	
Aguardando a entrega dos novos equipamentos adquiridos.	

PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória

Descrição							
SEI 23.0.000002275-6 Finalidade: desenvolvimento de uma solução informatizada para o controle de informações judiciais relacionadas a medidas que envolvem gestão e destinação de valores oriundos de fianças e penas pecuniárias. Ao final, haverá a conversão do controle dos registros manuais em livros de guarda obrigatória pelos cartórios eleitorais para meio eletrônico.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	30/ago/23	02/abr/25	28/nov/25		CESCO	VPCRE	30

Atividades	Situação
Levantamento de requisitos	Concluído
Desenvolvimento do cadastro de penalidades	Em andamento
Realizar pré-apresentação do cadastro de penalidades	Não iniciado
Observações	
Será agendada reunião com o representante da unidade demandante para pré-apresentação do cadastro de penalidades (férias do servidor Tales).	

PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	19/ago/24	19/ago/24	19/dez/25		CESCO	STI	10

Atividades	Situação
Planejamento	Em andamento
Criação e configuração de ambiente de teste interno	Em andamento
Criação e configuração do ambiente de testes em nuvem	Suspensão
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
Em fase inicial de instalação da arquitetura. Em fase de configuração do docker kubernetes e rancher	

PDI-24-R1-N-10 - Eleição dos Dirigentes para os Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores - PT

Descrição							
SEI Nº 24.0.000019889-3							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	03/fev/25	03/fev/25	08/jul/25		CSEL	DG	30
Atividades						Situação	
Levantamento das informações junto à entidade demandante						Concluído	
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade						Concluído	
Elaboração do Acordo de Colaboração						Concluído	
Análise e Autorização da Presidência do TRE-GO						Em andamento	
Entrega da Base de Candidatos						Não iniciado	
Entrega da Base de Eleitores						Não iniciado	
Configuração da Eleição						Não iniciado	
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)						Não iniciado	
Entrega das Listas de Eleitores						Não iniciado	
Geração de Mídias						Não iniciado	
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas						Não iniciado	
Retirada das Urnas Eletrônicas						Não iniciado	
Suporte às Eleições						Não iniciado	
Devolução das Urnas Eletrônicas - até 2 dias após a eleição						Não iniciado	
Observações							
As informações foram encaminhadas pelo partido. Aguardando decisão da Presidência do TRE-GO, sobre o atendimento da solicitação de empréstimo das Urnas Eletrônicas.							

PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	03/fev/25	03/fev/25	25/jul/25		CINF	STI	40
Atividades						Situação	
Realização de testes com o keycloak						Concluído	
Inserção de sistemas no Portal						Em andamento	

PDI-24-R1-N-15 - Sistema de Gestão de Alimentação de Mesários

Descrição
SEI: 24.0.000019107-4 Objetivo do Sistema: Confecção, por meio de sistema informatizado, de lista de pagamento do benefício alimentação de mesários e colaboradores de cada uma das zonas eleitorais, para a sua melhor gestão. Serviço a ser transformado digitalmente: Serviço de criação de lista de pagamento para alimentação de mesários e colaboradores a serem pagos por pix e em dinheiro. Proposta resumida: A forma de distribuição de alimentação de mesários vem ao longo dos anos modificando. Desde 2022, surgiu a possibilidade de pagamento por pix. Esse serviço vem sendo realizado centralizadamente na AGSAO por meio de planilhas e de forma manual e interação com as zonas eleitorais, para excluir nomes, incluir nomes, pagar algumas pessoas por pix, outras por dinheiro. Considerando que essa atividade gera diversos riscos financeiros, inclusive para a imagem do Tribunal, faz-se necessário a criação de sistema que possibilite esse gerenciamento pela própria zona eleitoral, permitindo que ela trate os dados de sua zona eleitoral e, ao final, gere lista de pagamento, podendo ser pago por unidade Centralizada deste Tribunal

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	17/mar/25		28/nov/25		CESCO	SAO	10

Atividades	Situação
Formalização da demanda	Concluído
Levantamento de requisitos	Em andamento
Desenvolvimento	Em andamento
Testes e conclusão	Não iniciado
Observações	
-Em fase de especificação dos requisitos. - Modelagem do processo pela unidade demandante. A reunião quinzenal de levantamento de requisitos prevista na sprint foi prorrogada devido as férias do representante da área de negócio. Enquanto isso, a equipe técnica está documentando os requisitos já definidos e modelando a arquitetura de dados.	

PDI-24-R1-N-20 - Controle de Capacitação da EJE

Descrição							
SEI: 24.0.000019107-4 Objetivo do Sistema: Promover o registro e o controle dos inscritos em todas capacitações da EJE. Serviço a ser transformado digitalmente: Serviço de admissão e registro de inscrições Serviço de controle da frequência dos inscritos Serviço de emissão de certificados com controle de autenticidade. Proposta resumida: Desenvolvimento de aplicativo/software que registre e controle todas as etapas do processo de capacitação da EJE.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	31/dez/24	07/abr/25	31/jul/25		CESCO	EJE	10

Atividades	Situação
Formalização da demanda	Concluído
Desenvolvimento	Em andamento
Testes e conclusão	Não iniciado
Observações	
O projeto será avaliado na próxima reunião devido a ausência justificada do titular da CESCO. Em fase de especificação da etapa de inscrição.	

PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	14/abr/25	14/abr/25	20/jun/25		CESCO	SGP	20

Atividades	Situação
Planejamento	Em andamento
Desenvolvimento	Não iniciado
Realização de teste pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação pela unidade demandante	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
O projeto será avaliado na próxima reunião devido a ausência justificada do titular da CESCO.	

PDI-24-R1-N-24 - Customização da solução GLPI para uso como ITSM

Descrição							
Adequação da solução GLPI para uso como Sistema de Gestão de Serviços de TI (ITSM).							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	10/abr/25	10/abr/25	31/jul/25		CINF	STI	50

Atividades	Situação
Instalação da solução GLPI.	Concluído
Customização da solução GLPI para uso como ITSM.	Em andamento
Observações	

Será implementado:
SLAs
Catálogo de Serviço de TI
Definição de Perfis das equipes da TI.

PDI-24-R1-N-25 - Implantação de equipamentos e softwares nos Datacenters da JE-GO

Descrição							
Instalação de equipamentos e softwares nos Datacenters deste Regional.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	03/fev/25	03/fev/25	30/set/25		CINF	STI	50
Atividades							Situação
Instalação dos storages IBM.							Concluído
Instalação de 5 servidores Lenovo.							Em andamento
Aquisição do restante dos equipamentos necessários para o funcionamento dos Datacenters.							Em andamento
Observações							
Foram instalados 2 dos 5 servidores Lenovo. Já foram emitidas as notas de empenho de 2 servidores, 3 racks, 1 tape library, 4 switches tor e 4 switches SAN.							

PDI-24-R1-N-26 - Implantação de solução de virtualização

Descrição							
Estudo de soluções de virtualização existentes no mercado e contratação do VmWare.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	31/jan/25	31/jan/25	31/jul/25		CINF	STI	40
Atividades							Situação
Testes com a solução Microsoft.							Em andamento
Testes com a solução Suse.							Em andamento
Contratação do Vmware (licenciamento como serviço).							Em andamento
Observações							
Em fase validação dos servidores com sistema operacional Linux no ambiente microsoft.							

PDI-24-R1-N-27 - Implantação do Windows 11 nos PCs/Notebooks da JE-GO

Descrição							
Migração do SO Windows 10 para o Windows 11 nas estações de trabalho e notebooks.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/abr/25	01/abr/25	30/set/25		CINF	STI	40
Atividades							Situação
Realização de testes com Windows 11 no ambiente de TI da JE-GO.							Concluído
Homologação do Windows 11 nos PCs e notebooks.(TRE e Zonas)							Em andamento
Instalação/migração do Windows 11 nos PCs da sede.							Em andamento
Instalação/migração do Windows 11 nos PCs das ZE.							Em andamento

PDI-25-1-1 - Eleição dos Dirigentes das Escolas Municipais de São Miguel do Passa Quatro

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	30/abr/25	30/abr/25	02/jun/25		CSEL		30
Atividades							Situação
Levantamento das informações junto à entidade demandante							Concluído
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade							Concluído
Elaboração do Acordo de Colaboração							Concluído
Envio da Análise de Viabilidade e da Minuta do Acordo para parecer do Juiz da 31ª ZE							Concluído
Manifestação do Juiz da 31ª ZE							Concluído
Análise e Decisão da Presidência do TRE-GO							Concluído

Assinatura do Acordo de Colaboração (TRE e Entidade)	Em andamento
Recebimento da Base de Eleitores	Em andamento
Recebimento da Base de Candidatos	Em andamento
Configuração da Eleição	Não iniciado
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Não iniciado
Entrega das Listas(Candidatos e Eleitores)	Não iniciado
Geração de Mídias	Não iniciado
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Retirada das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Suporte às Eleições	Não iniciado
Devolução das Urnas Eletrônicas - até 2 dias após a eleição	Não iniciado

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

Descrição							
Objetivo da demanda: Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados. Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta): A falta catalogação dos ativos de TI, tanto <i>hardware</i> quanto <i>software</i>, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataque cibernéticos de qualquer natureza. Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)? Gestão de TI e apoio à Governança Desenvolvimento e administração de soluções de TIC Gestão de infraestrutura de TIC Suporte técnico das soluções de TIC Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução): 1. Visibilidade de todo o parque de <i>hardware</i> do Tribunal. 2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional. 3. Visibilidade de todos os <i>softwares</i> em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades. Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada): Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados. Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026 Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico): Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante? Não Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda: Custo (Informe a estimativa de custo do projeto): Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em <i>Software</i> Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	30/jun/25		CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Aquisição da solução	Concluído
Implementação de protocolo seguro SNMP com https no OCS.	Concluído
Instalação e configuração da solução	Concluído
Implantação	Concluído
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	Em andamento
Observações	
Em fase de análise do CMDB do GLPI; Analisar se o GLPI consegue atender a disponibilização do CMDB.	

PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores

Descrição

SEI: 22.0.000008626-0 Objetivo da demanda: Desenvolver formulário pré preenchido de recadastramento de servidores, visando agilizar e otimizar o processo de revisão do cadastro de servidores. Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta): Facilitar o processo de solicitação de alteração de dados cadastrais pelos servidores, com a permissão de alteração de dados livres e possibilidade de solicitação de alteração de dados que exigem comprovação, com a anexação de documentos. Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)? Macroprocesso de apoio: Gestão de Pessoas / Processo: Gestão do quadro de pessoal Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução): Facilidade e celeridade da execução do processo de recadastramento de servidores, tanto para o servidor quanto para a unidade responsável. Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada): 8 - Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas. Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico): Disponibilização de formulário eletrônico pré-preenchido com os dados dos servidores, com opção de solicitação de alteração, anexação de documentos e possibilidade de deferimento pela unidade responsável, com gravação automática no SGRH. Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante? Não Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda: Não se aplica Custo (Informe a estimativa de custo do projeto): Não se aplica							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Suspensão	27/fev/23	27/fev/23	30/mai/25		CESCO	SGP	10

Atividades	Situação
Planejamento	Adiado
Criação e configuração do ambiente de testes	Não iniciado
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
A SGP informou no SEI: 24.0.000019107-4 despacho ID. nº 0972047, não possuir no momento, condições de rerepresentar o sistema para priorização do CGTIC, o que foi confirmado pela AGSGP e Secretária de Gestão de Pessoas (ID. 0972047). Desta forma, este projeto ficará suspenso até que seja rerepresentado pela unidade demandante, com os detalhes necessários ao seu desenvolvimento (vide último parágrafo do despacho do Secretário de TI, ID. nº 1088674).	

PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Suspensão	21/fev/25	24/fev/25	26/mai/25		CSEL	DG	90

Atividades	Situação
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade - até 5 dias depois do pedido	Concluído
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Concluído
Elaboração da Minuta do Acordo de Colaboração	Concluído
Recebimento da base de Eleitores	Concluído
Recebimento da base de Candidatos	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Validação das Bases de candidatos, eleitores e seções	Concluído
Entrega das Listas de Eleitores	Concluído
Geração das Mídias	Concluído
Carga e Lacre das urnas eletrônicas	Concluído
Retirada das urnas eletrônicas	Concluído
Suporte no dia da Eleição - Nova data para a eleição	Cancelado
Devolução das urnas eletrônicas	Concluído
Novo Recebimento da base de Candidatos	Em andamento
Nova Configuração da Eleição	Não iniciado
Nova Geração de Mídias	Não iniciado
Nova Carga e Lacre das urnas eletrônicas	Não iniciado
Nova Retirada das urnas eletrônicas	Não iniciado

Suporte no dia da Eleição	Não iniciado
Devolução das urnas eletrônicas	Não iniciado
Observações	
A data da eleição foi adiada pela ASGMG por recursos no processo eleitoral para inclusão de novos candidatos.	

PDI-25-1-2 - Plenário Virtual

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Suspensão			31/jul/24		ASPJE	SJD	

Atividades	Situação
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
O projeto foi suspenso em reunião do CTGTI ocorrida no dia 21/03/2025.	

PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Suspensão	01/jul/24		21/fev/25		CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	70

Atividades	Situação
Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ Resolução 335/2020 na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados	Concluído
Elaboração do Termo de Referência	Concluído
Realização da licitação	Concluído
Observações	
O projeto foi suspenso em reunião do CTGTI ocorrida no dia 21/03/2025.	

PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em fila					CESCO	EJE	

Observações
Verificar se outros Regionais possuem sistema informatizado que atendem a demanda.

PDI-24-R1-N-17 - Sistema de disponibilização de Acórdãos na internet (Ementário)

Descrição							
SEI: 24.0.000019107-4 Objetivo do Sistema: Otimizar a disponibilização ao público externo, diretamente na internet, do inteiro teor dos acórdãos para pesquisa. Serviço a ser transformado digitalmente: Disponibilização, na internet, dos acórdãos lançados na intranet para que alcance o público externo. Proposta resumida: A proposta visa à disponibilização, na internet, dos acórdãos publicados na intranet para que alcance o público externo que busca por pesquisa.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em fila	10/mar/25	10/mar/25			CESCO	SGI	10

Atividades	Situação
Formalização da demanda	Não iniciado
Desenvolvimento	Não iniciado
Testes e conclusão	Não iniciado
Observações	
Em reunião do CTGTI ocorrida no dia 02/04/2024, o status do projeto foi alterado para "A priorizar" devido a mudança de escopo do projeto.	

PDI-25-1-3 - Agenda Institucional

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em fila					CESCO	APRISQ	

Observações
Priorizado pelo CGTIC na reunião do dia 2025-05-13

PDI-25-1-4 - Cadastro de Terceirizados

Descrição							
SEI: 25.0.000002881-1 Construção de sistema para gerenciamento do cadastro de Terceirizados do Tribunal. Vide Termo de Abertura de Projeto em anexo.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em fila					CESCO	ASPLAN	

PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE

Descrição							
SEI: 24.0.000003403-3 Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online dos servidores ao seu próprio dossiê funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/21	07/jan/21	29/mar/24		CESCO	SGP	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
Aguardando homologação do sistema pela SGP.	

PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votantet/E-voto

Descrição							
SEI nº: 24.0.000007445-0 Adoção de um sistema de votação online E-voto desenvolvido pelo TRE-SC.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	01/mai/24	01/mai/24	31/mar/25		CESCO	EJE	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
O sistema não está emitindo a zerésima. A equipe técnica repassou a demanda para o TRE-SC está aguardando resposta.	

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)

Descrição							
Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal. Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO.							

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	29/abr/22	29/abr/22	26/abr/24		CESCO	SAO	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Análise de requisitos	Concluído
Desenvolvimento funcionalidades	Concluído
Testes de funcionalidades	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Em andamento
Observações	
Em fase de elaboração do termo de homologação para envio à unidade demandante; O término previsto foi alterado para 26/04/2024.	

PDI-24-R1-N-16 - Monitoramento de impressões

Descrição							
SEI: 24.0.000019107-4 Objetivo do Sistema: Acompanhamento do número de impressões e consumo de suprimentos por impressora. Serviço a ser transformado digitalmente: Leitura do número de impressões por equipamento Proposta resumida: Desenvolvimento de sistema que possibilite o monitoramento do número de impressões realizadas por equipamento. Isso facilitaria o controle de impressões e consequentemente o consumo de papel.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	18/dez/24	18/dez/24	30/mai/25		CINF	ATEND	90

Atividades	Situação
Formalização da demanda	Concluído
Desenvolvimento	Concluído
Testes e conclusão	Em homologação

PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan

Descrição							
SEI nº: 22.0.000007683-3							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	10/mar/25	10/mar/25	15/mai/25		CESCO	INTEGRAZONAS	90

Atividades	Situação
Instalação e configuração	Concluído
Testes e homologação	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
Aguardando homologação pela unidade demandante.	

ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes

Descrição							
Visa estabelecer e manter a configuração segura de ativos corporativos (dispositivos de usuário final, incluindo portáteis e móveis; dispositivos de rede; dispositivos não computacionais/ IoT; e servidores) e software (sistemas operacionais e aplicações) no ambiente da rede corporativa da justiça eleitoral de acordo com a seguinte classificação: I. ATIVOS DE INFRAESTRUTURA REDE, quais sejam os dispositivos de rede; II. ATIVOS DE APLICAÇÕES, quais sejam os sistemas operacionais e aplicações; III. ATIVOS DE USUÁRIOS, quais sejam os usuários finais; IV. ATIVOS DE DISPOSITIVOS, quais sejam os dispositivos de usuário final, incluindo portáteis, dispositivos não computacionais/ IoT e móveis e servidores.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Adiado	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/24		CESCO, CINF	CGSI	40

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído

Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Não iniciado
Transferência de conhecimento	Não iniciado
Implantação	Não iniciado
Observações	
O término previsto foi adiado para 29/03/2023.	

ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades

Descrição							
A gestão de vulnerabilidades tem como objetivo prevenir a exploração de vulnerabilidades técnicas na rede corporativa, por meio da aplicação sistemática das seguintes ações de prevenção, identificação, classificação e tratamento: I - adoção de ações técnicas preventivas conforme norma de Configuração Segura de Ativos de TI vigente; II - obtenção de informações para identificar vulnerabilidades técnicas em tempo hábil; III - avaliação de exposição às vulnerabilidades técnicas; III - adoção de medidas apropriadas e tempestivas para lidar com os riscos identificados.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Adiado	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/24		ACIBER, CESCO, CINF	CGSI	70

Atividades							Situação
Planejamento							Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo							Concluído
Transferência de conhecimento							Concluído
Implantação							Concluído
Mapeamento do processo de trabalho							Adiado
Observações							
O término previsto foi adiado para 29/03/2024.							

ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação

Descrição							
Portaria Nº78/2022 (normativo que está vigente) Possui a finalidade de estabelecer as diretrizes para o controle de acesso e uso aceitável dos recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal, bem como os direitos e as responsabilidades dos usuários desses recursos.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Adiado	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/24		CINF, STI	CGSI	90

Atividades							Situação
Norma finalizada							Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo							Concluído
Planejamento							Concluído
Revisão do normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE							Em andamento
Observações							
O término previsto foi alterado para 19/12/2024 e o projeto foi adiado em razão do período eleitoral.							

PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede sem fio

Descrição							
SEI nº 23.0.000003147-0 Aquisição de Solução de rede cabeada (LAN) e sem fio (Wi-fi) com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral. Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Adiado	28/fev/23	28/fev/23	19/dez/24		CINF	STI	60

Atividades							Situação
Elaboração do ETP.							Concluído
Elaboração do DOD.							Concluído
Implementação da solução.							Não iniciado
Execução da ARP.							Não iniciado
Processo de licitação.							Não iniciado

Adequação das especificações e coleta de preços estimativos.	Em andamento
Elaboração do TR.	Em andamento

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Descrição							
http://wp.tre-go.jus.br/							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Sobrestado		07/nov/22	31/mar/25		CESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS	50

Atividades	Situação
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Planejamento	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Realização de testes pela equipe de desenvolvimento	Em andamento
Observações	
O projeto foi sobrestado na reunião do CTGTI ocorrida no dia 02/04/2025, em razão da necessidade de definição de um grupo de trabalho multidisciplinar com representantes das áreas de negócio para gerir o projeto.	

PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição

Descrição							
SEI: 25.0.000002881-1 Construção de sistema para gerenciamento do cadastro de Terceirizados do Tribunal. Vide Termo de Abertura de Projeto em anexo.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Sobrestado			30/mar/25		CESCO	PRES, SGP	50

Observações							
A STI já solicitou à SGP a abertura de um Documento de Oficialização de Demanda (DOD) no sistema SEI. O status do projeto foi alterado para "Sobrestado" na última reunião do CTGTI ocorrida no dia 02/04/2025, a fim de aguardar a aquisição dos leitores biométricos.							

PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI

Descrição							
SEI: 23.0.000016671-5							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Sobrestado	16/fev/24	16/fev/24	28/mar/25		CESCO	DG	80

Atividades	Situação
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos	Concluído
Planejamento	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Realização de testes pela equipe técnica	Em andamento
Observações	
O módulo de peticionamento desenvolvido pela Anatel apresenta vulnerabilidades. Vários TRES e o TSE deixaram de utilizá-lo. A equipe da CESCO está aguardando solução que está em desenvolvimento no TSE para o peticionamento. O sistema retornou para o status Em andamento em razão dos motivos acima. O término previsto foi alterado para 28/03/2025.	



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 21/05/2025, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 21/05/2025, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRAYTON MARQUES SANTANA, COORDENADOR(A)**, em 21/05/2025, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 27/05/2025, às 10:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1113216** e o código CRC **7E881340**.

25.0.000001155-2

1113216v20

