



ATA

Reunião do Comitê Técnico Gestor de TI (CTGTI) - 16/2025

1. Identificação

Data: 18/09/2025	Início: 16:25 Término: 17:57	Local: Sala de reunião da STI
Finalidade: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 Gestão 24/26		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

4. Pauta

- Questionamentos acerca dos projetos:
 - Qual é o percentual de execução do projeto?
 - Que etapa foi executada?
 - Qual etapa será executada na semana?
 - Existe alguma observação ou impedimento?
 - A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados, suspensos, sobrestados e em homologação;


5. Participantes

Nome	Cargo	E-mail
Brayton Marques Santana	Coordenador de Sistemas Corporativos	brayton.santana@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	Coordenador de Sistemas Eleitorais	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Frank Wendell Ribeiro	Secretário de Tecnologia da Informação	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	Assessor de Planejamento, Governança e Gestão	paulo.taira@tre-go.jus.br
Roberto César Rodrigues	Coordenador de Infraestrutura	roberto.rodrigues@tre-go.jus.br


6. Encaminhamentos

- Os registros de informações detalhadas dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas (**vide item 8 - Detalhamento dos Projetos**);
- Projetos inseridos no portfólio por solicitação do Coordenador de Sistemas Eleitorais:
 - ELE26-25-R1-03 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 3;
 - ELE26-25-R1-04 - 16º Simulado Nacional de Hardware 2026 (16SNH2026);
 - PDI-25-1-15-N - Eleitores do Futuro - 14 Escolas Municipais de Goiânia;
 - PDI-25-1-16-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Anhanguera;
 - PDI-25-1-17-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Turvelândia.
- Projetos sobrestados em razão do envolvimento das equipes em outras demandas prioritárias:
 - PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes;
 - PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)
- Projetos concluídos:
 - O projeto PDI-25-1-8-N - Eleitores do Futuro - Centro de Ensino em Período Integral Professor César Augusto Ceva - CEPI - Ipameri;
 - O projeto PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan;
- O projeto PDI-25-1-4 - Cadastro de Terceirizados foi iniciado.
- Próxima reunião agendada para o dia 02/10/2025 às 16:00.

7. Gráficos do Portfólio de Projetos

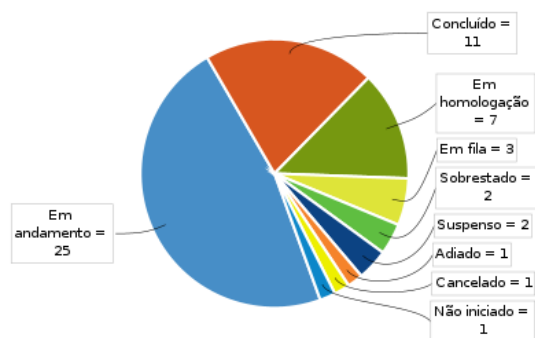

Total: 53 . Gráfico por: Status

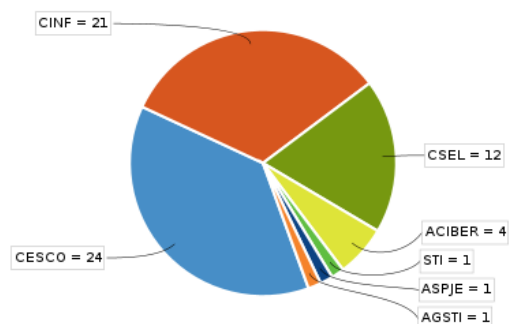

Total: 53 . Gráfico por: Unidade responsável

7.1. Relação dos projetos em acompanhamento pelo CTGTI (internos + priorizados pelo CGTIC)

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Equipe	Unidade demandante	Término real
ELE26-25-R1-03 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 3	Em andamento	20	CSEL	SEVIN	DG	
ELE26-25-R1-04 - 16º Simulado Nacional de Hardware 2026 (16SNH2026)	Em andamento	10	CSEL	SEVIN, SECAD	DG	
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Em andamento	50	ACIBER, CESCO, CINF	ACIBER, CESCO, CINF, CSEL	CGSI	
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Em andamento	80	ACIBER, CESCO, CINF	ACIBER, SEDIS, SESCO, SEPRO, SESRE	CGSI	
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Em andamento	40	ACIBER, CINF	ACIBER, CESCO, CINF, CSEL	CGSI	
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI	ACIBER, CESCO, CINF, STI	CGSI	
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Em andamento	80	ACIBER, CESCO, CINF	ACIBER, SEDIS, SEAID, SEPRO, SESRE	CGSI	
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	30	CESCO	SEDIS	VPCRE	
PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição	Em andamento	50	CESCO	SEDIS	PRES, SGP	
PDI-24-R1-N-15 - Sistema de Gestão de Alimentação de Mesários	Em andamento	10	CESCO	SEDIS	SAO	
PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho	Em andamento	80	CESCO	SEAID	SGP	
PDI-24-R1-N-25 - Implantação de equipamentos e softwares nos Datacenters da JE-GO	Em andamento	60	CINF	SEPRO	STI	

PDI-24-R1-N-26 - Implantação de solução de virtualização	Em andamento	50	CINF	SEPRO	STI	
PDI-24-R1-N-27 - Implantação do Windows 11 nos PCs/Notebooks da JE-GO	Em andamento	40	CINF	SEMIC	STI	
PDI-25-1-10-N - Proteção Avançada contra Ameaças Cibernéticas - NGFW	Em andamento	50	CINF	SESRE	STI	
PDI-25-1-11-N - Rastreabilidade e Auditoria de Dados na Nuvem - Varonis	Em andamento	20	CINF	SEPRO, SESRE	STI	
PDI-25-1-12-N - Escritório Virtual Seguro - RemoteApp	Em andamento	30	CINF	SESRE	STI	
PDI-25-1-13-N - Modernização da Comunicação por Voz - VoIP	Em andamento	30	CINF	SESRE	STI	
PDI-25-1-14-N - Salvaguarda e Resiliência das Informações - Netbackup	Em andamento	30	CINF	SEPRO	STI	
PDI-25-1-15-N - Eleitores do Futuro - 14 Escolas Municipais de Goiânia	Em andamento	10	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	
PDI-25-1-16-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Anhanguera	Em andamento		CSEL	SESEL, SEVIN	DG	
PDI-25-1-17-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Turvelândia	Em andamento		CSEL	SESEL, SEVIN	DG	
PDI-25-1-4 - Cadastro de Terceirizados	Em andamento		CESCO	SEDIS	ASPLAN	
PDI-25-1-5-N -Sistema de Registro de IAs (REGIA)	Em andamento	80	CESCO	SEDIS	STI	
PDI-25-1-9-N - Modernização dos Links Eleitorais -BRFibra e Claro	Em andamento	20	CINF	SESRE	STI	
PDI-25-1-7-N - Sistema de Controle de Mídias das Urnas Eletrônicas	Não iniciado		CESCO	SEAID	CSEL	
ELE26-25-R1-01 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 1	Concluído	100	CSEL	SEVIN	DG	30/jun/25
ELE26-25-R1-02 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 2	Concluído	100	CSEL	SEVIN	DG	20/ago/25
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Concluído	100	AGSTI, CINF	ACIBER	CGSI	30/jul/25
PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	28/ago/25
PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan	Concluído	100	CESCO	SESCO	INTEGRAZONAS	02/set/25
PDI-24-R1-N-24 - Customização da solução GLPI para uso como ITSM	Concluído	100	CINF	SEGEC	STI	07/jul/25
PDI-25-1-1 - Eleição dos Dirigentes das Escolas Municipais de São Miguel do Passa Quatro	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	02/jun/25
PDI-25-1-6-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Crixás	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD	PRES	12/ago/25
PDI-25-1-8-N - Eleitores do Futuro - Centro de Ensino em Período Integral Professor César Augusto Ceva - CEPI - Ipameri	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD	DG	08/set/25
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Concluído	100	CESCO, CINF		ÓRGÃOS EXTERNOS	21/fev/25
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Concluído	100	CINF	CESCO, CINF, CSEL	ÓRGÃOS EXTERNOS	07/jul/25
PDI-24-R1-N-10 - Eleição dos Dirigentes para os Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores - PT	Cancelado	50	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Suspenso	10	CESCO	SEDIS	SGP	
PDI-25-1-2 - Plenário Virtual	Suspenso	10	ASPJE	ASPJE	SJD	
PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos	Em fila		CESCO	SEDIS	EJE	
PDI-24-R1-N-17 - Sistema de disponibilização de Acórdãos na internet (Ementário)	Em fila	10	CESCO	SESCO	SGI	
PDI-25-1-3 - Agenda Institucional	Em fila		CESCO	SESCO	APRISQ	
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO	SEDIS	SGP	

PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto	Em homologação	90	CESCO	SEAID	EJE	
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em homologação	90	CESCO	SEAID	SAO	
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em homologação	90	CESCO	SESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS	
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI	Em homologação	90	CESCO	SESCO	DG	
PDI-24-R1-N-16 - Monitoramento de impressões	Em homologação	90	CINF	CINF	ATEND	
PDI-24-R1-N-20 - Controle de Capacitação da EJE	Em homologação	90	CESCO	SESCO	EJE	
PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede sem fio	Adiado	60	CINF		STI	
PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes	Sobrestado	70	CESCO	SEDIS	STI	
PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)	Sobrestado	50	CESCO, CINF	SEPRO, SESRE	STI	

53 itens

7.2. Projetos/macro atividades em andamento com término previsto de até 60 dias

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante	Término previsto
PDI-25-1-15-N - Eleitores do Futuro - 14 Escolas Municipais de Goiânia	Em andamento	10	CSEL	DG	30/set/25
PDI-25-1-5-N -Sistema de Registro de IAs (REGIA)	Em andamento	80	CESCO	STI	30/set/25
ELE26-25-R1-04 - 16º Simulado Nacional de Hardware 2026 (16SNH2026)	Em andamento	10	CSEL	DG	09/out/25
PDI-25-1-17-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Turvelândia	Em andamento		CSEL	DG	20/out/25
PDI-25-1-16-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Anhanguera	Em andamento		CSEL	DG	21/out/25
PDI-25-1-13-N - Modernização da Comunicação por Voz - VoIP	Em andamento	30	CINF	STI	31/out/25
PDI-25-1-12-N - Escritório Virtual Seguro - RemoteApp	Em andamento	30	CINF	STI	31/out/25
PDI-25-1-11-N - Rastreabilidade e Auditoria de Dados na Nuvem - Varonis	Em andamento	20	CINF	STI	31/out/25
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Em andamento	40	ACIBER, CINF	CGSI	31/out/25
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Em andamento	50	ACIBER, CESCO, CINF	CGSI	31/out/25
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI	CGSI	31/out/25

11 itens

8. Detalhamento dos projetos

ELE26-25-R1-03 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 3

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/set/25	01/set/25	19/dez/25		CSEL		20

ELE26-25-R1-04 - 16º Simulado Nacional de Hardware 2026 (16SNH2026)

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	15/set/25	15/set/25	09/out/25		CSEL		10

Atividades	Situação
Planejamento do Simulado de Hardware	Concluído
Configuração da Eleição - CFE	Concluído
Definição da ZE/Seções, Preparação e Replicação dos eleitores com biometria (ELO/MSSB)	Concluído
Solicitação de geração dos pacotes no Intercad	Em andamento
Liberação das versões da SEVIN para o 16º SNH	Em andamento
Concessão de Autorizações nos sistemas SISTOT, SIMON, MSSB e SOS	Não iniciado
Instalação dos Softwares necessários à realização do evento	Não iniciado
Preparação/Separação das urnas	Não iniciado

Geração e Validação dos pacotes no Intercad (município/zona, eleitores, seção e complemento município)	Não iniciado
Importação dos Dados no SISTOT (Candidatos e Seções)	Não iniciado
Impressão do Ambiente de Votação	Não iniciado
Geração de mídias	Não iniciado
Carga das Urnas - Qtde: 78 UE13 e 78 UE15	Não iniciado
Transmissão das Correspondências	Não iniciado
Votação na urna e Transmissão dos BU's - Qtde: 78 UE13 e 78 UE15	Não iniciado
Carga das Urnas - Qtde: 96 UE20 (UEFI Atual) e 96 UE20 (UEFI Atualizada)	Não iniciado
Transmissão das Correspondências	Não iniciado
Votação na urna e Transmissão dos BU's - Qtde: 96 UE20 (UEFI Atual)	Não iniciado
Votação na urna e Transmissão dos BU's - Qtde: 96 UE20 (UEFI Atualizada)	Não iniciado
Carga das Urnas - Qtde: 78 UE22 (UEFI Atual) e 78 UE22 (UEFI Atualizada)	Não iniciado
Transmissão das Correspondências	Não iniciado
Votação na urna e Transmissão dos BU's - Qtde: 78 UE22 (UEFI Atual)	Não iniciado
Votação na urna e Transmissão dos BU's - Qtde: 78 UE22 (UEFI Atualizada)	Não iniciado
Validação dos Resultados no SISTOT	Não iniciado

ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes

Descrição							
SEI: 25.0.000009298-6 Visa estabelecer e manter a configuração segura de ativos corporativos (dispositivos de usuário final, incluindo portáteis e móveis; dispositivos de rede; dispositivos não computacionais/ IoT; e servidores) e software (sistemas operacionais e aplicações) no ambiente da rede corporativa da justiça eleitoral de acordo de acordo com a seguinte classificação: I. ATIVOS DE INFRAESTRUTURA REDE, quais sejam os dispositivos de rede; II. ATIVOS DE APLICAÇÕES, quais sejam os sistemas operacionais e aplicações; III. ATIVOS DE USUÁRIOS, quais sejam os usuários finais; IV. ATIVOS DE DISPOSITIVOS, quais sejam os dispositivos de usuário final, incluindo portáteis, dispositivos não computacionais/ IoT e móveis e servidores.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	31/out/25		ACIBER, CESCO, CINF	CGSI	50
Atividades							Situação
Planejamento							Concluído
Elaboração de minuta de normativo pela ACIBER e encaminhamento aos Coordenadores da STI para análise							Concluído
Consolidação pela ACIBER, das propostas de alterações realizadas pelos Coordenadores da STI							Não iniciado
Encaminhamento da minuta do normativo pelo Secretário de TI ao Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI)							Não iniciado
Análise da minuta pelo CGSI e DG							Não iniciado
Aprovação e publicação do normativo							Não iniciado
Observações							
O processo está na ACIBER para consolidação das sugestões das Coordenadoria da STI com previsão de envio à STI no final do mês de agosto.							

ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades

Descrição							
SEI nº 25.0.000009284-6 A gestão de vulnerabilidades tem como objetivo prevenir a exploração de vulnerabilidades técnicas na rede corporativa, por meio da aplicação sistemática das seguintes ações de prevenção, identificação, classificação e tratamento: I - adoção de ações técnicas preventivas conforme norma de Configuração Segura de Ativos de TI vigente; I - obtenção de informações para identificar vulnerabilidades técnicas em tempo hábil; II - avaliação de exposição às vulnerabilidades técnicas; III - adoção de medidas apropriadas e tempestivas para lidar com os riscos identificados.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/25		ACIBER, CESCO, CINF	CGSI	80
Atividades							Situação
Planejamento							Concluído
Elaboração de minuta de normativo pela ACIBER e encaminhamento aos Coordenadores da STI para análise.							Concluído
Consolidação pela ACIBER, das propostas de alterações realizadas pelos Coordenadores da STI							Em andamento

Encaminhamento da minuta do normativo pelo Secretário de TI ao Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI)	Não iniciado
Análise da minuta pelo CGSI e DG	Não iniciado
Aprovação e publicação do normativo	Não iniciado
Observações	
Verificar com ACIBER a disponibilização consolidada das sugestões de alteração das Coordenadorias para retorno à STI.	

ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)

Descrição							
SEI nº 25.0.000001021-1 Dispõe sobre as regras e os procedimentos para a realização da gestão e monitoramento de registro de atividades (logs) no ambiente computacional do TRE-GO.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	31/out/25		ACIBER, CINF	CGSI	40

Atividades							Situação
Planejamento							Concluído
Revisão pela ACIBER, da minuta de normativo elaborado pela CINF e encaminhamento aos Coordenadores da STI para análise							Em andamento
Consolidação pela ACIBER, das propostas de alterações realizadas pelos Coordenadores da STI							Não iniciado
Encaminhamento da minuta do normativo pelo Secretário de TI ao Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI)							Não iniciado
Análise da minuta pelo CGSI e DG							Não iniciado
Aprovação e publicação do normativo							Não iniciado
Observações							
- A equipe da ACIBER identificou a necessidade de implementação de medidas para atender as recomendações do grupo nacional de segurança cibernética do TSE, bem como a ENSEC-JUD; - Será realizada reunião entre as equipes da CINF e ACIBER para deliberação sobre as referidas medidas.							

ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação

Descrição							
SEI: 25.0.000006720-5 Portaria Nº78/2022 (normativo que está vigente) Possui a finalidade de estabelecer as diretrizes para o controle de acesso e uso aceitável dos recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal, bem como os direitos e as responsabilidades dos usuários desses recursos.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	31/out/25		CINF, STI	CGSI	90

Atividades							Situação
Encaminhamento da minuta do normativo pelo Secretário de TI à Diretoria Geral							Concluído
Consolidação pela ACIBER das propostas de alterações realizadas pelos Coordenadores da STI							Concluído
Elaboração de minuta de normativo pela ACIBER e encaminhamento aos Coordenadores da STI para análise							Concluído
Revisão da minuta de normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE							Concluído
Norma finalizada							Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo							Concluído
Planejamento							Concluído
Análise da minuta pelo CGSI e DG							Não iniciado
Aprovação e publicação do normativo							Não iniciado
Observações							
Após a consolidação das sugestões das unidades da STI, a minuta de normativo foi encaminhada para apreciação da Diretoria Geral.							

ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos

Descrição							
SEI nº: 25.0.000011375-4 O uso de recursos criptográficos visa proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos pelas redes de computadores, assim como dos dados em repouso, armazenados em servidores, microcomputadores, dispositivos móveis e bancos de dados.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%

Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/25		ACIBER, CESCO, CINF	CGSI	80
Atividades							Situação
Planejamento							Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo							Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.							Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Linux.							Concluído
Implantação de criptografia em conexões VPN.							Concluído
Implantação de criptografia do Portal de acesso externo - escritório remoto.							Concluído
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS							Concluído
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS							Concluído
Implantação de criptografia em notebooks standalone							Concluído
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.							Concluído
Implantação da criptografia de dados armazenados nos novos storages IBM.							Concluído
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores							Em andamento
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores de aplicação e de Bancos de dados.							Sobrestado
Implantação de criptografia em sistemas da infraestrutura (proxy, monitoramento e outros).							Em andamento
Revisão da minuta do documento normativo pela ACIBER e encaminhamento aos Coordenadores da STI para análise							Em andamento
Consolidação pela ACIBER, das propostas de alterações realizadas pelos Coordenadores da STI							Não iniciado
Encaminhamento da minuta do normativo pelo Secretário de TI ao Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI)							Não iniciado
Análise da minuta pelo CGSI e DG							Não iniciado
Aprovação e publicação do normativo							Não iniciado
Observações							
- A atividade https://tregoagsti.atlassian.net/browse/P2126R24-517 foi sobrestada em razão da necessidade de realização de planejamento do processo de disponibilização dos dados para as áreas de negócio. - O SEI 25.0.000011375-4 com a minuta do normativo revisada pela ACIBER foi para análise do CTGTI.							

PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória

Descrição							
SEI 23.0.000002275-6 Finalidade: desenvolvimento de uma solução informatizada para o controle de informações judiciais relacionadas a medidas que envolvem gestão e destinação de valores oriundos de fianças e penas pecuniárias. Ao final, haverá a conversão do controle dos registros manuais em livros de guarda obrigatória pelos cartórios eleitorais para meio eletrônico.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	30/ago/23	02/abr/25	28/nov/25		CESCO	VPCRE	30

Atividades							Situação
Levantamento de requisitos							Concluído
Desenvolvimento do cadastro de penalidades							Em andamento
Realizar pré-apresentação do cadastro de penalidades							Não iniciado
Observações							
- Foi realizada reunião com a VPCRE: - Foram apresentadas as telas iniciais do sistema; - Ficou acordado que a referida unidade fará a validação dos requisitos definidos e a reestruturação do modelo.							

PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição

Descrição							
SEI: 25.0.000002881-1 Construção de sistema para gerenciamento do cadastro de Terceirizados do Tribunal. Vide Termo de Abertura de Projeto em anexo.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	05/ago/25	05/ago/25	19/dez/25		CESCO	PRES, SGP	50
Observações							
Aguardando o retorno do representante da unidade demandante para validação do ETP.							

Homologação pela unidade demandante	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
Devido a dificuldade na implantação dos sistemas SISTELE e DFT Diário com relação as configurações e a implementação dos sistemas bem como, a sua utilização, foi necessária a realização de uma visita técnica ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará, razão pela qual o projeto teve o seu término previsto adiado para o dia 28/11/2025.

PDI-24-R1-N-25 - Implantação de equipamentos e softwares nos Datacenters da JE-GO

Descrição							
Instalação de equipamentos e softwares nos Datacenters deste Regional.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	03/fev/25	03/fev/25	28/nov/25		CINF	STI	60

Atividades	Situação
Instalação dos storages IBM.	Concluído
Instalação de 5 servidores Lenovo.	Concluído
Instalação elétrica para os novos racks.	Concluído
Aquisição e entrega do restante dos equipamentos necessários para o funcionamento dos Datacenters.	Em andamento
Migração dos dados do VNX 5400 para o novo storage IBM.	Em andamento

Observações
- A empresa fornecedora (primetek) dos switches SANs solicitou nova prorrogação do prazo de entrega para o dia 31/10/2025. - Os servidores Lenovo restantes serão faturados na Lenovo dia 30/09. - Foram entregues os switches ToRs e já foram instalados fisicamente nos racks. - O término previsto foi alterado para 28/11/2025.

PDI-24-R1-N-26 - Implantação de solução de virtualização

Descrição							
Estudo de soluções de virtualização existentes no mercado e contratação do VmWare.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	31/jan/25	31/jan/25	19/dez/25		CINF	STI	50

Atividades	Situação
Testes com a solução Suse.	Cancelado
Testes com a solução Microsoft (hyper-v).	Concluído
Contratação do Vmware (licenciamento como serviço).	Em andamento
Implantação da solução	Não iniciado

Observações
A SEPRO está realizando a POC de uma ferramenta de virtualização (SANGFOR). Devido a esse teste o TR ainda pode sofrer mudanças.

PDI-24-R1-N-27 - Implantação do Windows 11 nos PCs/Notebooks da JE-GO

Descrição							
Migração do SO Windows 10 para o Windows 11 nas estações de trabalho e notebooks.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/abr/25	01/abr/25	19/dez/25		CINF	STI	40

Atividades	Situação
Realização de testes com Windows 11 no ambiente de TI da JE-GO.	Concluído
Homologação do Windows 11 nos PCs e notebooks.(TRE e Zonas)	Concluído
Instalação/migração do Windows 11 nos PCs da sede.	Em andamento
Instalação/migração do Windows 11 nos PCs das ZE.	Em andamento

Observações
- O término previsto foi alterado para 19/12/2025 em razão da implantação do link da BRFibra. - Foram atualizados até o momento 345 computadores com Windows 11.

PDI-25-1-10-N - Proteção Avançada contra Ameaças Cibernéticas - NGFW

Descrição							
SEI: 24.0.000011477-0 Registro de preços para aquisição de Solução de Firewall/Gateway VPN com o objetivo de garantir a conectividade de rede entre as unidades remotas e a sede do TER-GO, melhorar o nível de segurança de acesso aos dados e os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	26/jul/24	26/jul/24	19/dez/25		CINF	STI	50
Atividades					Situação		
Finalização do Termo de Referencia					Em andamento		
Licitar ou aderir a Ata					Não iniciado		
Recebimento dos equipamentos					Não iniciado		
Implantação da solução					Não iniciado		
Aceite definitivo					Não iniciado		
Observações							
• ARP anterior foi recusada pelo órgão detentor. • Rota final de elaboração do TR para licitação.							

PDI-25-1-11-N - Rastreabilidade e Auditoria de Dados na Nuvem - Varonis

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	20/ago/25	20/ago/25	31/out/25		CINF	STI	20
Atividades					Situação		
Reunião de kick-off do projeto					Concluído		
Prova de conceito					Em andamento		
Implantação definitiva					Não iniciado		
Testes e validação					Não iniciado		
Observações							
Projeto em fase de POC.							

PDI-25-1-12-N - Escritório Virtual Seguro - RemoteApp

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/25	01/jul/25	31/out/25		CINF	STI	30
Atividades						Situação	
Migração dos usuários que utilizavam RemoteApp						Concluído	
Exclusão dos usuários que fazem acesso direto via RDP.						Em andamento	
Envio de e-mail informando sobre nova modalidade de acesso remoto (+seguro)						Não iniciado	

PDI-25-1-13-N - Modernização da Comunicação por Voz - VoIP

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/25	01/jul/25	31/out/25		CINF	STI	30
Atividades							Situação
Verificação de capacidade para atender a demanda (levantamento de equipamentos necessários)							Concluído
Configuração dos equipamentos (Switches e Checkpoints)							Em andamento
Disponibilização da infra para a CEIN para o Anexo I							Em andamento
Disponibilização da infra para a CEIN para o Anexo II							Não iniciado
Disponibilização da infra para a CEIN para a Sede							Não iniciado
Observações							
- Os equipamentos da Sede e Anexo I estão configurados e disponíveis para a CEIN. - Anexo II ainda está na fase de projeto.							

PDI-25-1-14-N - Salvaguarda e Resiliência das Informações - Netbackup

Descrição							
25.0.000007924-6 - Netbackup							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	03/jun/25	03/jun/25	28/nov/25		CINF	STI	30
Atividades						Situação	
Reunião de kick-off do projeto.						Concluído	
Recebimento dos equipamentos e licenças.						Concluído	
Implantação da solução						Em andamento	
Criação das novas rotinas de backup						Não iniciado	
Validação da solução						Não iniciado	
Aceite definitivo						Não iniciado	
Observações							
Aguardando entrega dos Switches SAN (nova prorrogação) para implantação.							

PDI-25-1-15-N - Eleitores do Futuro - 14 Escolas Municipais de Goiânia

Descrição							
Projeto Eleitor do Futuro SEI nº 25.0.000012737-2							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	11/set/25	11/set/25	30/set/25		CSEL	DG	10
Atividades						Situação	
Levantamento das informações junto à entidade demandante						Concluído	
Entrega da Base de Candidatos						Em andamento	
Entrega da Base de Eleitores						Em andamento	
Configuração da Eleição						Em andamento	
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)						Não iniciado	
Entrega das Listas de Eleitores						Não iniciado	
Geração de Mídias						Não iniciado	
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas						Não iniciado	
Retirada das Urnas Eletrônicas						Não iniciado	
Suporte às Eleições no dia da eleição						Não iniciado	
Devolução das Urnas Eletrônicas						Não iniciado	

PDI-25-1-16-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Anhanguera

Descrição							
SEI nº 25.0.000012787-9							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	15/set/25	15/set/25	21/out/25				

PDI-25-1-17-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Turvelândia

Descrição							
SEI n. 25.0.000012927-8							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	16/set/25	16/set/25	20/out/25				

PDI-25-1-5-N -Sistema de Registro de IAs (REGIA)

Descrição							
Criação do “Formulário de Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial” SEI nº 25.0.000008198-4 O Gestor da Unidade utilizará o formulário para cadastrar e atualizar (caso dados já tenham sido informados) dados dos servidores da sua Unidade que utilizam alguma ferramenta de inteligência artificial.							

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	16/jun/25	17/jun/25	30/set/25		CESCO	STI	80

Atividades	Situação
Levantamento de requisitos	Concluído
Construção do protótipo e validação	Concluído
Modelagem de dados	Concluído
Desenvolvimento do sistema	Concluído
Teste e melhorias	Em andamento
Homologação	Não iniciado
Implantar em produção	Não iniciado

Observações
- O sistema está em fase de testes e validação; - Foi designado o colaborador terceirizado para apoiar o projeto.

PDI-25-1-8-N - Eleitores do Futuro - Centro de Ensino em Período Integral Professor César Augusto Ceva - CEPI - Ipameri

Descrição							
Eleição - Projeto Eleitores do Futuro SEI Nº 25.0.000008732-0							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	11/ago/25	11/ago/25	08/set/25	08/set/25	CSEL		100

Atividades	Situação
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Concluído
Entrega da Base de Candidatos	Concluído
Entrega da Base de Eleitores	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído
Entrega das Listas de Eleitores	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Concluído
Retirada das Urnas Eletrônicas	Concluído
Suporte às Eleições no dia da eleição	Concluído
Devolução das Urnas Eletrônicas	Concluído

PDI-25-1-9-N - Modernização dos Links Eleitorais -BRFibra e Claro

Descrição							
25.0.000009882-8 - BRFibra 25.0.000010152-7 - Claro S/A							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	25/ago/25	25/ago/25	28/nov/25		CINF	STI	20

Atividades	Situação
Reunião de kick-off do projeto de implantação da BRFIBRA	Concluído
Implantação dos links	Em andamento
Testes de aceitação	Não iniciado
Implantação de solução Anti-DDoS	Não iniciado
Aceite Definitivo (Links)	Não iniciado
Recebimento dos equipamentos (Modem 5G)	Não iniciado
Verificação de conformidade dos modems	Não iniciado
Inclusão dos chips e roteadores no controle patrimonial	Não iniciado
Aceite Definitivo (Modems 5G)	Não iniciado

Observações

Foram implantados até o momento:							
Cartórios:							
SÃO DOMINGOS							
SANTA HELENA							
JATAI							
POSSE							
ALVORADA DO NORTE							
FAZENDA NOVA							
ANÁPOLIS							
APARECIDA							
CATALÃO							
SENADOR CANEDO							
MORRINHOS							
ANICUNS							
ITABERAI							
GOIANIRA							
MINEIROS							
ITUMBIARA							
PLANALTINA							
CRISTALINA							
QUIRINÓPOLIS							
VALPARAÍSO							
NIQUELÂNDIA							
Trindade							
LUZIANIA							
URUAÇU							
RIO VERDE							
CAMPOS BELOS							
Vapt Vupts:							
VAPT VUPT CAMPINAS							
VAPT VUPT MANGALÔ							
VAPT VUPT SENADOR CANEDO							
VAPT VUPT ARAGUAIA SHOPPING							
VAPT VUPT MINEIROS							
VAPT VUPT ANAPOLIS SUL							
LUZIANIA							
GARAVELO							

PDI-25-1-7-N - Sistema de Controle de Mídias das Urnas Eletrônicas

Descrição							
Objetivo: Migrar o sistema de controle de mídias(movimentações, emissão de relatórios) para APEX. SEI: 24.0.000009577-6							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Não iniciado					CESCO	CSEL	
Atividades						Situação	
Definição do escopo e Levantamento de requisitos						Não iniciado	
Construção do protótipo e validação						Não iniciado	
Modelagem de dados						Não iniciado	
Desenvolvimento do sistema						Não iniciado	
Teste e melhorias						Não iniciado	
Homologação						Não iniciado	
Implantar em produção						Não iniciado	

ELE26-25-R1-01 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 2

Descrição

[https://app.powerbi.com/view?
r=eyJrljoiMzlhMmM4NzctNTEyZS00OThjLTljZTAzMzUzMmRkZmFjODY4IiwidCI6IjljZTJjA4NzlyLTJfOWUtNGVkb2ZlIn2VkLThhMmI3N2ZmM2Q5Yy9](https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMzlhMmM4NzctNTEyZS00OThjLTljZTAzMzUzMmRkZmFjODY4IiwidCI6IjljZTJjA4NzlyLTJfOWUtNGVkb2ZlIn2VkLThhMmI3N2ZmM2Q5Yy9)

<https://app.powerbi.com/view:>
r=evrIrljojmZlzhMmM4NzctNTEvZS00OThjLTliZTAzMzUzMmBkZmFiODY4IiwidCI6IjI2ZiA4NzIvLTFiOWUtNGVkbZS1iN2VkLTlhMmI3N2ZmM2O5YvI9

Quantitativo de defeitos por modelo:

Análise da minuta pelo CGSI, DG e SGP	Concluído
Aprovação e publicação do normativo	Concluído

PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	21/fev/25	24/fev/25	28/ago/25	28/ago/25	CSEL	DG	100

Atividades	Situação
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade - até 5 dias depois do pedido	Concluído
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Concluído
Elaboração da Minuta do Acordo de Colaboração	Concluído
Recebimento da base de Eleitores	Concluído
Recebimento da base de Candidatos	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Validação das Bases de candidatos, eleitores e seções	Concluído
Entrega das Listas de Eleitores	Concluído
Geração das Mídias	Concluído
Carga e Lacre das urnas eletrônicas	Concluído
Retirada das urnas eletrônicas	Concluído
Suporte no dia da Eleição - Nova data para a eleição	Cancelado
Devolução das urnas eletrônicas	Concluído
Novo Recebimento da base de Candidatos	Concluído
Nova Configuração da Eleição	Concluído
Nova Geração de Mídias	Concluído
Nova Carga e Lacre das urnas eletrônicas	Concluído
Nova Retirada das urnas eletrônicas	Concluído
Suporte no dia da Eleição	Concluído
Devolução das urnas eletrônicas	Concluído

Observações

A data da eleição foi adiada pela ASGMG por recursos no processo eleitoral para inclusão de novos candidatos.

PDI-24-R1-N-24 - Customização da solução GLPI para uso como ITSM

Descrição							
Adequação da solução GLPI para uso como Sistema de Gestão de Serviços de TI (ITSM).							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	10/abr/25	10/abr/25	31/jul/25	07/jul/25	CINF	STI	100

Atividades	Situação
Instalação da solução GLPI.	Concluído
Definição e criação dos grupos de usuários e atendentes.	Concluído
Revisão e configuração do Catálogo de Serviços no GLPI.	Concluído
Configuração e testes das Interfaces do usuário e analista.	Concluído
Definição dos fluxos simplificado para os chamados (chamado, e-mail, WhatsApp).	Concluído

Observações

Entrou em produção o módulo de Gestão de Chamados do GLPI.
Foram concluídas as atividades:

- SLAs
- Catálogo de Serviço de TI
- Definição de Perfis das equipes da TI.
- Em ajustes finais das configurações do GLPI.
- Finalizando a configuração das interfaces do usuário e analista. Serão incluídas outras unidades além da CINF e da SESCO.

PDI-25-1-1 - Eleição dos Dirigentes das Escolas Municipais de São Miguel do Passa Quatro

Descrição							
SEI nº 25.0.000005936-9							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	30/abr/25	30/abr/25	02/jun/25	02/jun/25	CSEL		100

Atividades	Situação
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Concluído
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade	Concluído
Elaboração do Acordo de Colaboração	Concluído
Envio da Análise de Viabilidade e da Minuta do Acordo para parecer do Juiz da 31ª ZE	Concluído
Manifestação do Juiz da 31ª ZE	Concluído
Análise e Decisão da Presidência do TRE-GO	Concluído
Assinatura do Acordo de Colaboração (TRE e Entidade)	Concluído
Recebimento da Base de Eleitores	Concluído
Recebimento da Base de Candidatos	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído
Entrega das Listas(Candidatos e Eleitores)	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Concluído
Retirada das Urnas Eletrônicas	Concluído
Suporte às Eleições	Concluído
Devolução das Urnas Eletrônicas - até 2 dias após a eleição	Concluído

PDI-25-1-6-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Crixás

Descrição							
SEI nº 25.0.000009199-8							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/jul/25	01/jul/25	12/ago/25	12/ago/25	CSEL	PRES	100

PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/jul/24	01/jul/24	21/fev/25	21/fev/25	CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	100

ATIVIDADES

Atividades	Situação
Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ Resolução 335/2020 na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados	Concluído
Elaboração do Termo de Referência	Concluído
Realização da licitação	Concluído
Execução da Ata de registro de preços	Concluído
Observações	
O projeto teve o seu andamento retomado na reunião do dia 30/07/2025.	

1 item

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

Descrição

Objetivo da demanda:

Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.

Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

A falta catalogação dos ativos de TI, tanto *hardware* quanto *software*, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataques cibernéticos de qualquer natureza.

Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Gestão de TI e apoio à Governança

Desenvolvimento e administração de soluções de TIC

Gestão de infraestrutura de TIC

Suporte técnico das soluções de TIC

Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

1. Visibilidade de todo o parque de *hardware* do Tribunal.

2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional.

3. Visibilidade de todos os *softwares* em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.

Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados

Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados.

Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026

Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):**Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?**

Não

Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:**Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):**

Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em *Software* Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	07/jan/22	07/jan/22	15/jul/25	07/jul/25	CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	100

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Aquisição da solução	Concluído
Implementação de protocolo seguro SNMP com https no OCS.	Concluído
Instalação e configuração da solução	Concluído
Implantação	Concluído
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	Concluído
Observações	
O projeto foi concluído com a finalização das atividades :	
- Em fase de análise do CMDB do GLPI; - Analisar-se o GLPI consegue atender a disponibilização do CMDB; - Realização do inventário dos ativos de infraestrutura utilizando o GLPI.	

PDI-24-R1-N-10 - Eleição dos Dirigentes para os Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores - PT

Descrição							
SEI Nº 24.0.000019889-3							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Cancelado	03/fev/25	03/fev/25	08/jul/25	26/mar/25	CSEL	DG	30

Atividades	Situação
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Concluído
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade	Concluído
Elaboração do Acordo de Colaboração	Concluído
Análise e Autorização da Presidência do TRE-GO	Cancelado
Entrega da Base de Candidatos	Não iniciado
Entrega da Base de Eleitores	Não iniciado
Configuração da Eleição	Não iniciado
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Não iniciado
Entrega das Listas de Eleitores	Não iniciado
Geração de Mídias	Não iniciado
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Não iniciado

Retirada das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Suporte às Eleições	Não iniciado
Devolução das Urnas Eletrônicas - até 2 dias após a eleição	Não iniciado
Observações	
As informações foram encaminhadas pelo partido. Aguardando decisão da Presidência do TRE-GO, sobre o atendimento da solicitação de empréstimo das Urnas Eletrônicas.	

PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores

Descrição							
SEI: 22.0.000008626-0 Objetivo da demanda: Desenvolver formulário pré preenchido de recadastramento de servidores, visando agilizar e otimizar o processo de revisão do cadastro de servidores. Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta): Facilitar o processo de solicitação de alteração de dados cadastrais pelos servidores, com a permissão de alteração de dados livres e possibilidade de solicitação de alteração de dados que exigem comprovação, com a anexação de documentos. Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)? Macroprocesso de apoio: Gestão de Pessoas / Processo: Gestão do quadro de pessoal Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução): Facilidade e celeridade da execução do processo de recadastramento de servidores, tanto para o servidor quanto para a unidade responsável. Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada): 8 - Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas. Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico): Disponibilização de formulário eletrônico pré-preenchido com os dados dos servidores, com opção de solicitação de alteração, anexação de documentos e possibilidade de deferimento pela unidade responsável, com gravação automática no SGRH. Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante? Não Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda: Não se aplica Custo (Informe a estimativa de custo do projeto): Não se aplica							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Suspensão	27/fev/23	27/fev/23	30/mar/25		CESCO	SGP	10

Atividades	Situação
Planejamento	Adiado
Criação e configuração do ambiente de testes	Não iniciado
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
A SGP informou no SEI: 24.0.000019107-4 despacho ID. nº 0972047, não possuir no momento, condições de reapresentar o sistema para priorização do CGTIC, o que foi confirmado pela AGSGP e Secretária de Gestão de Pessoas (ID. 0972047). Desta forma, este projeto ficará suspenso até que seja reapresentado pela unidade demandante, com os detalhes necessários ao seu desenvolvimento (vide último parágrafo do despacho do Secretário de TI, ID. nº 1088674).	

PDI-25-1-2 - Plenário Virtual

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Suspense	03/jun/24	03/jun/24	31/jul/24		ASPJE	SJD	10
Atividades							Situação
Realização de testes pela unidade demandante							Não iniciado
Homologação do produto							Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção							Não iniciado
Observações							
• O projeto foi suspenso em reunião do CTGTI ocorrida no dia 21/03/2025.							

PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em fila					CESCO	EJE	

ATIVIDADES**Observações**

Verificar se outros Regionais possuem sistema informatizado que atendem a demanda.

PDI-24-R1-N-17 - Sistema de disponibilização de Acórdãos na internet (Ementário)**Descrição**

SEI: 24.0.000019107-4

Objetivo do Sistema:

Otimizar a disponibilização ao público externo, diretamente na internet, do inteiro teor dos acórdãos para pesquisa.

Serviço a ser transformado digitalmente:

Disponibilização, na internet, dos acórdãos lançados na intranet para que alcance o público externo.

Proposta resumida: A proposta visa à disponibilização, na internet, dos acórdãos publicados na intranet para que alcance o público externo que busca por pesquisa.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em fila	10/mar/25	10/mar/25			CESCO	SGI	10

Atividades	Situação
Formalização da demanda	Não iniciado
Desenvolvimento	Não iniciado
Testes e conclusão	Não iniciado

Observações

Em reunião do CTGTI ocorrida no dia 02/04/2024, o status do projeto foi alterado para "A priorizar" devido a mudança de escopo do projeto.

PDI-25-1-3 - Agenda Institucional

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em fila					CESCO	APRISQ	

ATIVIDADES**Observações**

Priorizado pelo CGTIC na reunião do dia 2025-05-13

PDI-25-1-4 - Cadastro de Terceirizados**Descrição**

SEI: 25.0.000002881-1

Construção de sistema para gerenciamento do cadastro de Terceirizados do Tribunal. Vide Termo de Abertura de Projeto em anexo.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento					CESCO	ASPLAN	

PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE**Descrição**

SEI: 24.0.000003403-3

Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online dos servidores ao seu próprio dossiê funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/21	07/jan/21	29/mar/24		CESCO	SGP	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
Aguardando homologação do sistema pela SGP.

PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto

Descrição							
SEI nº: 24.0.000007445-0 O e-Voto é uma ferramenta da Justiça Eleitoral de Santa Catarina para votações eletrônicas da comunidade. Esta ferramenta permite realizar eleições, plebiscitos e referendos de forma tele presencial, minimizando os custos de logística de urnas e facilitando o acesso dos eleitores, que podem votar de qualquer computador ou dispositivo móvel. Adoção de um sistema de votação online E-voto desenvolvido pelo TRE-SC.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	05/mai/24	05/mai/24	31/mar/25		CESCO	EJE	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Em andamento
Observações	
Realização de testes finais no ambiente de produção.	

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)

Descrição							
- Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal. - Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	29/abr/22	29/abr/22	26/abr/24		CESCO	SAO	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Análise de requisitos	Concluído
Desenvolvimento funcionalidades	Concluído
Testes de funcionalidades	Concluído
Homologação do PCA para PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas)	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
SEI 25.0.000008359-6 encaminhado para ADAAC solicitando as seguintes atividades: - Aplicar filtros nas tabelas de materiais e serviços, e posterior vinculação destas informações com as demandas; - Enviar o PCA para PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas) para avaliação, utilizando funcionalidade própria do sistema.	

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Descrição							
http://wp.tre-go.jus.br/							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	30/jun/23	30/jun/23	31/mar/25		CESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído

Realização de testes pela equipe de desenvolvimento	Em andamento
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
- O andamento do projeto foi retomado. Em fase de implementação, refinando a pesquisa de documentos com utilização de IA. Foi disponibilizado pela CINF uma máquina virtual para implementação dessa funcionalidade. - É necessária a definição de um grupo de trabalho multidisciplinar com representantes das áreas de negócio para gerir o projeto.	

PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI

Descrição							
SEI: 23.0.000016671-5							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	16/fev/24	16/fev/24	30/set/25		CESCO	DG	90

Atividades	Situação
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos	Concluído
Planejamento	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Realização de testes pela equipe técnica	Em andamento

Observações
- O projeto foi retomado com o módulo desenvolvido pelo TSE com prazo final previsto alterado para 30/09/2025; - O módulo de peticionamento foi disponibilizado para homologação pela unidade demandante.

PDI-24-R1-N-16 - Monitoramento de impressões

Descrição							
SEI: 24.0.000019107-4 SEI: 25.0.000011650-8 Objetivo do Sistema: Acompanhamento do número de impressões e consumo de suprimentos por impressora. Serviço a ser transformado digitalmente: Leitura do número de impressões por equipamento Proposta resumida: Desenvolvimento de sistema que possibilite o monitoramento do número de impressões realizadas por equipamento. Isso facilitaria o controle de impressões e consequentemente o consumo de papel.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	18/dez/24	18/dez/24	30/mai/25		CINF	ATEND	90

Atividades	Situação
Formalização da demanda	Concluído
Desenvolvimento	Concluído
Testes e conclusão	Em homologação

Observações
A CINF encaminhará um SEI para a unidade demandante homologar o projeto.

PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan

Descrição							
SEI nº: 22.0.000007683-3 WeKan é um aplicativo de quadro Kanban de código aberto, similar ao Trello, que permite a organização e gerenciamento de tarefas usando cartões e colunas para representar diferentes etapas de um projeto ou fluxo de trabalho. Ele é projetado para facilitar o acompanhamento visual do progresso das tarefas e promover a colaboração em equipe.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	10/mar/25	10/mar/25	30/set/25	02/set/25	CESCO	INTEGRAZONAS	100

Atividades	Situação
Instalação e configuração	Concluído
Testes e homologação	Concluído

Disponibilização em ambiente de produção	Concluído
Observações	
A implantação do sistema WEKAN foi homologada pelo demandante (DOC SEI ID. 1191165), finalizando o processo de implantação.	

PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede sem fio

Descrição							
SEI nº 23.0.000003147-0 Aquisição de solução de rede sem fio (Wi-fi). com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral. Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Adiado	28/fev/23	28/fev/23	19/dez/24		CINF	STI	60
Atividades						Situação	
Elaboração do ETP.						Concluído	
Elaboração do DOD.						Concluído	
Implementação da solução.						Não iniciado	
Execução da ARP.						Não iniciado	
Processo de licitação.						Não iniciado	
Adequação das especificações e coleta de preços estimativos.						Em andamento	
Elaboração do TR.						Em andamento	

PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Sobrestado	19/ago/24	19/ago/24	19/dez/25		CESCO	STI	70
Atividades						Situação	
Planejamento						Concluído	
Criação e configuração de ambiente de teste interno						Concluído	
Criação e configuração do ambiente de testes em nuvem						Suspense	
Realização de testes pela unidade demandante						Em andamento	
Homologação do produto						Não iniciado	
Disponibilização em ambiente de produção						Não iniciado	
Observações							
• O projeto foi sobrestado em razão do envolvimento das equipes com outros projetos prioritários.							

PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Sobrestado	03/fev/25	03/fev/25	29/ago/25		CESCO, CINF	STI	50
Atividades						Situação	
Realização de testes com o keycloak						Em andamento	
Inserção de sistemas no Portal						Em andamento	
Implantação de RDP via remoteapp						Concluído	
Implementação do ODIN via F5						Não iniciado	



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 22/09/2025, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRAYTON MARQUES SANTANA, COORDENADOR(A)**, em 22/09/2025, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 22/09/2025, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 22/09/2025, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO CÉSAR RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 24/09/2025, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1211083** e o código CRC **A18849CC**.

25.0.000001155-2

1211083v25

