



ATA

REUNIÃO DO COMITÊ TÉCNICO GESTOR DE TI (CTGTI) - 17/2025

1. Identificação

Data: 02/10/2025	Início: 16:15 Término: 17:53	Local: Sala de reunião da STI
Finalidade: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 Gestão 24/26		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

4. Pauta

- Questionamentos acerca dos projetos:
- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados, suspensos, sobrestados e em homologação.


5. Participantes

Nome	Cargo	E-mail
Brayton Marques Santana	Coordenador de Sistemas Corporativos	brayton.santana@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	Coordenador de Sistemas Eleitorais	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Frank Wendell Ribeiro	Secretário de Tecnologia da Informação	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	Assessor de Planejamento, Governança e Gestão	paulo.taira@tre-go.jus.br
Roberto César Rodrigues	Coordenador de Infraestrutura	roberto.rodrigues@tre-go.jus.br


6. Encaminhamentos

- Os registros de informações detalhadas dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas (vide item 8 - Detalhamento dos Projetos);
- A atividade: Implantação de criptografia em sistemas da infraestrutura (proxy, monitoramento e outros) do projeto: ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos foi sobrestada. O Coordenador de Infraestrutura sugeriu a criação de um novo projeto para tratar dessa atividade posteriormente.
- A descrição do projeto: PDI-25-1-13-N - Modernização da Comunicação por Voz - VoIP foi alterada para: PDI-25-1-13-N - Configuração dos Ativos de TI para utilização de VOIP.
- Projetos concluídos:
- PDI-25-1-13-N - Configuração dos Ativos de TI para utilização de VOIP;
- PDI-25-1-15-N - Eleitores do Futuro - 14 Escolas Municipais de Goiânia;
- PDI-24-R1-N-16 - Monitoramento de impressões;
- PDI-25-1-19-N - Espaço do Servidor - Acesso Aposentados (projeto concluído em junho de 2025, inserido no portfólio na reunião do dia 02/10/2025).
- O Coordenador de Sistemas Eleitorais solicitou a inclusão do projeto: PDI-25-1-18-N - Eleição de Gestores das Unidades Escolares - Iporá no portfólio;
- Próxima reunião agendada para o dia 20/10/2025 às 16:00.

7. Gráficos do Portfólio de Projetos

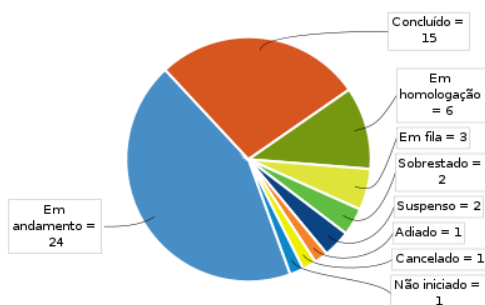

Total: 55. Gráfico por: Status

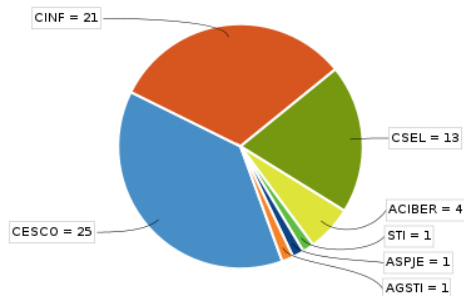

Total: 55. Gráfico por: Unidade responsável

7.1. Relação dos projetos em acompanhamento pelo CTGTI (internos + priorizados pelo CGTIC)

Atividades	Situação	Execução%	Unidade responsável	Equipe	Unidade demandante	Término real
ELE26-25-R1-03 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 3	Em andamento	30	CSEL	SEVIN	DG	
ELE26-25-R1-04 - 16º Simulado Nacional de Hardware 2026 (16SNH2026)	Em andamento	10	CSEL	SEVIN, SECAD	DG	
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Em andamento	50	ACIBER, CESCO, CINF	ACIBER, CESCO, CINF, CSEL	CGSI	
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Em andamento	80	ACIBER, CESCO, CINF	ACIBER, SEDIS, SESCO, SEPRO, SESRE	CGSI	
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Em andamento	40	ACIBER, CINF	ACIBER, CESCO, CINF, CSEL	CGSI	
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI	ACIBER, CESCO, CINF, STI	CGSI	
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Em andamento	80	ACIBER, CESCO, CINF	ACIBER, SEDIS, SEAID, SEPRO, SESRE	CGSI	
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	30	CESCO	SEDIS	VPCRE	
PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição	Em andamento	50	CESCO	SEDIS	PRES, SGP	
PDI-24-R1-N-15 - Sistema de Gestão de Alimentação de Mesários	Em andamento	10	CESCO	SEDIS	SAO	
PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho	Em andamento	80	CESCO	SEAID	SGP	
PDI-24-R1-N-25 - Implantação de equipamentos e softwares nos Datacenters da JE-GO	Em andamento	70	CINF	SEPRO	STI	
PDI-24-R1-N-26 - Implantação de solução de virtualização	Em andamento	50	CINF	SEPRO	STI	
PDI-24-R1-N-27 - Implantação do Windows 11 nos PCs/Notebooks da JE-GO	Em andamento	40	CINF	SEMIC	STI	
PDI-25-1-10-N - Proteção Avançada contra Ameaças Cibernéticas - NGFW	Em andamento	50	CINF	SESRE	STI	
PDI-25-1-11-N - Rastreabilidade e Auditoria de Dados na Nuvem - Varonis	Em andamento	20	CINF	SEPRO, SESRE	STI	
PDI-25-1-12-N - Escritório Virtual Seguro - RemoteApp	Em andamento	30	CINF	SESRE	STI	
PDI-25-1-14-N - Salvaguarda e Resiliência das Informações - Netbackup	Em andamento	30	CINF	SEPRO	STI	
PDI-25-1-16-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Anhanguera	Em andamento	10	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	

Atividades	Situação	Execução%	Unidade responsável	Equipe	Unidade demandante	Término real
PDI-25-1-17-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Turvelândia	Em andamento	10	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	
PDI-25-1-18-N - Eleição de Gestores das Unidades Escolares - Iporá	Em andamento	10	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD	DG	
PDI-25-1-4 - Cadastro de Terceirizados	Em andamento	40	CESCO	SEDIS	ASPLAN	
PDI-25-1-5-N -Sistema de Registro de IAs (REGIA)	Em andamento	80	CESCO	SEDIS	STI	
PDI-25-1-9-N - Modernização dos Links Eleitorais - BRFibra e Claro	Em andamento	50	CINF	SESRE	STI	
PDI-25-1-7-N - Sistema de Controle de Mídias das Urnas Eletrônicas	Não iniciado		CESCO	SEAID	CSEL	
ELE26-25-R1-01 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 1	Concluído	100	CSEL	SEVIN	DG	30/jun/25
ELE26-25-R1-02 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 2	Concluído	100	CSEL	SEVIN	DG	20/ago/25
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Concluído	100	AGSTI, CINF	ACIBER	CGSI	30/jul/25
PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	28/ago/25
PDI-24-R1-N-16 - Monitoramento de impressões	Concluído	100	CINF	CINF	ATEND	23/set/25
PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan	Concluído	100	CESCO	SESCO	INTEGRAZONAS	02/set/25
PDI-24-R1-N-24 - Customização da solução GLPI para uso como ITSM	Concluído	100	CINF	SEGEC	STI	07/jul/25
PDI-25-1-1 - Eleição dos Dirigentes das Escolas Municipais de São Miguel do Passa Quatro	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	02/jun/25
PDI-25-1-13-N - Configuração dos Ativos de TI para utilização de VOIP	Concluído	100	CINF	SESRE	STI	02/out/25
PDI-25-1-15-N - Eleitores do Futuro - 14 Escolas Municipais de Goiânia	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	30/set/25
PDI-25-1-19-N - Espaço do Servidor - Acesso Aposentados	Concluído	100	CESCO	SEDIS	SGP	17/jun/25
PDI-25-1-6-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Crixás	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD	PRES	12/ago/25
PDI-25-1-8-N - Eleitores do Futuro - Centro de Ensino em Período Integral Professor César Augusto Ceva - CEPI - Ipameri	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD	DG	08/set/25
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Concluído	100	CESCO, CINF		ÓRGÃOS EXTERNOS	21/fev/25
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Concluído	100	CINF	CESCO, CINF, CSEL	ÓRGÃOS EXTERNOS	07/jul/25
PDI-24-R1-N-10 - Eleição dos Dirigentes para os Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores - PT	Cancelado	50	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Suspenso	10	CESCO	SEDIS	SGP	
PDI-25-1-2 - Plenário Virtual	Suspenso	10	ASPJE	ASPJE	SJD	
PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos	Em fila		CESCO	SEDIS	EJE	
PDI-24-R1-N-17 - Sistema de disponibilização de Acórdãos na internet (Ementário)	Em fila	10	CESCO	SESCO	SGI	
PDI-25-1-3 - Agenda Institucional	Em fila		CESCO	SESCO	APRISQ	
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO	SEDIS	SGP	
PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votamet/E-voto	Em homologação	90	CESCO	SEAID	EJE	
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em homologação	90	CESCO	SEAID	SAO	
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em homologação	90	CESCO	SESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS	

Atividades	Situação	Execução%	Unidade responsável	Equipe	Unidade demandante	Término real
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI	Em homologação	90	CESCO	SESCO	DG	
PDI-24-R1-N-20 - Controle de Capacitação da EJE	Em homologação	90	CESCO	SESCO	EJE	
PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede sem fio	Adiado	60	CINF		STI	
PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes	Sobrestado	70	CESCO	SEDIS	STI	
PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)	Sobrestado	50	CESCO, CINF	SEPRO, SESRE	STI	

7.2. Projetos/macro atividades em andamento com término previsto de até 60 dias

Atividades	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante	Término previsto
ELE26-25-R1-04 - 16º Simulado Nacional de Hardware 2026 (16SNH2026)	Em andamento	10	CSEL	DG	09/out/25
PDI-25-1-17-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Turvelândia	Em andamento	10	CSEL	DG	20/out/25
PDI-25-1-16-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Anhanguera	Em andamento	10	CSEL	DG	21/out/25
PDI-25-1-5-N -Sistema de Registro de IAs (REGIA)	Em andamento	80	CESCO	STI	30/out/25
PDI-25-1-12-N - Escritório Virtual Seguro - RemoteApp	Em andamento	30	CINF	STI	31/out/25
PDI-25-1-11-N - Rastreabilidade e Auditoria de Dados na Nuvem - Varonis	Em andamento	20	CINF	STI	31/out/25
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Em andamento	40	ACIBER, CINF	CGSI	31/out/25
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Em andamento	50	ACIBER, CESCO, CINF	CGSI	31/out/25
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI	CGSI	31/out/25
PDI-25-1-14-N - Salvaguarda e Resiliência das Informações - Netbackup	Em andamento	30	CINF	STI	28/nov/25
PDI-25-1-9-N - Modernização dos Links Eleitorais - BRFibra e Claro	Em andamento	50	CINF	STI	28/nov/25
PDI-24-R1-N-25 - Implantação de equipamentos e softwares nos Datacenters da JE-GO	Em andamento	70	CINF	STI	28/nov/25
PDI-25-1-4 - Cadastro de Terceirizados	Em andamento	40	CESCO	ASPLAN	28/nov/25
PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho	Em andamento	80	CESCO	SGP	28/nov/25
PDI-24-R1-N-15 - Sistema de Gestão de Alimentação de Mesários	Em andamento	10	CESCO	SAO	28/nov/25
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	30	CESCO	VPCRE	28/nov/25
PDI-25-1-18-N - Eleição de Gestores das Unidades Escolares - Iporá	Em andamento	10	CSEL	DG	01/dez/25

8. Detalhamento dos projetos

ELE26-25-R1-03 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 3

Descrição							
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaWZkZmMjNmYtZDRiYS00MDA5LWFMNGYtMmIwZjE0NjUwY2FhliwidCI6IjI2ZjA4NzlyLTFjOWUtNGVkZS1iN2VkLThhMmI3N2ZmM2Q5Yy							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/set/25	01/set/25	19/dez/25		CSEL		30

ELE26-25-R1-04 - 16º Simulado Nacional de Hardware 2026 (16SNH2026)

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
----------	-----------------------	------------	---------------------	----------	---------------------	--------------------	-----------

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	15/set/25	15/set/25	09/out/25		CSEL		70

Atividades	Situação
Planejamento do Simulado de Hardware	Concluído
Configuração da Eleição - CFE	Concluído
Definição da ZE/Seções, Preparação e Replicação dos eleitores com biometria (ELO/MSSB)	Concluído
Liberação das versões da SEVIN para o 16º SNH	Concluído
Solicitação de geração dos pacotes no Intercad	Concluído
Concessão de Autorizações nos sistemas SISTOT, SIMON, MSSB e SOS	Concluído
Instalação dos Softwares necessários à realização do evento	Concluído
Preparação/Separação das urnas	Concluído
Geração e Validação dos pacotes no Intercad (município/zona, eleitores, seção e complemento município)	Concluído
Importação dos Dados no SISTOT (Candidatos e Seções)	Concluído
Impressão do Ambiente de Votação	Concluído
Geração de mídias	Concluído
Carga das Urnas - Qtde: 78 UE13 e 78 UE15	Concluído
Transmissão das Correspondências	Concluído
Votação na urna e Transmissão dos BU's - Qtde: 78 UE13 e 78 UE15	Concluído
Carga das Urnas - Qtde: 96 UE20 (UEFI Atual) e 96 UE20 (UEFI Atualizada)	Concluído
Transmissão das Correspondências	Concluído
Votação na urna e Transmissão dos BU's - Qtde: 96 UE20 (UEFI Atual)	Em andamento
Votação na urna e Transmissão dos BU's - Qtde: 96 UE20 (UEFI Atualizada)	Não iniciado
Carga das Urnas - Qtde: 78 UE22 (UEFI Atual) e 78 UE22 (UEFI Atualizada)	Não iniciado
Transmissão das Correspondências	Não iniciado
Votação na urna e Transmissão dos BU's - Qtde: 78 UE22 (UEFI Atual)	Não iniciado
Votação na urna e Transmissão dos BU's - Qtde: 78 UE22 (UEFI Atualizada)	Não iniciado
Validação dos Resultados no SISTOT	Não iniciado

ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes

Descrição
SEI: 25.0.000009298-6 Visa estabelecer e manter a configuração segura de ativos corporativos (dispositivos de usuário final, incluindo portáteis e móveis; dispositivos de rede; dispositivos não computacionais/ IoT; e servidores) e software (sistemas operacionais e aplicações) no ambiente da rede corporativa da justiça eleitoral de acordo de acordo com a seguinte classificação: I. ATIVOS DE INFRAESTRUTURA REDE, quais sejam os dispositivos de rede; II. ATIVOS DE APLICAÇÕES, quais sejam os sistemas operacionais e aplicações; III. ATIVOS DE USUÁRIOS, quais sejam os usuários finais; IV. ATIVOS DE DISPOSITIVOS, quais sejam os dispositivos de usuário final, incluindo portáteis, dispositivos não computacionais/ IoT e móveis e servidores.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	31/out/25		ACIBER, CESCO, CINF	CGSI	50

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração de minuta de normativo pela ACIBER e encaminhamento aos Coordenadores da STI para análise	Concluído
Consolidação pela ACIBER, das propostas de alterações realizadas pelos Coordenadores da STI	Não iniciado
Encaminhamento da minuta do normativo pelo Secretário de TI ao Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI)	Não iniciado
Análise da minuta pelo CGSI e DG	Não iniciado
Aprovação e publicação do normativo	Não iniciado

Observações
O processo está na ACIBER para consolidação das sugestões das Coordenadoria da STI com previsão de envio à STI no final do mês de agosto.

ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades

Descrição							
SEI nº 25.0.000009284-6 A gestão de vulnerabilidades tem como objetivo prevenir a exploração de vulnerabilidades técnicas na rede corporativa, por meio da aplicação sistemática das seguintes ações de prevenção, identificação, classificação e tratamento: I - adoção de ações técnicas preventivas conforme norma de Configuração Segura de Ativos de TI vigente; I - obtenção de informações para identificar vulnerabilidades técnicas em tempo hábil; II - avaliação de exposição às vulnerabilidades técnicas; III - adoção de medidas apropriadas e tempestivas para lidar com os riscos identificados.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/25		ACIBER, CESCO, CINF	CGSI	80
Atividades							Situação
Planejamento							Concluído
Elaboração de minuta de normativo pela ACIBER e encaminhamento aos Coordenadores da STI para análise.							Concluído
Consolidação pela ACIBER, das propostas de alterações realizadas pelos Coordenadores da STI							Em andamento
Encaminhamento da minuta do normativo pelo Secretário de TI ao Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI)							Não iniciado
Análise da minuta pelo CGSI e DG							Não iniciado
Aprovação e publicação do normativo							Não iniciado
Observações							
Verificar com ACIBER a disponibilização consolidada das sugestões de alteração das Coordenadorias para retorno à STI.							

ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)

Descrição							
SEI nº 25.0.000001021-1 Dispõe sobre as regras e os procedimentos para a realização da gestão e monitoramento de registro de atividades (logs) no ambiente computacional do TRE-GO.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	31/out/25		ACIBER, CINF	CGSI	40
Atividades							Situação
Planejamento							Concluído
Revisão pela ACIBER, da minuta de normativo elaborado pela CINF e encaminhamento aos Coordenadores da STI para análise							Em andamento
Consolidação pela ACIBER, das propostas de alterações realizadas pelos Coordenadores da STI							Não iniciado
Encaminhamento da minuta do normativo pelo Secretário de TI ao Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI)							Não iniciado
Análise da minuta pelo CGSI e DG							Não iniciado
Aprovação e publicação do normativo							Não iniciado
Observações							
A equipe da ACIBER identificou a necessidade de implementação de medidas para atender as recomendações do grupo nacional de segurança cibernética do TSE, bem como a ENSEC-JUD; Será realizada reunião entre as equipes da CINF e ACIBER para deliberação sobre as referidas medidas.							

ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação

Descrição							
SEI: 25.0.000006720-5 Portaria Nº78/2022 (normativo que está vigente) Possui a finalidade de estabelecer as diretrizes para o controle de acesso e uso aceitável dos recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal, bem como os direitos e as responsabilidades dos usuários desses recursos.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	31/out/25		CINF, STI	CGSI	90
Atividades							Situação
Encaminhamento da minuta do normativo pelo Secretário de TI à Diretoria Geral							Concluído

Atividades	Situação
Consolidação pela ACIBER das propostas de alterações realizadas pelos Coordenadores da STI	Concluído
Elaboração de minuta de normativo pela ACIBER e encaminhamento aos Coordenadores da STI para análise	Concluído
Revisão da minuta de normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE	Concluído
Norma finalizada	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Planejamento	Concluído
Aprovação e publicação do normativo	Não iniciado
Análise da minuta pelo CGSI e DG	Em andamento
Observações	
Após a consolidação das sugestões das unidades da STI, a minuta de normativo foi encaminhada para apreciação da Diretoria Geral.	

ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos

Descrição							
SEI nº: 25.0.000011375-4 O uso de recursos criptográficos visa proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos pelas redes de computadores, assim como dos dados em repouso, armazenados em servidores, microcomputadores, dispositivos móveis e bancos de dados.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/25		ACIBER, CESCO, CINF	CGSI	80
Atividades							Situação
Planejamento							Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo							Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.							Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Linux.							Concluído
Implantação de criptografia em conexões VPN.							Concluído
Implantação de criptografia do Portal de acesso externo - escritório remoto.							Concluído
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS							Concluído
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS							Concluído
Implantação de criptografia em notebooks standalone							Concluído
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.							Concluído
Implantação da criptografia de dados armazenados nos novos storages IBM.							Concluído
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores							Em andamento
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores de aplicação e de Bancos de dados.							Sobrestado
Implantação de criptografia em sistemas da infraestrutura (proxy, monitoramento e outros).							Sobrestado
Revisão da minuta do documento normativo pela ACIBER e encaminhamento aos Coordenadores da STI para análise							Concluído
Consolidação pela ACIBER, das propostas de alterações realizadas pelos Coordenadores da STI							Não iniciado
Encaminhamento da minuta do normativo pelo Secretário de TI ao Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI)							Não iniciado
Análise da minuta pelo CGSI e DG							Não iniciado
Aprovação e publicação do normativo							Não iniciado
Observações							
A atividade https://tregoagsti.atlassian.net/browse/P2126R24-517 foi sobrestada em razão da necessidade de realização de planejamento do processo de disponibilização dos dados para as áreas de negócio. O SEI 25.0.000011375-4 com a minuta do normativo revisada pela ACIBER foi para análise do CTGTI.							

PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória

Descrição
SEI 23.0.000002275-6 Finalidade: desenvolvimento de uma solução informatizada para o controle de informações judiciais relacionadas a medidas que envolvem gestão e destinação de valores oriundos de fianças e penas pecuniárias. Ao final, haverá a conversão do controle dos registros manuais em livros de guarda obrigatória pelos cartórios eleitorais para meio eletrônico.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	30/ago/23	02/abr/25	28/nov/25		CESCO	VPCRE	30
Atividades						Situação	
Levantamento de requisitos						Concluído	
Desenvolvimento do cadastro de penalidades						Em andamento	
Realizar pré-apresentação do cadastro de penalidades						Não iniciado	
Observações							
Foi realizada reunião com a VPCRE: Foram apresentadas as telas iniciais do sistema; Ficou acordado que a referida unidade fará a validação dos requisitos definidos e a reestruturação do modelo.							

PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição

Descrição							
SEI: 25.0.000002881-1 Construção de sistema para gerenciamento do cadastro de Terceirizados do Tribunal. Vide Termo de Abertura de Projeto em anexo.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	05/ago/25	05/ago/25	19/dez/25		CESCO	PRES, SGP	50
Observações							
Aguardando o retorno do representante da unidade demandante para validação do ETP.							

PDI-24-R1-N-15 - Sistema de Gestão de Alimentação de Mesários

Descrição							
SEI: 24.0.000019107-4							
Objetivo do Sistema: Confeção, por meio de sistema informatizado, de lista de pagamento do benefício alimentação de mesários e colaboradores de cada uma das zonas eleitorais, para a sua melhor gestão.							
Serviço a ser transformado digitalmente: Serviço de criação de lista de pagamento para alimentação de mesários e colaboradores a serem pagos por pix e em dinheiro.							
Proposta resumida: A forma de distribuição de alimentação de mesários vem ao longo dos anos modificando. Desde 2022, surgiu a possibilidade de pagamento por pix. Esse serviço vem sendo realizado centralizadamente na AGSAO por meio de planilhas e de forma manual e interação com as zonas eleitorais, para excluir nomes, incluir nomes, pagar algumas pessoas por pix, outras por dinheiro. Considerando que essa atividade gera diversos riscos financeiros, inclusive para a imagem do Tribunal, faz-se necessário a criação de sistema que possibilite esse gerenciamento pela própria zona eleitoral, permitindo que ela trate os dados de sua zona eleitoral e, ao final, gere lista de pagamento, podendo ser pago por unidade Centralizada deste Tribunal							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	17/mar/25	17/mar/25	28/nov/25		CESCO	SAO	10
Atividades					Situação		
Formalização da demanda					Concluído		
Levantamento de requisitos					Em andamento		
Desenvolvimento					Em andamento		
Testes e conclusão					Não iniciado		
Observações							
Será realizada nova reunião com o representante da área de negócio para análise das novas especificações de requisitos. Houve substituição do representante da área de negócio. Quem está definindo os requisitos do sistema é o servidor Leonardo Eustáquio.							

PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho

Descrição
SEI: 25.0.000004637-2

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	14/abr/25	14/abr/25	28/nov/25		CESCO	SGP	80
Atividades						Situação	
Planejamento						Concluído	
Implantação						Concluído	
Realização de teste pela unidade demandante						Em andamento	
Homologação pela unidade demandante						Não iniciado	
Disponibilização em ambiente de produção						Não iniciado	
Observações							
Será agendada reunião com a equipe técnica para alinhamento da implantação, conforme os requisitos levantados na visita técnica ao TRE-PA.							

PDI-24-R1-N-25 - Implantação de equipamentos e softwares nos Datacenters da JE-GO

Descrição							
Instalação de equipamentos e softwares nos Datacenters deste Regional.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	03/fev/25	03/fev/25	28/nov/25		CINF	STI	70
Atividades							Situação
Instalação dos storages IBM.							Concluído
Instalação de 5 servidores Lenovo.							Concluído
Instalação elétrica para os novos racks.							Concluído
Aquisição e entrega do restante dos equipamentos necessários para o funcionamento dos Datacenters.							Em andamento
Migração dos dados do VNX 5400 para o novo storage IBM.							Em andamento
Observações							
Os servidores restantes Lenovo foram entregues (02/10) Já foi migrado toda a infraestrutura de VMs para o Storage IBM Falta migrar a GO1 (ainda no VNX) - infraestrutura já criada. Switches ToRs operacionais e testados. Foram entregues as Tapes LTO 9.							

PDI-24-R1-N-26 - Implantação de solução de virtualização

Descrição							
Estudo de soluções de virtualização existentes no mercado.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	31/jan/25	31/jan/25	19/dez/25		CINF	STI	50
Atividades							Situação
Testes com a solução Suse.							Cancelado
Testes com a solução Microsoft (hyper-v).							Concluído
Contratação do Vmware (licenciamento como serviço).							Em andamento
Implantação da solução							Não iniciado
Observações							
Ferramenta SANGFOR foi totalmente implantada e está em fase de testes pela SEPRO.							

PDI-24-R1-N-27 - Implantação do Windows 11 nos PCs/Notebooks da JE-GO

Descrição							
Migração do SO Windows 10 para o Windows 11 nas estações de trabalho e notebooks.							

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/abr/25	01/abr/25	19/dez/25		CINF	STI	40
Atividades							Situação
Realização de testes com Windows 11 no ambiente de TI da JE-GO.							Concluído
Homologação do Windows 11 nos PCs e notebooks.(TRE e Zonas)							Concluído
Instalação/migração do Windows 11 nos PCs da sede.							Em andamento
Instalação/migração do Windows 11 nos PCs das ZE.							Em andamento
Observações							
Foram atualizados até o momento 434 computadores com Windows 11.							

PDI-25-1-10-N - Proteção Avançada contra Ameaças Cibernéticas - NGFW

Descrição							
SEI: 24.0.000011477-0 Registro de preços para aquisição de Solução de Firewall/Gateway VPN com o objetivo de garantir a conectividade de rede entre as unidades remotas e a sede do TER-GO, melhorar o nível de segurança de acesso aos dados e os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	26/jul/24	26/jul/24	19/dez/25		CINF	STI	50
Atividades							Situação
Finalização do Termo de Referência							Concluído
Licitar							Não iniciado
Executar ARP							Não iniciado
Recebimento dos equipamentos							Não iniciado
Implantação da solução							Não iniciado
Aceite definitivo							Não iniciado
Observações							
TR finalizado, assinado e encaminhado para apreciação do CGTIC.							

PDI-25-1-11-N - Rastreabilidade e Auditoria de Dados na Nuvem - Varonis

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	20/ago/25	20/ago/25	31/out/25		CINF	STI	20
Atividades							Situação
Reunião de kick-off do projeto							Concluído
Prova de conceito							Em andamento
Implantação definitiva							Não iniciado
Testes e validação							Não iniciado
Observações							
Infraestrutura para começar a POC entregue.							

PDI-25-1-12-N - Escritório Virtual Seguro - RemoteApp

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/25	01/jul/25	31/out/25		CINF	STI	30
Atividades							Situação
Migração dos usuários que utilizavam RemoteApp							Concluído

Atividades	Situação
Exclusão dos usuários que fazem acesso direto via RDP.	Em andamento
Envio de e-mail informando sobre nova modalidade de acesso remoto (+seguro)	Não iniciado

PDI-25-1-14-N - Salvaguarda e Resiliência das Informações - Netbackup

Descrição							
25.0.000007924-6 - Netbackup							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	03/jun/25	03/jun/25	28/nov/25		CINF	STI	30
Atividades						Situação	
Reunião de kick-off do projeto.						Concluído	
Recebimento dos equipamentos e licenças.						Concluído	
Implantação da solução						Em andamento	
Criação das novas rotinas de backup						Não iniciado	
Validação da solução						Não iniciado	
Aceite definitivo						Não iniciado	
Observações							
Aguardando entrega dos Switches SAN (prorrogada para 31/10); Foi realizada o Hardware Check no equipamento e está em fase de implantação via rede LAN (ToR) para testes e Aceite Técnico.							

PDI-25-1-16-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Anhanguera

Descrição							
SEI nº 25.0.000012787-9							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	15/set/25	15/set/25	21/out/25		CSEL		10
Atividades						Situação	
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade						Concluído	
Geração da Base de Eleitores						Em andamento	
Entrega da Base de Candidatos						Em andamento	
Configuração da Eleição						Não iniciado	
Entrega do caderno de votação						Não iniciado	
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)						Não iniciado	
Geração de Mídias						Não iniciado	
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas						Não iniciado	
Suporte às Eleições no dia da eleição						Não iniciado	
Devolução das Urnas Eletrônicas						Não iniciado	
Análise da Viabilidade e envio para aprovação da Presidência						Concluído	

PDI-25-1-17-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Turvelândia

Descrição							
SEI n. 25.0.000012927-8							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	16/set/25	16/set/25	04/nov/25		CSEL		10
Atividades						Situação	
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade						Concluído	

Atividades	Situação
Geração da Base de Eleitores	Em andamento
Entrega da Base de Candidatos	Em andamento
Configuração da Eleição	Não iniciado
Entrega do caderno de votação	Não iniciado
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Não iniciado
Geração de Mídias	Não iniciado
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Suporte às Eleições no dia da eleição	Não iniciado
Devolução das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Análise da Viabilidade e envio para aprovação da Presidência	Concluído

PDI-25-1-18-N - Eleição de Gestores das Unidades Escolares - Iporá

Descrição
SEI nº 25.0.000013260-0

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	22/set/25	22/set/25	01/dez/25		CSEL		10

Atividades	Situação
Análise da Viabilidade e envio para aprovação da Presidência	Não iniciado
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade	Em andamento
Entrega da Base de Eleitores	Não iniciado
Entrega da Base de Candidatos	Não iniciado
Configuração da Eleição	Não iniciado
Entrega do caderno de votação	Não iniciado
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Não iniciado
Geração de Mídias	Não iniciado
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Suporte às Eleições no dia da eleição	Não iniciado
Devolução das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Recebimento do Processo e análise preliminar	Concluído

PDI-25-1-4 - Cadastro de Terceirizados

Descrição
SEI: 25.0.000002881-1 Construção de sistema para gerenciamento do cadastro de Terceirizados do Tribunal. Vide Termo de Abertura de Projeto em anexo.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	02/jun/25	02/jun/25	28/nov/25		CESCO	ASPLAN	40

Atividades	Situação
Implantação em produção	Não iniciado
Homologação do demandante	Não iniciado
Validar funcionalidades desenvolvidas com o demandante	Não iniciado
Desenvolvimento	Em andamento
Definir modelo de dados	Em andamento
Definir regras e funcionalidade	Em andamento
Levantamento de requisitos	Em andamento

Observações

Observações
Funcionalidades concluídas: Cadastro de colaborador; Cadastro de lotação; Gerenciamento de empresas.

PDI-25-1-5-N -Sistema de Registro de IAs (REGIA)

Descrição
Criação do "Formulário de Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial" SEI nº 25.0.000008198-4 O Gestor da Unidade utilizará o formulário para cadastrar e atualizar (caso dados já tenham sido informados) dados dos servidores da sua Unidade que utilizam alguma ferramenta de inteligência artificial.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	16/jun/25	17/jun/25	30/out/25		CESCO	STI	80

Atividades	Situação
Levantamento de requisitos	Concluído
Construção do protótipo e validação	Concluído
Modelagem de dados	Concluído
Desenvolvimento do sistema	Concluído
Teste e melhorias	Em andamento
Homologação	Não iniciado
Implantar em produção	Não iniciado

Observações
Houve um problema na autenticação e o sistema está sendo refatorado. O término previsto foi alterado para 30/10/2025.

PDI-25-1-9-N - Modernização dos Links Eleitorais -BRFibra e Claro

Descrição
25.0.000009882-8 - BRFibra 25.0.000010152-7 - Claro S/A

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	25/ago/25	25/ago/25	28/nov/25		CINF	STI	50

Atividades	Situação
Reunião de kick-off do projeto de implantação da BRFIBRA	Concluído
Implantação dos links	Em andamento
Testes de aceitação	Não iniciado
Implantação de solução Anti-DDoS	Não iniciado
Aceite Definitivo (Links)	Não iniciado
Recebimento dos equipamentos (Modem 5G)	Não iniciado
Verificação de conformidade dos modems	Não iniciado
Inclusão dos chips e roteadores no controle patrimonial	Não iniciado
Aceite Definitivo (Modems 5G)	Não iniciado

Observações
Foram implantados até o momento 50 % dos links BRFibra e Claro 100%

PDI-25-1-7-N - Sistema de Controle de Mídias das Urnas Eletrônicas

Descrição
Objetivo: Migrar o sistema de controle de mídias(movimentações, emissão de relatórios) para APEX. SEI: 24.0.000009577-6

Atividades	Situação
Definição do escopo e Levantamento de requisitos	Não iniciado
Construção do protótipo e validação	Não iniciado
Modelagem de dados	Não iniciado
Desenvolvimento do sistema	Não iniciado
Teste e melhorias	Não iniciado
Homologação	Não iniciado
Implantar em produção	Não iniciado

Descrição

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	06/mar/25	06/mar/25	30/jun/25	30/jun/25	CSEL	STI	100

Quantitativo de defeitos por modelo:

Atenção: registrado um quantitativo alto de defeitos relacionado à bateria das urnas.

Descrição

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/jul/25	01/jul/25	31/ago/25	20/ago/25	CSEL		100

Atividades	Situação
Realização do 1º Run In 2025	Concluído
Realização do 2º Run In 2025	Concluído
Realização do 3º Run In 2025	Em andamento
Realização do 1º Run In 2026	Não iniciado
Realização do 2º Run In 2026	Não iniciado

ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/jul/21	01/jul/21	30/jun/25	30/jul/25	AGSTI, CINF	CGSI	100

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Análise da minuta pelo CGSI, DG e SGP	Concluído
Aprovação e publicação do normativo	Concluído

PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	21/fev/25	24/fev/25	28/ago/25	28/ago/25	CSEL	DG	100

Atividades	Situação
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade - até 5 dias depois do pedido	Concluído
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Concluído
Elaboração da Minuta do Acordo de Colaboração	Concluído
Recebimento da base de Eleitores	Concluído
Recebimento da base de Candidatos	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Validação das Bases de candidatos, eleitores e seções	Concluído
Entrega das Listas de Eleitores	Concluído
Geração das Mídias	Concluído
Carga e Lacre das urnas eletrônicas	Concluído
Retirada das urnas eletrônicas	Concluído
Suporte no dia da Eleição - Nova data para a eleição	Cancelado
Devolução das urnas eletrônicas	Concluído
Novo Recebimento da base de Candidatos	Concluído
Nova Configuração da Eleição	Concluído
Nova Geração de Mídias	Concluído
Nova Carga e Lacre das urnas eletrônicas	Concluído
Nova Retirada das urnas eletrônicas	Concluído
Suporte no dia da Eleição	Concluído
Devolução das urnas eletrônicas	Concluído

Observações
A data da eleição foi adiada pela ASGMG por recursos no processo eleitoral para inclusão de novos candidatos.

PDI-24-R1-N-16 - Monitoramento de impressões

Descrição

Descrição
SEI: 24.0.000019107-4 SEI: 25.0.000011650-8 Objetivo do Sistema: Acompanhamento do número de impressões e consumo de suprimentos por impressora. Serviço a ser transformado digitalmente: Leitura do número de impressões por equipamento Proposta resumida: Desenvolvimento de sistema que possibilite o monitoramento do número de impressões realizadas por equipamento. Isso facilitaria o controle de impressões e consequentemente o consumo de papel.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	18/dez/24	18/dez/24	30/mai/25	23/set/25	CINF	ATEND	100

Atividades	Situação
Formalização da demanda	Concluído
Desenvolvimento	Concluído
Testes e conclusão	Concluído

Observações
Repassse de conhecimento realizado para a ATEND. Projeto concluído.

PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan

Descrição
SEI nº: 22.0.000007683-3 Wekan é um aplicativo de quadro Kanban de código aberto, similar ao Trello, que permite a organização e gerenciamento de tarefas usando cartões e colunas para representar diferentes etapas de um projeto ou fluxo de trabalho. Ele é projetado para facilitar o acompanhamento visual do progresso das tarefas e promover a colaboração em equipe.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	10/mar/25	10/mar/25	30/set/25	02/set/25	CESCO	INTEGRAZONAS	100

Atividades	Situação
Instalação e configuração	Concluído
Testes e homologação	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Concluído

Observações
A implantação do sistema WEKAN foi homologada pelo demandante (DOC SEI ID. 1191165), finalizando o processo de implantação.

PDI-24-R1-N-24 - Customização da solução GLPI para uso como ITSM

Descrição
Adequação da solução GLPI para uso como Sistema de Gestão de Serviços de TI (ITSM).

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	10/abr/25	10/abr/25	31/jul/25	07/jul/25	CINF	STI	100

Atividades	Situação
Instalação da solução GLPI.	Concluído
Definição e criação dos grupos de usuários e atendentes.	Concluído
Revisão e configuração do Catálogo de Serviços no GLPI.	Concluído
Configuração e testes das Interfaces do usuário e analista.	Concluído
Definição dos fluxos simplificado para os chamados (chamado, e-mail, WhatsApp).	Concluído

Observações

Observações
Entrou em produção o módulo de Gestão de Chamados do GLPI. Foram concluídas as atividades: SLAs Catálogo de Serviço de TI Definição de Perfis das equipes da TI. Em ajustes finais das configurações do GLPI. Finalizando a configuração das interfaces do usuário e analista. Serão incluídas outras unidades além da CINF e da SESCO.

PDI-25-1-1 - Eleição dos Dirigentes das Escolas Municipais de São Miguel do Passa Quatro

Descrição							
SEI nº 25.0.000005936-9							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	30/abr/25	30/abr/25	02/jun/25	02/jun/25	CSEL		100
Atividades							Situação
Levantamento das informações junto à entidade demandante							Concluído
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade							Concluído
Elaboração do Acordo de Colaboração							Concluído
Envio da Análise de Viabilidade e da Minuta do Acordo para parecer do Juiz da 31ª ZE							Concluído
Manifestação do Juiz da 31ª ZE							Concluído
Análise e Decisão da Presidência do TRE-GO							Concluído
Assinatura do Acordo de Colaboração (TRE e Entidade)							Concluído
Recebimento da Base de Eleitores							Concluído
Recebimento da Base de Candidatos							Concluído
Configuração da Eleição							Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)							Concluído
Entrega das Listas(Candidatos e Eleitores)							Concluído
Geração de Mídias							Concluído
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas							Concluído
Retirada das Urnas Eletrônicas							Concluído
Suporte às Eleições							Concluído
Devolução das Urnas Eletrônicas - até 2 dias após a eleição							Concluído

PDI-25-1-13-N - Modernização da Comunicação por Voz - VoIP

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/jul/25	01/jul/25	31/out/25	02/out/25	CINF	STI	100
Atividades							Situação
Verificação de capacidade para atender a demanda (levantamento de equipamentos necessários)							Concluído
Configuração dos equipamentos (Switches e Checkpoints)							Concluído
Disponibilização da infra para a CEIN para o Anexo I							Concluído
Disponibilização da infra para a CEIN para o Anexo II							Concluído
Disponibilização da infra para a CEIN para a Sede							Concluído

Observações
Todos os equipamentos (Sede, Anexo I e Anexo II) foram configurados e estão disponíveis para a CEIN.

PDI-25-1-15-N - Eleitores do Futuro - 14 Escolas Municipais de Goiânia

Descrição
Projeto Eleitor do Futuro SEI nº 25.0.000012737-2

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	11/set/25	11/set/25	30/set/25	30/set/25	CSEL	DG	100

Atividades	Situação
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Concluído
Entrega da Base de Candidatos	Concluído
Entrega da Base de Eleitores	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído
Entrega das Listas de Eleitores	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Concluído
Retirada das Urnas Eletrônicas	Concluído
Suporte às Eleições no dia da eleição	Concluído
Devolução das Urnas Eletrônicas	Concluído

PDI-25-1-19-N - Espaço do Servidor - Acesso Aposentados

Descrição
Projeto para disponibilização de acesso ao Espaço do Servidor por servidores aposentados e cedidos para órgãos externos

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	06/out/24	06/out/24	17/jun/25	17/jun/25	CESCO	SGP	100

Atividades	Situação
Configuração do Keycloak para autenticação mista (Keycloak/LDAP)	Concluído
Desenvolvimento de módulo de integração com Keycloak	Concluído
Desenvolvimento de módulo externo - (Altera Senha)	Concluído
Adaptação do Espaço do Servidor para uso do módulo de autenticação	Concluído
Implantação em produção	Concluído

Observações
Implantado: Espaço do Servidor com autenticação Keycloak, permitindo o acesso de servidores inativos ou que atuam fora do tribunal. Módulo Altera Senha para que os servidores externos possam alterar a senha.

PDI-25-1-6-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Crixás

Descrição
SEI nº 25.0.000009199-8

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/jul/25	01/jul/25	12/ago/25	12/ago/25	CSEL	PRES	100

PDI-25-1-8-N - Eleitores do Futuro - Centro de Ensino em Período Integral Professor César Augusto Ceva - CEPI - Ipameri

Descrição
Eleição - Projeto Eleitores do Futuro SEI Nº 25.0.000008732-0

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	11/ago/25	11/ago/25	08/set/25	08/set/25	CSEL		100

Atividades	Situação
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Concluído
Entrega da Base de Candidatos	Concluído
Entrega da Base de Eleitores	Concluído

Atividades	Situação
Configuração da Eleição	Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído
Entrega das Listas de Eleitores	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Concluído
Retirada das Urnas Eletrônicas	Concluído
Suporte às Eleições no dia da eleição	Concluído
Devolução das Urnas Eletrônicas	Concluído

PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/jul/24	01/jul/24	21/fev/25	21/fev/25	CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	100

Atividades	Situação
Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ Resolução 335/2020 na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados	Concluído
Elaboração do Termo de Referência	Concluído
Realização da licitação	Concluído
Execução da Ata de registro de preços	Concluído

Observações
O projeto teve o seu andamento retomado na reunião do dia 30/07/2025.

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

Descrição
Objetivo da demanda: Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados. Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta): A falta catalogação dos ativos de TI, tanto hardware quanto software, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataque cibernéticos de qualquer natureza. Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)? Gestão de TI e apoio à Governança Desenvolvimento e administração de soluções de TIC Gestão de infraestrutura de TIC Suporte técnico das soluções de TIC Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução): 1. Visibilidade de todo o parque de hardware do Tribunal. 2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional. 3. Visibilidade de todos os softwares em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades. Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada): Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados. Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026 Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico): Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante? Não Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda: Custo (Informe a estimativa de custo do projeto): Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em Software Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	07/jan/22	07/jan/22	15/jul/25	07/jul/25	CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	100

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído

Atividades	Situação
Aquisição da solução	Concluído
Implementação de protocolo seguro SNMP com https no OCS.	Concluído
Instalação e configuração da solução	Concluído
Implantação	Concluído
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	Concluído
Observações	
O projeto foi concluído com a finalização das atividades :	

PDI-24-R1-N-10 - Eleição dos Dirigentes para os Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores - PT

Descrição							
SEI Nº 24.0.000019889-3							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Cancelado	03/fev/25	03/fev/25	08/jul/25	26/mai/25	CSEL	DG	30
Atividades							Situação
Levantamento das informações junto à entidade demandante							Concluído
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade							Concluído
Elaboração do Acordo de Colaboração							Concluído
Análise e Autorização da Presidência do TRE-GO							Cancelado
Entrega da Base de Candidatos							Não iniciado
Entrega da Base de Eleitores							Não iniciado
Configuração da Eleição							Não iniciado
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)							Não iniciado
Entrega das Listas de Eleitores							Não iniciado
Geração de Mídias							Não iniciado
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas							Não iniciado
Retirada das Urnas Eletrônicas							Não iniciado
Suporte às Eleições							Não iniciado
Devolução das Urnas Eletrônicas - até 2 dias após a eleição							Não iniciado
Observações							
As informações foram encaminhadas pelo partido. Aguardando decisão da Presidência do TRE-GO, sobre o atendimento da solicitação de empréstimo das Urnas Eletrônicas.							

PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores

Descrição

Descrição

SEI: 22.0.000008626-0

Objetivo da demanda:
Desenvolver formulário pré preenchido de cadastramento de servidores, visando agilizar e otimizar o processo de revisão do cadastro de servidores.

Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):
Facilitar o processo de solicitação de alteração de dados cadastrais pelos servidores, com a permissão de alteração de dados livres e possibilidade de solicitação de alteração de dados que exigem comprovação, com a anexação de documentos.

Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?
Macroprocesso de apoio: Gestão de Pessoas / Processo: Gestão do quadro de pessoal

Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):
Facilidade e celeridade da execução do processo de cadastramento de servidores, tanto para o servidor quanto para a unidade responsável.

Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):
8 - Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas.

Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):
Disponibilização de formulário eletrônico pré-preenchido com os dados dos servidores, com opção de solicitação de alteração, anexação de documentos e possibilidade de deferimento pela unidade responsável, com gravação automática no SGRH.

Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?
Não

Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:
Não se aplica

Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):
Não se aplica

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Suspensão	27/fev/23	27/fev/23	30/mai/25		CESCO	SGP	10

Atividades	Situação
Planejamento	Adiado
Criação e configuração do ambiente de testes	Não iniciado
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações

A SGP informou no SEI: 24.0.000019107-4 despacho ID. nº 0972047, não possuir no momento, condições de reapresentar o sistema para priorização do CGTIC, o que foi confirmado pela AGSGP e Secretária de Gestão de Pessoas (ID. 0972047). Desta forma, este projeto ficará suspenso até que seja reapresentado pela unidade demandante, com os detalhes necessários ao seu desenvolvimento (vide último parágrafo do despacho do Secretário de TI, ID. nº 1088674).

PDI-25-1-2 - Plenário Virtual

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Suspensão	03/jun/24	03/jun/24	31/jul/24		ASPJE	SJD	10

Atividades	Situação
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações

O projeto foi suspenso em reunião do CTGTI ocorrida no dia 21/03/2025.

PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em fila					CESCO	EJE	

Observações

Verificar se outros Regionais possuem sistema informatizado que atendem a demanda.

PDI-24-R1-N-17 - Sistema de disponibilização de Acórdãos na internet (Ementário)

Descrição

Descrição
SEI: 24.0.000019107-4 Objetivo do Sistema: Otimizar a disponibilização ao público externo, diretamente na internet, do inteiro teor dos acórdãos para pesquisa. Serviço a ser transformado digitalmente: Disponibilização, na internet, dos acórdãos lançados na intranet para que alcance o público externo. Proposta resumida: A proposta visa à disponibilização, na internet, dos acórdãos publicados na intranet para que alcance o público externo que busca por pesquisa.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em fila	10/mar/25	10/mar/25			CESCO	SGI	10

Atividades	Situação
Formalização da demanda	Não iniciado
Desenvolvimento	Não iniciado
Testes e conclusão	Não iniciado

Observações
Em reunião do CTGTI ocorrida no dia 02/04/2024, o status do projeto foi alterado para “A priorizar” devido a mudança de escopo do projeto.

PDI-25-1-3 - Agenda Institucional

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em fila					CESCO	APRISQ	

Observações
Priorizado pelo CGTIC na reunião do dia 2025-05-13

PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE

Descrição
SEI: 24.0.000003403-3 Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online dos servidores ao seu próprio dossiê funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/21	07/jan/21	29/mar/24		CESCO	SGP	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
Aguardando homologação do sistema pela SGP.

PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto

Descrição
SEI nº: 24.0.000007445-0 O e-Voto é uma ferramenta da Justiça Eleitoral de Santa Catarina para votações eletrônicas da comunidade. Esta ferramenta permite realizar eleições, plebiscitos e referendos de forma tele presencial, minimizando os custos de logística de urnas e facilitando o acesso dos eleitores, que podem votar de qualquer computador ou dispositivo móvel. Adoção de um sistema de votação online E-voto desenvolvido pelo TRE-SC.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
----------	-----------------	-------------	------------------	--------------	---------------------	--------------------	-----------

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	05/mai/24	05/mai/24	31/mar/25		CESCO	EJE	90
Atividades						Situação	
Planejamento						Concluído	
Criação e configuração do ambiente de testes						Concluído	
Realização de testes pela unidade demandante						Concluído	
Homologação do produto						Concluído	
Disponibilização em ambiente de produção						Em andamento	
Observações							
Realização de testes finais no ambiente de produção.							

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)

Descrição							
Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal. Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	29/abr/22	29/abr/22	26/abr/24		CESCO	SAO	90
Atividades							Situação
Planejamento							Concluído
Análise de requisitos							Concluído
Desenvolvimento funcionalidades							Concluído
Testes de funcionalidades							Concluído
Homologação do PCA para PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas)							Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção							Não iniciado
Observações							
SEI 25.0.000008359-6 encaminhado para ADAAC solicitando as seguintes atividades: Aplicar filtros nas tabelas de materiais e serviços, e posterior vinculação destas informações com as demandas; Enviar o PCA para PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas) para avaliação, utilizando funcionalidade própria do sistema.							

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Descrição							
http://wp.tre-go.jus.br/							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	30/jun/23	30/jun/23	31/mar/25		CESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS	90
Atividades							Situação
Planejamento							Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes							Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica							Concluído
Realização de testes pela equipe de desenvolvimento							Em andamento
Homologação do produto							Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção							Não iniciado
Observações							
O andamento do projeto foi retomado. Em fase de implementação, refinando a pesquisa de documentos com utilização de IA. Foi disponibilizado pela CINF uma máquina virtual para implementação dessa funcionalidade. É necessária a definição de um grupo de trabalho multidisciplinar com representantes das áreas de negócio para gerir o projeto.							

PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI

Descrição							
SEI: 23.0.000016671-5							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	16/fev/24	16/fev/24	30/set/25		CESCO	DG	90
Atividades						Situação	
Criação e configuração do ambiente de testes						Concluído	
Levantamento de requisitos						Concluído	
Planejamento						Concluído	
Disponibilização em ambiente de produção						Não iniciado	
Homologação do produto						Não iniciado	
Realização de testes pela equipe técnica						Em andamento	
Observações							
O projeto foi retomado com o módulo desenvolvido pelo TSE com prazo final previsto alterado para 30/09/2025; O módulo de peticionamento foi disponibilizado para homologação pela unidade demandante.							

PDI-24-R1-N-20 - Controle de Capacitação da EJE

Descrição							
SEI: 24.0.000019107-4 Objetivo do Sistema: Promover o registro e o controle dos inscritos em todas capacitações da EJE. Serviço a ser transformado digitalmente: Serviço de admissão e registro de inscrições Serviço de controle da frequência dos inscritos Serviço de emissão de certificados com controle de autenticidade. Proposta resumida: Desenvolvimento de aplicativo/software que registre e controle todas as etapas do processo de capacitação da EJE.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	31/dez/24	07/abr/25	30/set/25		CESCO	EJE	90
Atividades						Situação	
Formalização da demanda						Concluído	
Desenvolvimento						Em andamento	
Testes e conclusão						Não iniciado	
Teste de emissão de certificados pelo moodle						Em andamento	
Observações							
Foi realizado o teste de emissão de certificado com o moodle; O SEI com o termo de homologação será enviado para a unidade demandante.							

PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede sem fio

Descrição							
SEI nº 23.0.000003147-0 Aquisição de solução de rede sem fio (Wi-fi). com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral. Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Adiado	28/fev/23	28/fev/23	19/dez/24		CINF	STI	60
Atividades						Situação	
Elaboração do ETP.						Concluído	
Elaboração do DOD.						Concluído	
Implementação da solução.						Não iniciado	
Execução da ARP.						Não iniciado	

Atividades	Situação
Processo de licitação.	Não iniciado
Adequação das especificações e coleta de preços estimativos.	Em andamento
Elaboração do TR.	Em andamento

PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Sobrestado	19/ago/24	19/ago/24	19/dez/25		CESCO	STI	70
Atividades							Situação
Planejamento							Concluído
Criação e configuração de ambiente de teste interno							Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes em nuvem							Suspensão
Realização de testes pela unidade demandante							Em andamento
Homologação do produto							Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção							Não iniciado
Observações							
O projeto foi sobrestado em razão do envolvimento das equipes com outros projetos prioritários.							

PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Sobrestado	03/fev/25	03/fev/25	29/ago/25		CESCO, CINF	STI	50
Atividades							Situação
Realização de testes com o keycloak							Em andamento
Inserção de sistemas no Portal							Em andamento
Implantação de RDP via remotesapp							Concluído
Implementação do ODIN via F5							Não iniciado



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO CÉSAR RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 10/10/2025, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRAYTON MARQUES SANTANA, COORDENADOR(A)**, em 10/10/2025, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 10/10/2025, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 10/10/2025, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 10/10/2025, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1228927** e o código CRC **6DD165E9**.

