



ATA

Reunião do Comitê Técnico Gestor de TI (CTGTI) 21/2025

1. Identificação

Data: 03/12/2025	Início: 14:15 - Término 15:55	Local: Sala de re
-------------------------	---	--------------------------

Finalidade: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 - Gestão 24/26

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

4. Pauta

- Questionamentos acerca dos projetos:
- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na quinzena?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados, suspensos, sobrestados e em homologação;

5. Participantes


Nome	Cargo	E-mail
Brayton Marques Santana	Coordenador de Sistemas Corporativos	brayton.santana@tre-go.jus.br
Frank Wendell Ribeiro	Secretário de Tecnologia da Informação	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	Assessor de Planejamento, Governança e Gestão	paulo.taira@tre-go.jus.br
Rafael Dídimio Santos	Coordenador de Sistemas Eleitorais - Substituto	rafael.didimo@tre-go.jus.br
Roberto César Rodrigues	Coordenador de Infraestrutura	roberto.rodrigues@tre-go.jus.br

6. Encaminhamentos


Os registros de informações detalhadas dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas (vide item 8 - Detalhamento dos Projetos);

- Projetos concluídos:
 - PDI-25-1-18-N - Eleição de Gestores das Unidades Escolares - Iporá;
 - PDI-25-1-22-N - Eleição - Escolas Municipais - Colinas do Sul.
- Em razão do período de recesso, bem como de férias dos integrantes do CTGTI, esta foi a última reunião do ano de 2025. Sendo assim, o próximo ciclo de reuniões iniciará no dia 02/02/2026.

7. Gráficos do Portfólio de Projetos

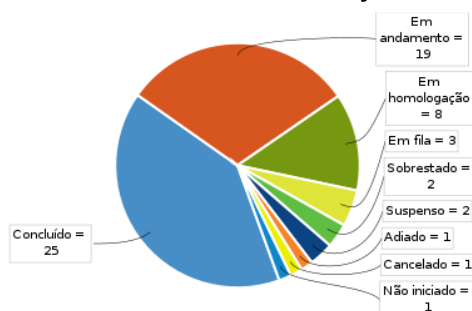

Total: 62 . Gráfico por: Status

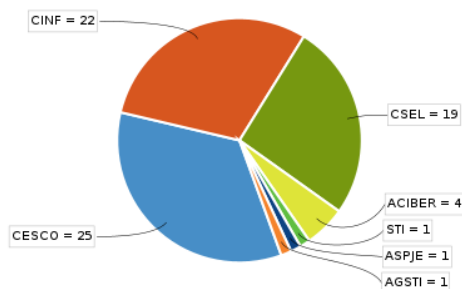

Total: 62 . Gráfico por: Unidade responsável

7.1. Relação dos projetos em acompanhamento pelo CTGTI (internos + priorizados pelo CGTIC)

Atividades	Situação	Execução%	Unidade responsável	Equipe	Unidade demandante	Término real
ELE26-25-R1-03 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 3	Em andamento	70	CSEL	SEVIN	DG	
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Em andamento	50	ACIBER, CESCO, CINF	ACIBER, CESCO, CINF, CSEL	CGSI	
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Em andamento	90	ACIBER, CESCO, CINF	ACIBER, SEDIS, SESCO, SEPRO, SESRE	CGSI	
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Em andamento	40	ACIBER, CINF	ACIBER, CESCO, CINF, CSEL	CGSI	
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Em andamento	80	ACIBER, CESCO, CINF	ACIBER, SEDIS, SEAD, SEPRO, SESRE	CGSI	
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória (SICOPE)	Em andamento	30	CESCO	SEDIS	VPCRE	
PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição	Em andamento	50	CESCO	SEDIS	PRES, SGP	
PDI-24-R1-N-15 - Sistema de Gestão de Alimentação de Mesários	Em andamento	10	CESCO	SEDIS	SAO	
PDI-24-R1-N-25 - Implantação de equipamentos e softwares nos Datacenters da JE-GO	Em andamento	90	CINF	SEPRO	STI	
PDI-24-R1-N-26 - Implantação de solução de virtualização	Em andamento	50	CINF	SEPRO	STI	
PDI-24-R1-N-27 - Implantação do Windows 11 nos PCs/Notebooks da JE-GO	Em andamento	40	CINF	SEMIC	STI	
PDI-25-1-10-N - Proteção Avançada contra Ameaças Cibernéticas - NGFW	Em andamento	50	CINF	SESRE	STI	
PDI-25-1-12-N - Escritório Virtual Seguro - RemoteApp	Em andamento	80	CINF	SESRE	STI	
PDI-25-1-20-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Damianópolis	Em andamento	10	CSEL	CSEL, SEVIN, SECAD	DG	
PDI-25-1-23-N - Eleição do Subprefeito do Distrito Vila Borba - Colinas do Sul	Em andamento	10	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD	DG	
PDI-25-1-24-N - Migração do sistema Canelew para Consultas Web	Em andamento	30	CSEL	CSEL	STI	
PDI-25-1-25-N - Migração do sistema Elecons para Java	Em andamento	30	CSEL	CSEL	STI	
PDI-25-1-26-N - Biometria móvel	Em andamento	70	CINF		STI	

Atividades	Situação	Execução%	Unidade responsável	Equipe	Unidade demandante	Término real
PDI-25-1-4 - Cadastro de Terceirizados	Em andamento	40	CESCO	SEDIS	ASPLAN	
PDI-25-1-7-N - Sistema de Controle de Mídias das Urnas Eletrônicas	Não iniciado		CESCO	SEAID	CSEL	
ELE26-25-R1-01 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 1	Concluído	100	CSEL	SEVIN	DG	30/jun/25
ELE26-25-R1-02 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 2	Concluído	100	CSEL	SEVIN	DG	20/ago/25
ELE26-25-R1-04 - 16º Simulado Nacional de Hardware 2026 (16SNH2026)	Concluído	100	CSEL	SEVIN, SECAD	DG	
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Concluído	100	AGSTI, CINF	ACIBER	CGSI	30/jul/25
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Concluído	100	CINF, STI	ACIBER, CESCO, CINF, STI	CGSI	05/nov/25
PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	28/ago/25
PDI-24-R1-N-16 - Monitoramento de impressões	Concluído	100	CINF	CINF	ATEND	23/set/25
PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan	Concluído	100	CESCO	SESCO	INTEGRAZONAS	02/set/25
PDI-24-R1-N-24 - Customização da solução GLPI para uso como ITSM	Concluído	100	CINF	SEGEC	STI	07/jul/25
PDI-25-1-1 - Eleição dos Dirigentes das Escolas Municipais de São Miguel do Passa Quatro	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	02/jun/25
PDI-25-1-11-N - Rastreabilidade e Auditoria de Dados na Nuvem - Varonis	Concluído	100	CINF	SEPRO, SESRE	STI	19/nov/25
PDI-25-1-13-N - Configuração dos Ativos de TI para utilização de VOIP	Concluído	100	CINF	SESRE	STI	02/out/25
PDI-25-1-14-N - Salvaguarda e Resiliência das Informações - Netbackup	Concluído	100	CINF	SEPRO	STI	19/nov/25
PDI-25-1-15-N - Eleitores do Futuro - 14 Escolas Municipais de Goiânia	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	30/set/25
PDI-25-1-16-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Anhanguera	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	
PDI-25-1-17-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Turvelândia	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	03/nov/25
PDI-25-1-18-N - Eleição de Gestores das Unidades Escolares - Iporá	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD	DG	
PDI-25-1-19-N - Espaço do Servidor - Acesso Aposentados	Concluído	100	CESCO	SEDIS	SGP	17/jun/25
PDI-25-1-21-N - Projeto Eleitores do Futuro - Escola Shalom	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD	DG	31/out/25
PDI-25-1-22-N - Eleição - Escolas Municipais - Colinas do Sul	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD	DG	
PDI-25-1-6-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Crixás	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD	PRES	12/ago/25
PDI-25-1-8-N - Eleitores do Futuro - Centro de Ensino em Período Integral Professor César Augusto Ceva - CEPI - Ipameri	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD	DG	08/set/25
PDI-25-1-9-N - Modernização dos Links Eleitorais - BRFibra e Claro	Concluído	100	CINF	SESRE	STI	19/nov/25
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Concluído	100	CESCO, CINF		ÓRGÃOS EXTERNOS	21/fev/25
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Concluído	100	CINF	CESCO, CINF, CSEL	ÓRGÃOS EXTERNOS	07/jul/25
PDI-24-R1-N-10 - Eleição dos Dirigentes para os Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores - PT	Cancelado	50	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	

Atividades	Situação	Execução%	Unidade responsável	Equipe	Unidade demandante	Término real
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Suspenso	10	CESCO	SEDIS	SGP	
PDI-25-1-2 - Plenário Virtual	Suspenso	10	ASPJE	ASPJE	SJD	
PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos	Em fila		CESCO	SEDIS	EJE	
PDI-24-R1-N-17 - Sistema de disponibilização de Acórdãos na internet (Ementário)	Em fila	10	CESCO	SESCO	SGI	
PDI-25-1-3 - Agenda Institucional	Em fila		CESCO	SESCO	APRISQ	
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO	SEDIS	SGP	
PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votantet/E-voto	Em homologação	90	CESCO	SEDIS	EJE	
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAAC (SISPLANO)	Em homologação	90	CESCO	SEDIS, SEAID	SAO	
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em homologação	90	CESCO	SESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS	
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI	Em homologação	90	CESCO	SESCO	DG	
PDI-24-R1-N-20 - Controle de Capacitação da EJE	Em homologação	90	CESCO	SESCO	EJE	
PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho	Em homologação	90	CESCO	SEDIS, SEAID	SGP	
PDI-25-1-5-N - Sistema de Registro de IAs (REGIA)	Em homologação	90	CESCO	SEDIS	STI	
PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede sem fio	Adiado	60	CINF		STI	
PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes	Sobrestado	70	CESCO	SEDIS	STI	
PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)	Sobrestado	50	CESCO, CINF	SEPRO, SESRE	STI	

7.2. Projetos/macro atividades em andamento com término previsto de até 60 dias

Atividades	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante	Término previsto
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Em andamento	50	ACIBER, CESCO, CINF	CGSI	31/out/25
PDI-25-1-23-N - Eleição do Subprefeito do Distrito Vila Borba - Colinas do Sul	Em andamento	10	CSEL	DG	09/dez/25
PDI-25-1-20-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Damianópolis	Em andamento	10	CSEL	DG	09/dez/25
PDI-25-1-24-N - Migração do sistema Canelew para Consultas Web	Em andamento	30	CSEL	STI	19/dez/25
ELE26-25-R1-03 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 3	Em andamento	70	CSEL	DG	19/dez/25
PDI-25-1-12-N - Escritório Virtual Seguro - RemoteApp	Em andamento	80	CINF	STI	19/dez/25
PDI-24-R1-N-25 - Implantação de equipamentos e softwares nos Datacenters da JE-GO	Em andamento	90	CINF	STI	19/dez/25
PDI-25-1-4 - Cadastro de Terceirizados	Em andamento	40	CESCO	ASPLAN	19/dez/25
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Em andamento	80	ACIBER, CESCO, CINF	CGSI	19/dez/25
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Em andamento	40	ACIBER, CINF	CGSI	19/dez/25
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Em andamento	90	ACIBER, CESCO, CINF	CGSI	19/dez/25
PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição	Em andamento	50	CESCO	PRES, SGP	19/dez/25
PDI-25-1-25-N - Migração do sistema Elecons para Java	Em andamento	30	CSEL	STI	30/jan/26

8. Detalhamento dos projetos

ELE26-25-R1-03 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 3

Descrição							
Link para o painel de acompanhamento: https://app.powerbi.com/view? r=eyJrIjoibDkzMjM2NmYtZDRlYS00MDA5LWFmNGYtMmIwZjE0NjUwY2FhIiwidCI6IjI2ZjA4NzlyLTJfOWUtNGVhZS1iIn2VklThhMmI3N2ZmM2Q5Y							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/set/25	01/set/25	19/dez/25		CSEL		90

ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes

Descrição							
SEI: 25.0.000009298-6 Visa estabelecer e manter a configuração segura de ativos corporativos (dispositivos de usuário final, incluindo portáteis e móveis; dispositivos de rede; dispositivos não computacionais/ IoT; e servidores) e software (sistemas operacionais e aplicações) no ambiente da rede corporativa da justiça eleitoral de acordo de acordo com a seguinte classificação: I. ATIVOS DE INFRAESTRUTURA REDE, quais sejam os dispositivos de rede; II. ATIVOS DE APLICAÇÕES, quais sejam os sistemas operacionais e aplicações; III. ATIVOS DE USUÁRIOS, quais sejam os usuários finais; IV. ATIVOS DE DISPOSITIVOS, quais sejam os dispositivos de usuário final, incluindo portáteis, dispositivos não computacionais/ IoT e móveis e servidores.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	31/out/25		ACIBER, CESCO, CINF	CGSI	50

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração de minuta de normativo pela ACIBER e encaminhamento aos Coordenadores da STI para análise	Concluído
Consolidação pela ACIBER, das propostas de alterações realizadas pelos Coordenadores da STI	Não iniciado
Encaminhamento da minuta do normativo pelo Secretário de TI ao Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI)	Não iniciado
Análise da minuta pelo CGSI e DG	Não iniciado
Aprovação e publicação do normativo	Não iniciado

Observações
O processo está na ACIBER para consolidação das sugestões das Coordenadoria da STI com previsão de envio à STI no final do mês de agosto.

ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades

Descrição							
SEI nº 25.0.000009284-6 A gestão de vulnerabilidades tem como objetivo prevenir a exploração de vulnerabilidades técnicas na rede corporativa, por meio da aplicação sistemática das seguintes ações de prevenção, identificação, classificação e tratamento: I - adoção de ações técnicas preventivas conforme norma de Configuração Segura de Ativos de TI vigente; I - obtenção de informações para identificar vulnerabilidades técnicas em tempo hábil; II - avaliação de exposição às vulnerabilidades técnicas; III - adoção de medidas apropriadas e tempestivas para lidar com os riscos identificados.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/25		ACIBER, CESCO, CINF	CGSI	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração de minuta de normativo pela ACIBER e encaminhamento aos Coordenadores da STI para análise.	Concluído
Consolidação pela ACIBER, das propostas de alterações realizadas pelos Coordenadores da STI	Concluído
Encaminhamento da minuta do normativo pelo Secretário de TI ao Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI)	Concluído
Análise da minuta pelo CGSI e DG	Não iniciado
Aprovação e publicação do normativo	Não iniciado

Observações
Minuta do normativo encaminhada para o CGSI.

ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)

Descrição

Descrição							
SEI nº 25.0.000001021-1 Dispõe sobre as regras e os procedimentos para a realização da gestão e monitoramento de registro de atividades (logs) no ambiente computacional do TRE-GO.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/25		ACIBER, CINF	CGSI	40
Atividades							Situação
Planejamento							Concluído
Revisão pela ACIBER, da minuta de normativo elaborado pela CINF e encaminhamento aos Coordenadores da STI para análise							Em andamento
Consolidação pela ACIBER, das propostas de alterações realizadas pelos Coordenadores da STI							Não iniciado
Encaminhamento da minuta do normativo pelo Secretário de TI ao Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI)							Não iniciado
Análise da minuta pelo CGSI e DG							Não iniciado
Aprovação e publicação do normativo							Não iniciado
Observações							
Foi realizada reunião entre as equipes da CINF e ACIBER e o SEI foi encaminhado para análise da CINF. Desta forma o término previsto foi alterado para o dia 19/12/2025.							

ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos

Descrição							
SEI nº: 25.0.000011375-4 O uso de recursos criptográficos visa proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos pelas redes de computadores, assim como dos dados em repouso, armazenados em servidores, microcomputadores, dispositivos móveis e bancos de dados.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/25		ACIBER, CESCO, CINF	CGSI	80
Atividades							Situação
Planejamento							Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo							Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.							Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Linux.							Concluído
Implantação de criptografia em conexões VPN.							Concluído
Implantação de criptografia do Portal de acesso externo - escritório remoto.							Concluído
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS							Concluído
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS							Concluído
Implantação de criptografia em notebooks standalone							Concluído
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.							Concluído
Implantação da criptografia de dados armazenados nos novos storages IBM.							Concluído
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores							Em andamento
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores de aplicação e de Bancos de dados.							Sobrestado
Implantação de criptografia em sistemas da infraestrutura (proxy, monitoramento e outros).							Sobrestado
Revisão da minuta do documento normativo pela ACIBER e encaminhamento aos Coordenadores da STI para análise							Concluído
Consolidação pela ACIBER, das propostas de alterações realizadas pelos Coordenadores da STI							Não iniciado
Encaminhamento da minuta do normativo pelo Secretário de TI ao Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI)							Não iniciado
Análise da minuta pelo CGSI e DG							Não iniciado
Aprovação e publicação do normativo							Não iniciado
Observações							
Aguardando análise das Coordenadorias.							

PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória

Descrição

Descrição							
SEI 23.0.000002275-6 Finalidade: desenvolvimento de uma solução informatizada para o controle de informações judiciais relacionadas a medidas que envolvem gestão e destinação de valores oriundos de fianças e penas pecuniárias. Ao final, haverá a conversão do controle dos registros manuais em livros de guarda obrigatória pelos cartórios eleitorais para meio eletrônico.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	30/ago/23	02/abr/25	31/mar/26		CESCO	VPCRE	30
Atividades						Situação	
Levantamento de requisitos						Concluído	
Desenvolvimento do cadastro de penalidades						Em andamento	
Realizar pré-apresentação do cadastro de penalidades						Não iniciado	
Observações							
O término previsto foi alterado para 31/03/2026 devido a alterações no escopo do projeto pela SJD, bem como, por estar aguardando validação da VPCRE das funcionalidades já implementadas.							

PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição

Descrição							
SEI: 25.0.000002881-1 Construção de sistema para gerenciamento do cadastro de Terceirizados do Tribunal. Vide Termo de Abertura de Projeto em anexo.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	05/ago/25	05/ago/25	19/dez/25		CESCO	PRES, SGP	50
Observações							
O processo retornou para a SEDIS e está em fase de revisão.							

PDI-24-R1-N-15 - Sistema de Gestão de Alimentação de Mesários

Descrição							
SEI: 24.0.000019107-4 Objetivo do Sistema: Confecção, por meio de sistema informatizado, de lista de pagamento do benefício alimentação de mesários e colaboradores de cada uma das zonas eleitorais, para a sua melhor gestão. Serviço a ser transformado digitalmente: Serviço de criação de lista de pagamento para alimentação de mesários e colaboradores a serem pagos por pix e em dinheiro. Proposta resumida: A forma de distribuição de alimentação de mesários vem ao longo dos anos modificando. Desde 2022, surgiu a possibilidade de pagamento por pix. Esse serviço vem sendo realizado centralizadamente na AGSAO por meio de planilhas e de forma manual e interação com as zonas eleitorais, para excluir nomes, incluir nomes, pagar algumas pessoas por pix, outras por dinheiro. Considerando que essa atividade gera diversos riscos financeiros, inclusive para a imagem do Tribunal, faz-se necessário a criação de sistema que possibilite esse gerenciamento pela própria zona eleitoral, permitindo que ela trate os dados de sua zona eleitoral e, ao final, gere lista de pagamento, podendo ser pago por unidade Centralizada deste Tribunal							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	17/mar/25	17/mar/25	31/mar/26		CESCO	SAO	10
Atividades					Situação		
Formalização da demanda					Concluído		
Levantamento de requisitos					Em andamento		
Desenvolvimento					Em andamento		
Testes					Não iniciado		
Homologação					Não iniciado		
Implantação em Produção					Não iniciado		
Observações							
A conclusão da análise dos documentos apresentados pela unidade demandante está prevista para 19/12; término previsto foi alterado para 31/03/2026 devido aos seguintes motivos: Em razão da mudança da equipe da unidade demandante; Substituição da equipe de terceirizados; Priorização do desenvolvimento do sistema REGIA.							

PDI-24-R1-N-25 - Implantação de equipamentos e softwares nos Datacenters da JE-GO

Descrição							
Instalação de equipamentos e softwares nos Datacenters deste Regional.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	03/fev/25	03/fev/25	19/dez/25		CINF	STI	90
Atividades							Situação
Instalação dos storages IBM.							Concluído
Instalação de 5 servidores Lenovo.							Concluído
Instalação elétrica para os novos racks.							Concluído
Aquisição e entrega do restante dos equipamentos necessários para o funcionamento dos Datacenters.							Concluído
Migração dos dados do VNX 5400 para o novo storage IBM.							Concluído
Disponibilização da nova infraestrutura para produção							Em andamento
Observações							
Foram entregues dois switches no dia 18/11. Os últimos dois equipamentos estão previstos para serem entregues até o dia 25/11. Agendada instalação e transferência de conhecimento para entre os dias 25 e 27/11.							

PDI-24-R1-N-26 - Implantação de solução de virtualização

Descrição							
Estudo de soluções de virtualização existentes no mercado.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	31/jan/25	31/jan/25	31/mar/26		CINF	STI	50
Atividades							Situação
Testes com a solução Suse.							Cancelado
Testes com a solução Microsoft (hyper-v).							Concluído
Contratação do Vmware (licenciamento como serviço).							Em andamento
Implantação da solução							Não iniciado
Observações							
Estamos analisando o IRP do TRE-RO. O término previsto foi alterado para 31/03/2026, em razão da tramitação do processo de contratação.							

PDI-24-R1-N-27 - Implantação do Windows 11 nos PCs/Notebooks da JE-GO

Descrição							
Migração do SO Windows 10 para o Windows 11 nas estações de trabalho e notebooks.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/abr/25	01/abr/25	31/mar/26		CINF	STI	40
Atividades							Situação
Realização de testes com Windows 11 no ambiente de TI da JE-GO.							Concluído
Homologação do Windows 11 nos PCs e notebooks.(TRE e Zonas)							Concluído
Instalação/migração do Windows 11 nos PCs da sede.							Em andamento
Instalação/migração do Windows 11 nos PCs das ZE.							Em andamento
Observações							
557 computadores atualizados para Windows 11 do total de 1450. Alerta sobre a garantia dos equipamentos levantados na planilha de planejamento. 49.30% O término foi alterado para 31/03/2026 em razão dos seguintes motivos: Necessidade de realização da formatação para remoção do SIS, ao invés da atualização, tornando o procedimento mais lento; Percentual de atualização estar em 38,4%; Alocação das equipes na realização de itinerantes; Mudança de local das instalações das unidades: SGP, SAO e EJE.							

PDI-25-1-10-N - Proteção Avançada contra Ameaças Cibernéticas - NGFW

Descrição
SEI: 24.0.000011477-0 Registro de preços para aquisição de Solução de Firewall/Gateway VPN com o objetivo de garantir a conectividade de rede entre as unidades remotas e a sede do TRE-GO, melhorar o nível de segurança de acesso aos dados e os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	26/jul/24	26/jul/24	31/mar/26		CINF	STI	50

Atividades	Situação
Finalização do Termo de Referencia	Concluído
Licitar	Em andamento
Executar ARP	Não iniciado
Recebimento dos equipamentos	Não iniciado
Implantação da solução	Não iniciado
Aceite definitivo	Não iniciado

Observações
Edital publicado, licitação com a data provável para 11/12/2025 às 14:00 horas . O término previsto foi alterado para 31/03/2026, em razão do andamento do processo de aquisição.

PDI-25-1-12-N - Escritório Virtual Seguro - RemoteApp

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/25	01/jul/25	19/dez/25		CINF	STI	80

Atividades	Situação
Migração dos usuários que utilizavam RemoteApp	Concluído
Exclusão dos usuários que fazem acesso direto via RDP.	Em andamento
Envio de e-mail informando sobre nova modalidade de acesso remoto (+seguro)	Não iniciado

Observações
Foi definido que o acesso via RDP será retirado de todos os usuários e disponibilizado apenas em casos excepcionais para usuários da STI. Foram identificadas algumas definições a serem implementadas que serão objeto de análise em reunião a ser realizada entre a CINF e a SESRE. O término previsto foi alterado para 19/12 em razão de algumas definições que ainda precisam ser estabelecidas.

PDI-25-1-20-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Damianópolis

Descrição
SEI n. 25.0.000015070-6

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	03/nov/25	04/nov/25	09/dez/25		CSEL		70

Atividades	Situação
Devolução das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Suporte às Eleições no dia da eleição	Não iniciado
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Geração de Mídias	Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído
Entrega do caderno de votação	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Entrega da Base de Candidatos	Concluído
Geração da Base de Eleitores	Concluído
Análise da Viabilidade e envio para aprovação da Presidência	Concluído
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade	Concluído

PDI-25-1-23-N - Eleição do Subprefeito do Distrito Vila Borba - Colinas do Sul

Descrição
SEI nº 25.0.000015543-0

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	05/nov/25	05/nov/25	09/dez/25		CSEL		70

Atividades	Situação
Devolução das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Suporte às Eleições no dia da eleição	Não iniciado
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Entrega do caderno de votação	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Entrega da Base de Eleitores	Concluído
Entrega da Base de Candidatos	Concluído
Análise da Viabilidade e envio para aprovação da Presidência	Concluído
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade	Concluído

PDI-25-1-24-N - Migração do sistema Canelew para Consultas Web

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	10/nov/25	10/nov/25	19/dez/25		CSEL		60

Atividades	Situação
Preparação do ambiente	Concluído
Migração da base de dados do Microsoft Access para o PostgreSQL	Concluído
Saneamento da base de dados	Em andamento
Desenvolvimento das páginas de consulta web	Em andamento

PDI-25-1-25-N - Migração do sistema Elecons para Java

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/out/25	06/out/25	30/jan/26		CSEL		30

Atividades	Situação
Levantamento dos requisitos	Concluído
Desenvolvimento do backend	Em andamento
Desenvolvimento do frontend	Não iniciado

PDI-25-1-26-N - Biometria móvel

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	03/nov/25	03/nov/25	27/fev/26		CINF	STI	70

Observações
Solicitado a adesão a ata.

PDI-25-1-4 - Cadastro de Terceirizados

Descrição
SEI: 25.0.000002881-1 Construção de sistema para gerenciamento do cadastro de Terceirizados do Tribunal. Vide Termo de Abertura de Projeto em anexo.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	02/jun/25	02/jun/25	19/dez/25		CESCO	ASPLAN	40
Atividades						Situação	
Implantação em produção						Não iniciado	
Homologação do demandante						Não iniciado	
Validar funcionalidades desenvolvidas com o demandante						Não iniciado	
Desenvolvimento						Em andamento	
Definir modelo de dados						Em andamento	
Definir regras e funcionalidade						Em andamento	
Levantamento de requisitos						Em andamento	
Observações							
Em fase de implementação da funcionalidade de gestão de contratos. O término previsto foi alterado para 19/12 em razão da priorização do desenvolvimento do sistema REGIA e troca da equipe de terceirizados.							

PDI-25-1-7-N - Sistema de Controle de Mídias das Urnas Eletrônicas

Descrição							
Objetivo: Migrar o sistema de controle de mídias(movimentações, emissão de relatórios) para APEX. SEI: 24.0.000009577-6							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Não iniciado					CESCO	CSEL	
Atividades						Situação	
Definição do escopo e Levantamento de requisitos						Não iniciado	
Construção do protótipo e validação						Não iniciado	
Modelagem de dados						Não iniciado	
Desenvolvimento do sistema						Não iniciado	
Teste e melhorias						Não iniciado	
Homologação						Não iniciado	
Implantar em produção						Não iniciado	

ELE26-25-R1-01 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 1

Descrição							
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzlhMmM4NzctNTEyZS00OThjLTljZTAzMzUzMmRkZmFjODY4IiwidCI6IjI2ZjA4NzlyLTJfOWUtNGVhZS1iN2VkLThhMmI3N2ZmM2Q5YyJ9							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	06/mar/25	06/mar/25	30/jun/25	30/jun/25	CSEL	STI	100
Observações							

Observações			
Quantitativo de defeitos por modelo:			
Sintoma	UE2020	UE2022	Total
11 - BATERIA EM NÍVEL CRÍTICO	83	25	108
180 - ERRO NA COMUNICAÇÃO COM O LEITOR BIOMÉTRICO	16	5	21
71 - ERRO NO DRIVE DO FLASH EXTERNO/MA	7	14	21
81 - URNA NÃO RECONHECE BATERIA EXTERNA		20	20
41 - DISPLAY DO MT NÃO ACENDE	15	1	16
92 - URNA NÃO INICIALIZA (TELA AZUL)	12	4	16
151 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM PROBLEMA (APRESENTA FUMAÇA AO LIGAR)	7	8	15
31 - DISPLAY DO TE NÃO ACENDE	9	2	11
12 - BATERIA NÃO SUSTENTA CARGA	3	7	10
51 - ERRO NO DRIVE DE MEMÓRIA DE RESULTADO	2	7	9
197 - FALHA/DEFEITO NA MEMÓRIA INTERNA (MI)		7	7
21 - URNA NÃO LIGA (INOPERANTE)	4	3	7
107 - IMPRESSORA NÃO IMPRIME	4	2	6
187 - ERRO NA CAPTURA DA BIOMETRIA - TIMEOUT	4	1	5
195 - FALHA/DEFEITO NO DISPLAY MSE	2	3	5
2 - FALHA NA MEMÓRIA RAM		5	5
127 - MT NÃO FUNCIONA	1	3	4
174 - TRAVAMENTO APÓS PERÍODO DE EXECUÇÃO DO STE	4		4
32 - DISPLAY DO TE APRESENTA CARACTERES ESTRANHOS	4		4
36 - DISPLAY DO TE OSCILANDO OU PISCANDO	3	1	4
4 - FALHA NO SENSOR DA FONTE	2	1	3
6 - ERRO DE FIRMWARE (BIOS, ID INVALIDO, MODELO INVALIDO, CRIPTOGRAFIA INCORRETA)	3		3
103 - IMPRESSORA IMPRIME SEM NITIDEZ	1	1	2
124 - ERRO NA COMUNICAÇÃO COM MT		2	2
196 - ERRO - TESTE DE BIOMETRIA APRIMORADO	2		2
45 - DISPLAY DO MT COM LINHAS OU FAIXAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS	2		2
101 - URNA DESLIZA AO IMPRIMIR	1		1
Total	197	125	322

Atenção: registrado um quantitativo alto de defeitos relacionado à bateria das urnas

ELE26-25-R1-01 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 2

Descrição
A manutenção preventiva envolve a verificação regular de hardware e software das urnas eletrônicas para identificar e corrigir problemas antes que eles causem falhas durante uma eleição. Isso ajuda a garantir que as eleições ocorram sem interrupções significativas. Conforme Orientação de Trabalho (OT20 - TSE - em anexo) faremos o Run in das UE 20 e UE22 apenas 02x por ano não eleitoral
Painel de acompanhamento https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzlhMmM4NzctNTEyZS00OTljZTAzMzUzZmM4ZmFjODY4IiwidCI6IjZjA4NzlyLTJjOWUtNGVhZS01IiwidVklThhMmI3N2ZmM2Q5YyJ9

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/jul/25	01/jul/25	31/ago/25	20/ago/25	CSEL		100
Atividades					Situação		
Realização do 1º Run In 2025					Concluído		
Realização do 2º Run In 2025					Concluído		
Realização do 3º Run In 2025					Em andamento		
Realização do 1º Run In 2026					Não iniciado		
Realização do 2º Run In 2026					Não iniciado		

ELE26-25-R1-04 - 16º Simulado Nacional de Hardware 2026 (16SNH2026)

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
----------	-----------------------	------------	---------------------	----------	---------------------	--------------------	-----------

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	15/set/25	15/set/25	09/out/25	09/out/25	CSEL		100

Atividades	Situação
Planejamento do Simulado de Hardware	Concluído
Configuração da Eleição - CFE	Concluído
Definição da ZE/Seções, Preparação e Replicação dos eleitores com biometria (ELO/MSSB)	Concluído
Liberação das versões da SEVIN para o 16º SNH	Concluído
Solicitação de geração dos pacotes no Intercad	Concluído
Concessão de Autorizações nos sistemas SISTOT, SIMON, MSSB e SOS	Concluído
Instalação dos Softwares necessários à realização do evento	Concluído
Preparação/Separação das urnas	Concluído
Geração e Validação dos pacotes no Intercad (município/zona, eleitores, seção e complemento município)	Concluído
Importação dos Dados no SISTOT (Candidatos e Seções)	Concluído
Impressão do Ambiente de Votação	Concluído
Geração de mídias	Concluído
Carga das Urnas - Qtde: 78 UE13 e 78 UE15	Concluído
Transmissão das Correspondências	Concluído
Votação na urna e Transmissão dos BU's - Qtde: 78 UE13 e 78 UE15	Concluído
Carga das Urnas - Qtde: 96 UE20 (UEFI Atual) e 96 UE20 (UEFI Atualizada)	Concluído
Transmissão das Correspondências	Concluído
Votação na urna e Transmissão dos BU's - Qtde: 96 UE20 (UEFI Atual)	Concluído
Votação na urna e Transmissão dos BU's - Qtde: 96 UE20 (UEFI Atualizada)	Concluído
Carga das Urnas - Qtde: 78 UE22 (UEFI Atual) e 78 UE22 (UEFI Atualizada)	Concluído
Transmissão das Correspondências	Concluído
Votação na urna e Transmissão dos BU's - Qtde: 78 UE22 (UEFI Atual)	Concluído
Votação na urna e Transmissão dos BU's - Qtde: 78 UE22 (UEFI Atualizada)	Concluído
Validação dos Resultados no SISTOT	Concluído

ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/jul/21	01/jul/21	30/jun/25	30/jul/25	AGSTI, CINF	CGSI	100

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Análise da minuta pelo CGSI, DG e SGP	Concluído
Aprovação e publicação do normativo	Concluído

ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação

Descrição
SEI: 25.0.000006720-5 Portaria Nº78/2022 (normativo que está vigente) Possui a finalidade de estabelecer as diretrizes para o controle de acesso e uso aceitável dos recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal, bem como os direitos e as responsabilidades dos usuários desses recursos.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/jul/21	01/jul/21	31/out/25	05/nov/25	CINF, STI	CGSI	100

Atividades	Situação
Análise da minuta pelo CGSI e DG	Concluído
Aprovação e publicação do normativo	Concluído
Encaminhamento da minuta do normativo pelo Secretário de TI à Diretoria Geral	Concluído
Consolidação pela ACIBER das propostas de alterações realizadas pelos Coordenadores da STI	Concluído
Elaboração de minuta de normativo pela ACIBER e encaminhamento aos Coordenadores da STI para análise	Concluído

Atividades	Situação
Revisão da minuta de normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE	Concluído
Norma finalizada	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Planejamento	Concluído

Observações
Após a consolidação das sugestões das unidades da STI, a minuta de normativo foi encaminhada para apreciação da Diretoria Geral.

PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	21/fev/25	24/fev/25	28/ago/25	28/ago/25	CSEL	DG	100

Atividades	Situação
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade - até 5 dias depois do pedido	Concluído
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Concluído
Elaboração da Minuta do Acordo de Colaboração	Concluído
Recebimento da base de Eleitores	Concluído
Recebimento da base de Candidatos	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Validação das Bases de candidatos, eleitores e seções	Concluído
Entrega das Listas de Eleitores	Concluído
Geração das Mídias	Concluído
Carga e Lacre das urnas eletrônicas	Concluído
Retirada das urnas eletrônicas	Concluído
Suporte no dia da Eleição - Nova data para a eleição	Cancelado
Devolução das urnas eletrônicas	Concluído
Novo Recebimento da base de Candidatos	Concluído
Nova Configuração da Eleição	Concluído
Nova Geração de Mídias	Concluído
Nova Carga e Lacre das urnas eletrônicas	Concluído
Nova Retirada das urnas eletrônicas	Concluído
Suporte no dia da Eleição	Concluído
Devolução das urnas eletrônicas	Concluído

Observações
A data da eleição foi adiada pela ASGMG por recursos no processo eleitoral para inclusão de novos candidatos.

PDI-24-R1-N-16 - Monitoramento de impressões

Descrição
SEI: 24.0.000019107-4 SEI: 25.0.000011650-8 Objetivo do Sistema: Acompanhamento do número de impressões e consumo de suprimentos por impressora. Serviço a ser transformado digitalmente: Leitura do número de impressões por equipamento Proposta resumida: Desenvolvimento de sistema que possibilite o monitoramento do número de impressões realizadas por equipamento. Isso facilitaria o controle de impressões e consequentemente o consumo de papel.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	18/dez/24	18/dez/24	30/mai/25	23/set/25	CINF	ATEND	100

Atividades	Situação
Formalização da demanda	Concluído
Desenvolvimento	Concluído
Testes e conclusão	Concluído

Observações
Repasse de conhecimento realizado para a ATEND. Projeto concluído.

PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan

Descrição
SEI nº: 22.0.000007683-3 WeKan é um aplicativo de quadro Kanban de código aberto, similar ao Trello, que permite a organização e gerenciamento de tarefas usando cartões e colunas para representar diferentes etapas de um projeto ou fluxo de trabalho. Ele é projetado para facilitar o acompanhamento visual do progresso das tarefas e promover a colaboração em equipe.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	10/mar/25	10/mar/25	30/set/25	02/set/25	CESCO	INTEGRAZONAS	100

Atividades	Situação
Instalação e configuração	Concluído
Testes e homologação	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Concluído

Observações
A implantação do sistema WEKAN foi homologada pelo demandante (DOC SEI ID. 1191165), finalizando o processo de implantação.

PDI-24-R1-N-24 - Customização da solução GLPI para uso como ITSM

Descrição
Adequação da solução GLPI para uso como Sistema de Gestão de Serviços de TI (ITSM).

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	10/abr/25	10/abr/25	31/jul/25	07/jul/25	CINF	STI	100

Atividades	Situação
Instalação da solução GLPI.	Concluído
Definição e criação dos grupos de usuários e atendentes.	Concluído
Revisão e configuração do Catálogo de Serviços no GLPI.	Concluído
Configuração e testes das Interfaces do usuário e analista.	Concluído
Definição dos fluxos simplificado para os chamados (chamado, e-mail, WhatsApp).	Concluído

Observações
Entrou em produção o módulo de Gestão de Chamados do GLPI. Foram concluídas as atividades: SLAs Catálogo de Serviço de TI Definição de Perfis das equipes da TI. Em ajustes finais das configurações do GLPI. Finalizando a configuração das interfaces do usuário e analista. Serão incluídas outras unidades além da CINF e da SESCO.

PDI-25-1-1 - Eleição dos Dirigentes das Escolas Municipais de São Miguel do Passa Quatro

Descrição
SEI nº 25.0.000005936-9

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	30/abr/25	30/abr/25	02/jun/25	02/jun/25	CSEL		100

Atividades	Situação
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Concluído
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade	Concluído
Elaboração do Acordo de Colaboração	Concluído
Envio da Análise de Viabilidade e da Minuta do Acordo para parecer do Juiz da 31ª ZE	Concluído
Manifestação do Juiz da 31ª ZE	Concluído
Análise e Decisão da Presidência do TRE-GO	Concluído
Assinatura do Acordo de Colaboração (TRE e Entidade)	Concluído
Recebimento da Base de Eleitores	Concluído
Recebimento da Base de Candidatos	Concluído

Atividades	Situação
Configuração da Eleição	Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído
Entrega das Listas(Candidatos e Eleitores)	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Concluído
Retirada das Urnas Eletrônicas	Concluído
Suporte às Eleições	Concluído
Devolução das Urnas Eletrônicas - até 2 dias após a eleição	Concluído

PDI-25-1-11-N - Rastreabilidade e Auditoria de Dados na Nuvem - Varonis

Descrição							
SEI 25.0.000016253-4							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	20/ago/25	20/ago/25	31/out/25	19/nov/25	CINF	STI	100
Atividades						Situação	
Reunião de kick-off do projeto						Concluído	
Prova de conceito						Concluído	
Testes e validação						Concluído	
Implantação definitiva						Concluído	
Observações							
Ferramenta migrada para SaaS e está operacional. Requisição de Mudança criado pela SESRE no SEI com o relatório da migração fornecido pela NTSEC. 25.0.000016253-4 Projeto finalizado.							

PDI-25-1-13-N - Configuração dos Ativos de TI para utilização de VOIP

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/jul/25	01/jul/25	31/out/25	02/out/25	CINF	STI	100
Atividades							Situação
Verificação de capacidade para atender a demanda (levantamento de equipamentos necessários)							Concluído
Configuração dos equipamentos (Switches e Checkpoints)							Concluído
Disponibilização da infra para a CEIN para o Anexo I							Concluído
Disponibilização da infra para a CEIN para o Anexo II							Concluído
Disponibilização da infra para a CEIN para a Sede							Concluído
Observações							
Todos os equipamentos (Sede, Anexo I e Anexo II) foram configurados e estão disponíveis para a CEIN.							

PDI-25-1-14-N - Salvaguarda e Resiliência das Informações - Netbackup

Descrição							
25.0.000007924-6 - Netbackup							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	03/jun/25	03/jun/25	28/nov/25	19/nov/25	CINF	STI	100
Atividades						Situação	
Reunião de kick-off do projeto.						Concluído	
Recebimento dos equipamentos e licenças.						Concluído	
Implantação da solução						Concluído	
Criação das novas rotinas de backup						Concluído	
Validação da solução						Concluído	
Aceite definitivo						Concluído	

Observações
Ferramenta totalmente operacional pela rede LAN. Finalizada a implantação. Nova configuração será realizada quando implantar o Switch SAN. Aceite da ferramenta realizado, curso ministrado, equipe treinada. Aguardando entrega da gaveta de expansão. 25.0.000010862-9

PDI-25-1-15-N - Eleitores do Futuro - 14 Escolas Municipais de Goiânia

Descrição
Projeto Eleitor do Futuro SEI nº 25.0.000012737-2

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	11/set/25	11/set/25	30/set/25	30/set/25	CSEL	DG	100

Atividades	Situação
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Concluído
Entrega da Base de Candidatos	Concluído
Entrega da Base de Eleitores	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído
Entrega das Listas de Eleitores	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Concluído
Retirada das Urnas Eletrônicas	Concluído
Suporte às Eleições no dia da eleição	Concluído
Devolução das Urnas Eletrônicas	Concluído

PDI-25-1-16-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Anhanguera

Descrição
SEI nº 25.0.000012787-9

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	15/set/25	15/set/25	21/out/25	20/out/25	CSEL		100

Atividades	Situação
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade	Concluído
Geração da Base de Eleitores	Concluído
Entrega da Base de Candidatos	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Entrega do caderno de votação	Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Concluído
Suporte às Eleições no dia da eleição	Concluído
Devolução das Urnas Eletrônicas	Concluído
Análise da Viabilidade e envio para aprovação da Presidência	Concluído

PDI-25-1-17-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Turvelândia

Descrição
SEI n. 25.0.000012927-8

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	16/set/25	16/set/25	04/nov/25	03/nov/25	CSEL		100

Atividades	Situação
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade	Concluído
Geração da Base de Eleitores	Concluído

Atividades	Situação
Entrega da Base de Candidatos	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Entrega do caderno de votação	Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Concluído
Suporte às Eleições no dia da eleição	Concluído
Devolução das Urnas Eletrônicas	Concluído
Análise da Viabilidade e envio para aprovação da Presidência	Concluído

PDI-25-1-18-N - Eleição de Gestores das Unidades Escolares - Iporá

Descrição							
SEI nº 25.0.000013260-0							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	22/set/25	22/set/25	01/dez/25		CSEL		100
Atividades							Situação
Análise da Viabilidade e envio para aprovação da Presidência							Concluído
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade							Concluído
Entrega da Base de Eleitores							Concluído
Entrega da Base de Candidatos							Concluído
Configuração da Eleição							Concluído
Entrega do caderno de votação							Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)							Concluído
Geração de Mídias							Concluído
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas							Concluído
Suporte às Eleições no dia da eleição							Concluído
Devolução das Urnas Eletrônicas							Concluído
Recebimento do Processo e análise preliminar							Concluído

PDI-25-1-19-N - Espaço do Servidor - Acesso Aposentados

Descrição							
Projeto para disponibilização de acesso ao Espaço do Servidor por servidores aposentados e cedidos para órgãos externos							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	06/out/24	06/out/24	17/jun/25	17/jun/25	CESCO	SGP	100
Atividades							Situação
Configuração do Keycloak para autenticação mista (Keycloak/LDAP)							Concluído
Desenvolvimento de módulo de integração com Keycloak							Concluído
Desenvolvimento de módulo externo - (Altera Senha)							Concluído
Adaptação do Espaço do Servidor para uso do módulo de autenticação							Concluído
Implantação em produção							Concluído
Observações							
Implantado: Espaço do Servidor com autenticação Keycloak, permitindo o acesso de servidores inativos ou que atuam fora do tribunal. Módulo Altera Senha para que os servidores externos possam alterar a senha.							

PDI-25-1-21-N - Projeto Eleitores do Futuro - Escola Shalom

Descrição
SEI n. 25.0.000011808-0

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	07/out/25	07/out/25	31/out/25	31/out/25	CSEL		100
Atividades						Situação	
Levantamento das informações junto à EJE						Concluído	
Entrega da Base de Candidatos						Concluído	
Entrega da Base de Eleitores						Concluído	
Configuração da Eleição						Concluído	
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)						Concluído	
Entrega das Listas de Eleitores						Concluído	
Geração de Mídias						Concluído	
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas						Concluído	
Retirada das Urnas Eletrônicas						Concluído	
Suporte às Eleições no dia da eleição						Concluído	
Devolução das Urnas Eletrônicas						Concluído	

PDI-25-1-21-N - Eleição - Escolas Municipais - Colinas do Sul

Descrição							
SEI n. 25.0.000015362-4							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	03/nov/25	03/nov/25	26/nov/25	26/nov/25	CSEL		100
Atividades						Situação	
Devolução das Urnas Eletrônicas						Concluído	
Suporte às Eleições no dia da eleição						Concluído	
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas						Concluído	
Geração de Mídias						Concluído	
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)						Concluído	
Entrega do caderno de votação						Concluído	
Configuração da Eleição						Concluído	
Entrega da Base de Eleitores						Concluído	
Entrega da Base de Candidatos						Concluído	
Análise da Viabilidade e envio para aprovação da Presidência						Concluído	
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade						Concluído	

PDI-25-1-6-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Crixás

Descrição							
SEI nº 25.0.000009199-8							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/jul/25	01/jul/25	12/ago/25	12/ago/25	CSEL	PRES	100
Atividades						Situação	
Devolução das Urnas Eletrônicas						Concluído	
Suporte às Eleições no dia da eleição						Concluído	
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas						Concluído	
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)						Concluído	
Entrega do caderno de votação						Concluído	
Configuração da Eleição						Concluído	
Entrega da Base de Candidatos						Concluído	
Geração da Base de Eleitores						Concluído	
Análise da Viabilidade e envio para aprovação da Presidência						Concluído	

Atividades	Situação
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade	Concluído

PDI-25-1-8-N - Eleitores do Futuro - Centro de Ensino em Período Integral Professor César Augusto Ceva - CEPI - Ipameri

Descrição
Eleição - Projeto Eleitores do Futuro SEI Nº 25.0.000008732-0

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	11/ago/25	11/ago/25	08/set/25	08/set/25	CSEL		100

Atividades	Situação
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Concluído
Entrega da Base de Candidatos	Concluído
Entrega da Base de Eleitores	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído
Entrega das Listas de Eleitores	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Concluído
Retirada das Urnas Eletrônicas	Concluído
Suporte às Eleições no dia da eleição	Concluído
Devolução das Urnas Eletrônicas	Concluído

PDI-25-1-9-N - Modernização dos Links Eleitorais -BRFibra e Claro

Descrição
25.0.000009882-8 - BRFibra 25.0.000010152-7 - Claro S/A

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	25/ago/25	25/ago/25	28/nov/25	19/nov/25	CINF	STI	100

Atividades	Situação
Reunião de kick-off do projeto de implantação da BRFIBRA	Concluído
Implantação dos links	Concluído
Testes de aceitação	Concluído
Implantação de solução Anti-DDoS	Concluído
Aceite Definitivo (Links)	Concluído
Recebimento dos equipamentos (Modem 5G)	Concluído
Verificação de conformidade dos modems	Concluído
Inclusão dos chips e roteadores no controle patrimonial	Concluído
Aceite Definitivo (Modems 5G)	Concluído

Observações
Todos links da Sede e Cartórios entregues. Solução Anti-DDoS implantada. Restando somente os cartórios em reforma, são eles: Crixás, Formoso, Itapaci, Itapuranga, Pontalina, São Miguel do Araguaia, Silvânia

PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/jul/24	01/jul/24	21/fev/25	21/fev/25	CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	100

Atividades	Situação
Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ Resolução 335/2020 na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados	Concluído
Elaboração do Termo de Referência	Concluído

Atividades	Situação
Realização da licitação	Concluído
Execução da Ata de registro de preços	Concluído
Observações	
O projeto teve o seu andamento retomado na reunião do dia 30/07/2025.	

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

Descrição
Objetivo da demanda: Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados. Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta): A falta catalogação dos ativos de TI, tanto hardware quanto software, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataques cibernéticos de qualquer natureza. Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)? Gestão de TI e apoio à Governança Desenvolvimento e administração de soluções de TIC Gestão de infraestrutura de TIC Suporte técnico das soluções de TIC Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução): 1. Visibilidade de todo o parque de hardware do Tribunal. 2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional. 3. Visibilidade de todos os softwares em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades. Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada): Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados. Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026 Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico): Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante? Não Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda: Custo (Informe a estimativa de custo do projeto): Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em Software Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	07/jan/22	07/jan/22	15/jul/25	07/jul/25	CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	100

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Aquisição da solução	Concluído
Implementação de protocolo seguro SNMP com https no OCS.	Concluído
Instalação e configuração da solução	Concluído
Implantação	Concluído
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	Concluído

Observações
O projeto foi concluído com a finalização das atividades : Em fase de análise do CMDB do GLPI; Analisar se o GLPI consegue atender a disponibilização do CMDB. Realização do inventário dos ativos de infraestrutura utilizando o GLPI.

PDI-24-R1-N-10 - Eleição dos Dirigentes para os Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores - PT

Descrição
SEI Nº 24.0.000019889-3

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Cancelado	03/fev/25	03/fev/25	08/jul/25	26/mai/25	CSEL	DG	30

Atividades	Situação
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Concluído
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade	Concluído
Elaboração do Acordo de Colaboração	Concluído
Análise e Autorização da Presidência do TRE-GO	Cancelado
Entrega da Base de Candidatos	Não iniciado

Atividades	Situação
Entrega da Base de Eleitores	Não iniciado
Configuração da Eleição	Não iniciado
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Não iniciado
Entrega das Listas de Eleitores	Não iniciado
Geração de Mídias	Não iniciado
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Retirada das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Suporte às Eleições	Não iniciado
Devolução das Urnas Eletrônicas - até 2 dias após a eleição	Não iniciado
Observações	
As informações foram encaminhadas pelo partido. Aguardando decisão da Presidência do TRE-GO, sobre o atendimento da solicitação de empréstimo das Urnas Eletrônicas.	

PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores

Descrição
SEI: 22.0.000008626-0 Objetivo da demanda: Desenvolver formulário pré preenchido de recadastramento de servidores, visando agilizar e otimizar o processo de revisão do cadastro de servidores. Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta): Facilitar o processo de solicitação de alteração de dados cadastrais pelos servidores, com a permissão de alteração de dados livres e possibilidade de solicitação de alteração de dados que exigem comprovação, com a anexação de documentos. Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)? Macroprocesso de apoio: Gestão de Pessoas / Processo: Gestão do quadro de pessoal Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução): Facilidade e celeridade da execução do processo de recadastramento de servidores, tanto para o servidor quanto para a unidade responsável. Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada): 8 - Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas. Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico): Disponibilização de formulário eletrônico pré-preenchido com os dados dos servidores, com opção de solicitação de alteração, anexação de documentos e possibilidade de deferimento pela unidade responsável, com gravação automática no SGRH. Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante? Não Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda: Não se aplica Custo (Informe a estimativa de custo do projeto): Não se aplica

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Suspensão	27/fev/23	27/fev/23	30/mai/25		CESCO	SGP	10

Atividades	Situação
Planejamento	Adiado
Criação e configuração do ambiente de testes	Não iniciado
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
A SGP informou no SEI: 24.0.000019107-4 despacho ID. nº 0972047, não possuir no momento, condições de reapresentar o sistema para priorização do CGTIC, o que foi confirmado pela AGSGP e Secretária de Gestão de Pessoas (ID. 0972047). Desta forma, este projeto ficará suspenso até que seja reapresentado pela unidade demandante, com os detalhes necessários ao seu desenvolvimento (vide último parágrafo do despacho do Secretário de TI, ID. nº 1088674).

PDI-25-1-2 - Plenário Virtual

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Suspensão	03/jun/24	03/jun/24	31/jul/24		ASPJE	SJD	10

Atividades	Situação
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
O projeto foi suspenso em reunião do CTGTI ocorrida no dia 21/03/2025.

PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em fila					CESCO	EJE	

Observações
Verificar se outros Regionais possuem sistema informatizado que atendem a demanda.

PDI-24-R1-N-17 - Sistema de disponibilização de Acórdãos na internet (Ementário)

Descrição
SEI: 24.0.000019107-4 Objetivo do Sistema: Otimizar a disponibilização ao público externo, diretamente na internet, do inteiro teor dos acórdãos para pesquisa. Serviço a ser transformado digitalmente: Disponibilização, na internet, dos acórdãos lançados na intranet para que alcance o público externo. Proposta resumida: A proposta visa à disponibilização, na internet, dos acórdãos publicados na intranet para que alcance o público externo que busca por pesquisa.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em fila	10/mar/25	10/mar/25			CESCO	SGI	10

Atividades	Situação
Formalização da demanda	Não iniciado
Desenvolvimento	Não iniciado
Testes e conclusão	Não iniciado

Observações
Em reunião do CTGTI ocorrida no dia 02/04/2024, o status do projeto foi alterado para A priorizar devido a mudança de escopo do projeto.

PDI-25-1-3 - Agenda Institucional

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em fila					CESCO	APRISQ	

Observações
Priorizado pelo CGTIC na reunião do dia 2025-05-13

PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE

Descrição
SEI: 24.0.000003403-3 Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online dos servidores ao seu próprio dossiê funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/21	07/jan/21	19/dez/25		CESCO	SGP	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Migração dos dados do NUXEO (dossiê do servidor)	Em andamento
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
O SEI com o termo de homologação será encaminhado a unidade demandante.

PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votanet/E-voto

Descrição							
SEI nº: 24.0.000007445-0 O e-Voto é uma ferramenta da Justiça Eleitoral de Santa Catarina para votações eletrônicas da comunidade. Esta ferramenta permite realizar eleições, plebiscitos e referendos de forma presencial, minimizando os custos de logística de urnas e facilitando o acesso dos eleitores, que podem votar de qualquer computador ou dispositivo móvel. Adoção de um sistema de votação online E-voto desenvolvido pelo TRE-SC.							

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	05/mai/24	05/mai/24	30/jan/26		CESCO	EJE	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Em andamento

Observações
Aguardando retorno do servidor Chayner para disponibilização do sistema em produção com as credenciais do http://gov.br O término previsto foi alterado para 30/01/2026 em razão da demora na disponibilização das credenciais do http://gov.br

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)

Descrição							
SEI 25.0.000008359-6 Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal. Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO.							

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	29/abr/22	29/abr/22	26/abr/24		CESCO	SAO	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Análise de requisitos	Concluído
Desenvolvimento funcionalidades	Concluído
Testes de funcionalidades	Concluído
Homologação do PCA para PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas)	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
SEI 25.0.000008359-6 encaminhado para ADAAC solicitando as seguintes atividades: Aplicar filtros nas tabelas de materiais e serviços, e posterior vinculação destas informações com as demandas; Enviar o PCA para PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas) para avaliação, utilizando funcionalidade própria do sistema.

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Descrição							
http://wp.tre-go.jus.br/							

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	30/jun/23	30/jun/23	31/mar/25		CESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela equipe de desenvolvimento	Em andamento
Homologação do produto	Não iniciado

Atividades	Situação
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
Realização dos últimos ajustes para lançamento da nova Intranet.	

PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI

Descrição							
SEI: 23.0.000016671-5							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	16/fev/24	16/fev/24	30/set/25		CESCO	DG	90
Atividades						Situação	
Realização de testes pela equipe técnica						Concluído	
Criação e configuração do ambiente de testes						Concluído	
Levantamento de requisitos						Concluído	
Planejamento						Concluído	
Disponibilização em ambiente de produção						Não iniciado	
Homologação do produto						Em andamento	
Observações							
O projeto foi retomado com o módulo desenvolvido pelo TSE com prazo final previsto alterado para 30/09/2025; O módulo de peticionamento foi disponibilizado para homologação pela unidade demandante.							

PDI-24-R1-N-20 - Controle de Capacitação da EJE

Descrição							
SEI: 24.0.000019107-4 (Plano de Transformação Digital) Objetivo do Sistema: Promover o registro e o controle dos inscritos em todas capacitações da EJE. Serviço a ser transformado digitalmente: Serviço de admissão e registro de inscrições Serviço de controle da frequência dos inscritos Serviço de emissão de certificados com controle de autenticidade. Proposta resumida: Desenvolvimento de aplicativo/software que registre e controle todas as etapas do processo de capacitação da EJE.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	31/dez/24	07/abr/25	30/set/25		CESCO	EJE	90
Atividades						Situação	
Formalização da demanda						Concluído	
Desenvolvimento						Em andamento	
Testes e conclusão						Não iniciado	
Teste de emissão de certificados pelo moodle						Em andamento	
Observações							
Foi realizado o teste de emissão de certificado com o moodle; O SEI com o termo de homologação será enviado para a unidade demandante.							

PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho

Descrição							
SEI: 25.0.000004637-2							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	14/abr/25	14/abr/25	28/nov/25		CESCO	SGP	90
Atividades						Situação	
Planejamento						Concluído	
Implantação						Concluído	
Realização de teste pela unidade demandante						Em andamento	

Atividades	Situação
Homologação pela unidade demandante	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
Foi realizado a reunião no dia 03 com Luís Cláudio Fernandes (SEAID), Alessandro Maurício (CINF), Aline Mikato (SESRE), Marcílio (SEPRO), Adenir e grupo de implantação da área de negócio. Ficou estabelecido um piloto no uso do DFT Diário com as seções SEPRO, SESRE E SEGEC em conjunto com as unidades da SGP. A participação da SEAID (fica no aguardo do retorno do chefe titular - Leonardo Antônio)	

PDI-25-1-5-N -Sistema de Registro de IAs (REGIA)

Descrição							
Criação do Formulário de Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial SEI nº 25.0.000008198-4 O Gestor da Unidade utilizará o formulário para cadastrar e atualizar (caso dados já tenham sido informados) dados dos servidores da sua Unidade que utilizam alguma ferramenta de inteligência artificial.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	16/jun/25	17/jun/25	30/out/25		CESCO	STI	90
Atividades					Situação		
Levantamento de requisitos					Concluído		
Construção do protótipo e validação					Concluído		
Modelagem de dados					Concluído		
Desenvolvimento do sistema					Concluído		
Teste e melhorias					Concluído		
Homologação					Em homologação		
Implantar em produção					Não iniciado		
Observações							
O sistema foi refatorado e corrigido os problemas de autenticação. Aguardando correção na inclusão dos membros de equipe.							

PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede sem fio

Descrição							
SEI nº 23.0.000003147-0 Aquisição de solução de rede sem fio (Wi-fi). com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral. Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Adiado	28/fev/23	28/fev/23	19/dez/24		CINF	STI	60
Atividades						Situação	
Elaboração do ETP.						Concluído	
Elaboração do DOD.						Concluído	
Implementação da solução.						Não iniciado	
Execução da ARP.						Não iniciado	
Processo de licitação.						Não iniciado	
Adequação das especificações e coleta de preços estimativos.						Em andamento	
Elaboração do TR.						Em andamento	

PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Sobrestado	19/ago/24	19/ago/24	19/dez/25		CESCO	STI	70
Atividades						Situação	
Planejamento						Concluído	

Atividades	Situação
Criação e configuração de ambiente de teste interno	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes em nuvem	Suspenso
Realização de testes pela unidade demandante	Em andamento
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
O projeto foi sobrestado em razão do envolvimento das equipes com outros projetos prioritários.

PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Sobrestado	03/fev/25	03/fev/25	29/ago/25		CESCO, CINF	STI	50

Atividades	Situação
Realização de testes com o keycloak	Em andamento
Inserção de sistemas no Portal	Em andamento
Implantação de RDP via remoteapp	Concluído
Implementação do ODIN via F5	Não iniciado



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL DÍDIMO SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 04/12/2025, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO CÉSAR RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 04/12/2025, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 04/12/2025, às 19:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 05/12/2025, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRAYTON MARQUES SANTANA, COORDENADOR(A)**, em 20/01/2026, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1274125** e o código CRC **8880F2EE**.

