



Reunião CTGTI - 01/2023

1. Identificação

Data da reunião: 19 de abr. de 2023	Início: 14:30h Término: 17:30h	Local: Sala de reunião da STI
Objetivo da reunião: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022		

2. Objetivos

- Apresentar os resultados dos projetos;
- Atualizar os integrantes do CTGTI com relação a metodologia de gerenciamento de projetos;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Apresentar o andamento atualizado dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.


4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?


5. Participantes da reunião

Nome	Unidade	email
Augusto César de Castro Ovelar	CESCO	Augusto.overlar@tre-go.jus.br
Márcio Duarte Oliveira	CSEL	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Marcílio Zaccarelli Bersaneti	CINF	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	AGSTI	paulo.taira@tre-go.jus.br

6. Portfólio de projetos

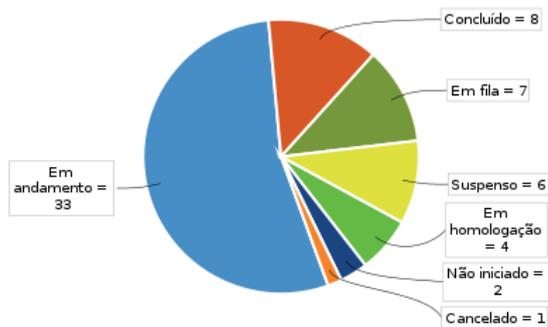

Total: 61 . Gráfico por: Status

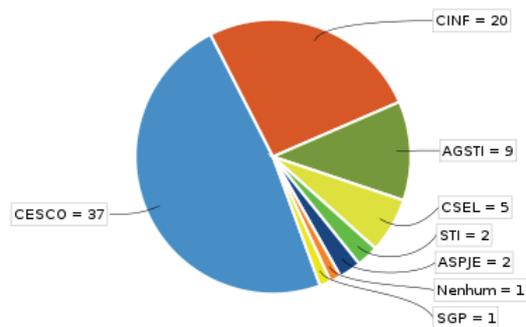

Total: 61 . Gráfico por: Unidade responsável

6.1. Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
PDI-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	EM ANDAMENTO	90	CESCO
PDI-14 - Eleições da Comunidade	EM ANDAMENTO	20	CSEL
PDI-12 - Implantação de ferramenta automatizada de comunicação externa e prestação de serviços aos clientes cidadãos da Justiça Eleitoral em Goiás.	EM ANDAMENTO	50	CESCO
PDI-10 - Implantar nova versão do SISPAC	EM ANDAMENTO	10	CESCO
PDI-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	EM ANDAMENTO	10	CESCO
PDI-06 - Implantar o Sistema de Gerenciamento de Propaganda Partidária Gratuita (SisAntena)	EM ANDAMENTO	10	CESCO
PDI-02 - Implantação do RDC ARQ	EM ANDAMENTO	70	CESCO
PDI-25 - Nova Intranet	EM ANDAMENTO		CESCO
PDI-15 - Eleições Suplementares	EM ANDAMENTO		CSEL
PDI-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI	EM ANDAMENTO	80	CESCO
PDI-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015	EM ANDAMENTO	30	CINF, CSEL
PDI-28 - Criação de novos postos de atendimento (Acordo de colaboração TJ)	EM ANDAMENTO	10	CINF
PDI-31 - Suporte às Eleições 2024	EM ANDAMENTO		AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL

13 itens

6.2. Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
ENS-10 - Solução de Gestão de Patches	EM ANDAMENTO	20	CINF
ENS-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	EM ANDAMENTO	90	CINF
ENS-09 - Solução de Cofre de senhas	EM ANDAMENTO	90	CINF

ENS-12 - Solução de Plataforma de conscientização	EM ANDAMENTO	20	AGSTI, SGP
ENS-13 - Solução de Segurança do AD	EM ANDAMENTO	20	CINF
ENS-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	EM ANDAMENTO	40	CINF, STI
ENS-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados	EM ANDAMENTO	70	CINF
ENS-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	EM ANDAMENTO	40	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	EM ANDAMENTO	40	CESCO

9 itens

6.3. Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
PTE-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	EM ANDAMENTO	50	AGSTI
PTE-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	EM ANDAMENTO	50	AGSTI
PTE-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente	EM ANDAMENTO	10	AGSTI
PTE-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	EM ANDAMENTO	60	AGSTI
PTE-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	EM ANDAMENTO	50	CESCO
PTE-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	EM ANDAMENTO	10	CESCO
PTE-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	EM ANDAMENTO		ASPJE
PTE-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	EM ANDAMENTO	20	CESCO, CINF
PTE-22 - Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente	EM ANDAMENTO	90	CESCO
PTE-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26	EM ANDAMENTO	70	AGSTI
PTE-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC	EM ANDAMENTO	50	STI

11 itens

7. Anotações

7.1 - Considerações preliminares

A AGSTI apresentou o portfólio de projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022 e na sequência os integrantes do CTGTI, informaram quais projetos encontram-se efetivamente em andamento em cada uma das respectivas unidades. Desta forma, aqueles que anteriormente estavam na situação "Em andamento" mas que não puderam ter a sua execução continuada, tiveram a situação alterada para "Suspenso" (vide item 7.4).

7.2 - Projetos do Plano de Demandas Internas (PDI)

Sugestões apresentadas pela Coordenadoria de Sistemas Corporativos (CESCO)

- Incluir projeto de desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (SISCONS) solicitado pela CSEL e que está sendo executado pela SESCO;
- Analisar as demandas/projetos decorrentes da gestão de vulnerabilidades (necessidade de realizar um plano de ação e priorização de projetos em execução);
- Incluir projeto de implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados da ORACLE (adquiridos em 2023) - a ser executado pela SEAID;
- Sugestão de implementar ações de disseminação de segurança da informação utilizando a plataforma KNOWBE4.

Sugestões apresentadas pela Coordenadoria de Infraestrutura (CINF)

- Incluir o projeto de instalação do backbone secundário redundante.

7.3 - Projetos do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE)

- PTE 24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020;
 - Verificar o envolvimento da ASPJE e necessidade de definição da unidade de negócio, gestora do projeto.
- PTE-22 - Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente;
 - (Inserir despacho justificando a conclusão deste projeto).
- PTE-02 - Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral.
 - (Inserir despacho justificando a conclusão deste projeto).

7.4 - Projetos da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ)

Muitos projetos foram iniciados de modo simultâneo, por meio de grupos de trabalho coordenados pelo TSE, desta forma, em razão da capacidade de execução de projetos em paralelo por parte das equipes, foram suspensos os seguintes projetos:

- ENS-01 - Configuração Segura de Ambientes;
 - ENS-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico;
 - ENS-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação;
 - ENS-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs);
 - ENS-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF;
 - ENS-16 - Uso de Recursos Criptográficos.
-
