



Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
Secretaria de Tecnologia da Informação

Reunião CTGTI - 02/2023

1. Identificação

Data da reunião: 28 de abr. de 2023	Início: 14:45h Término: 17:45h	Local: Sala de reunião da STI
Objetivo da reunião: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Apresentar o andamento atualizado dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.



4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?

5. Participantes da reunião

Nome	Unidade	email
Frank Wendell Ribeiro	STI	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	AGSTI	paulo.taira@tre-go.jus.br
Augusto César de Castro Ovelar	CESCO	Augusto.overlar@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	CSEL	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Marcílio Zaccarelli Bersaneti	CINF	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br

6. Portfólio de projetos

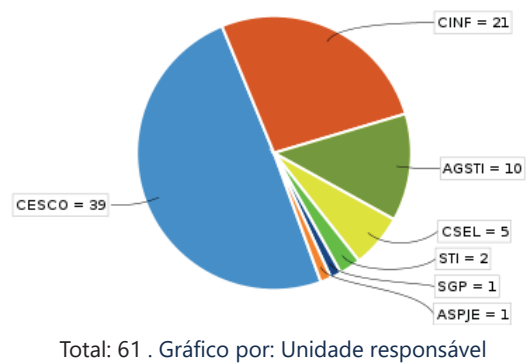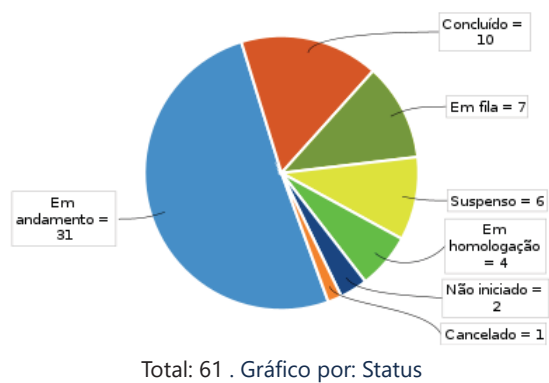

6.1. Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
PDI-02 - Implantação do RDC ARQ	EM ANDAMENTO	20	CESCO
PDI-06 - Implantar o Sistema de Gerenciamento de Propaganda Partidária Gratuita (SisAntena)	EM ANDAMENTO	10	CESCO
PDI-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	EM ANDAMENTO	10	CESCO
PDI-10 - Implantar nova versão do SISPAC	EM ANDAMENTO	10	CESCO
PDI-12 - Implantação de ferramenta automatizada de comunicação externa e prestação de serviços aos clientes cidadãos da Justiça Eleitoral em Goiás.	EM ANDAMENTO	50	CESCO
PDI-14 - Eleições da Comunidade	EM ANDAMENTO	20	CSEL
PDI-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	EM ANDAMENTO	90	CESCO
PDI-25 - Nova Intranet	EM ANDAMENTO	20	CESCO
PDI-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI	EM ANDAMENTO	80	CESCO
PDI-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015	EM ANDAMENTO	50	CINF, CSEL
PDI-28 - Criação de novos postos de atendimento (Acordo de colaboração TJ)	EM ANDAMENTO	10	CINF
PDI-31 - Suporte às Eleições 2024	EM ANDAMENTO	10	AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL

6.2. Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
ENS-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	EM ANDAMENTO	40	CESCO
ENS-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados	EM ANDAMENTO	90	CINF

ENS-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	EM ANDAMENTO	70	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-09 - Solução de Cofre de senhas	EM ANDAMENTO	90	CINF
ENS-10 - Solução de Gestão de Patches	EM ANDAMENTO	90	CINF
ENS-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	EM ANDAMENTO	90	CINF
ENS-12 - Solução de Plataforma de conscientização	EM ANDAMENTO	80	AGSTI, SGP
ENS-13 - Solução de Segurança do AD	EM ANDAMENTO	90	CINF
ENS-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	EM ANDAMENTO	90	CINF, STI

6.3. Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
PTE-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC	EM ANDAMENTO	50	STI
PTE-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26	EM ANDAMENTO	70	AGSTI
PTE-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	EM ANDAMENTO	50	AGSTI
PTE-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	EM ANDAMENTO	50	AGSTI
PTE-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	EM ANDAMENTO	10	CESCO
PTE-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	EM ANDAMENTO	20	CESCO, CINF
PTE-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	EM ANDAMENTO	10	CESCO
PTE-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	EM ANDAMENTO	10	CESCO
PTE-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	EM ANDAMENTO	50	CESCO
PTE-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	EM ANDAMENTO	60	AGSTI
PTE-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente	EM ANDAMENTO	10	AGSTI

7. Anotações

7.1 - Projetos do Plano de Demandas Internas (PDI)

Sugestões apresentadas pela Coordenadoria de Sistemas Eleitorais (CSEL)

- Incluir projeto de manutenção preventiva de urnas;
- Incluir como projeto cada eleição da comunidade realizada;
- Incluir como projeto cada eleição da suplementar realizada.

Sugestões apresentadas pela Coordenadoria de Infraestrutura (CINF)

- Incluir projeto de reaparelhamento da rede cabeada e sem fio;
- Incluir projeto de reaparelhamento dos serviços de impressão.

7.3 - Projetos do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE)

- PTE-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33;
 - Adaptar o processo de desenvolvimento de software (SPRINT7) ou a Política de Desenvolvimento Organizacional de Software, a fim de atender as diretrizes da Resolução nº 370 do CNJ.
- PTE-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020;
 - Elaborar instrução de trabalho prevendo o atendimento das diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020 envolvendo o desenvolvimento de sistemas voltados para a PDPJ.
- PTE-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas.
 - Elaborar instrução de trabalho prevendo o atendimento das diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020 envolvendo o desenvolvimento de sistemas voltados para a PDPJ.

7.4 - Projetos da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ)

- Foram atualizados as situações e percentual de execução dos projetos.

PDI-02 - Implantação do RDC ARQ

Descrição
Para fins de preservação digital, os órgãos do Poder Judiciário adotarão repositório arquivístico digital confiável (RDC-Arq), desenvolvido como software livre, gratuito e de código aberto, projetado para manter os dados em padrões de preservação digital e o acesso em longo prazo.
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3376

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	06/mai/21	06/mai/21	31/jul/23		CESCO	20

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Etapa 2023	EM ANDAMENTO						
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	EM ANDAMENTO						
Realização de testes pela unidade demandante	NÃO INICIADO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

Observações

Aguardando a disponibilização dos pacotes pelo TRE-DF. A área de negócio do TRE-DF pediu algumas alterações que estão sendo feitas pela equipe de TI daquele Regional.
--

PDI-06 - Implantar o Sistema de Gerenciamento de Propaganda Partidária Gratuita (SisAntena)

Descrição

A SJD solicitou a implantação do sistema SisAntena ao invés do Sistema de Pautas de Julgamento que foi atendido por consulta realizada pela ASPJE.

Solicitação de modificação do projeto pela SJD no SEI nº22.0.000018920-4 (doc. id nº 0466213)

SEI que contém a solicitação de implantação do sistema por parte da SJD: 23.0.000001525-3

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	27/fev/23	27/fev/23	30/jun/23		CESCO	10

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	EM ANDAMENTO						
Realização de testes pela unidade demandante	NÃO INICIADO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

Observações

Aguardando a disponibilização dos pacotes pelo TRE-DF. A área de negócio do TRE-DF pediu algumas alterações que estão sendo feitas pela equipe de TI daquele Regional.

PDI-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores

Descrição

SEI: 22.0.000008626-0

Objetivo da demanda:
Desenvolver formulário pré preenchido de recadastramento de servidores, visando agilizar e otimizar o processo de revisão do cadastro de servidores.

Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):
Facilitar o processo de solicitação de alteração de dados cadastrais pelos servidores, com a permissão de alteração de dados livres e possibilidade de solicitação de alteração de dados que exigem comprovação, com a anexação de documentos.

Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?
Macroprocesso de apoio: Gestão de Pessoas / Processo: Gestão do quadro de pessoal

Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):
Facilidade e celeridade da execução do processo de recadastramento de servidores, tanto para o servidor quanto para a unidade responsável.

Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):
8 - Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas.

Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):
Disponibilização de formulário eletrônico pré-preenchido com os dados dos servidores, com opção de solicitação de alteração, anexação de documentos e possibilidade de deferimento pela unidade responsável, com gravação automática no SGRH.

Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?
Não

Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:
Não se aplica

Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):
Não se aplica

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	27/fev/23	27/fev/23	30/set/23		CESCO	10

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	EM ANDAMENTO						
Criação e configuração do ambiente de testes	NÃO INICIADO						
Realização de testes pela unidade demandante	NÃO INICIADO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						

Disponibilização em ambiente de produção

NÃO INICIADO

Observações

Aguardando SGP enviar a relação de informações que serão recadastradas

PDI-10 - Implantar nova versão do SISPAC

Descrição
Promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	29/abr/22	29/abr/22	19/dez/23		CESCO	10

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	NÃO INICIADO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						
Implementação das funcionalidades	NÃO INICIADO						
Levantamento de requisitos da nova versão	NÃO INICIADO						

Observações
Equipe finalizando solicitações no Siapex

PDI-12 - Implantação de ferramenta automatizada de comunicação externa e prestação de serviços aos clientes cidadãos da Justiça Eleitoral em Goiás

Descrição
Aperfeiçoar a comunicação externa e a prestação de serviços aos clientes da Justiça Eleitoral, por meio de ferramenta que integre o uso de redes sociais (WhatsApp, Telegram, Facebook e Instagram).
SEI nº 5925-8

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	10/dez/21	10/dez/21	22/mai/23		CESCO	50

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	NÃO INICIADO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						
Implementação das funcionalidades	NÃO INICIADO						
Levantamento de requisitos da nova versão	NÃO INICIADO						

Observações
- Realizado o treinamento do perfil Supervisor, em 27/04/23 - Previsão de realização do treinamento para o perfil Atendente, na semana 02 à 12/05 - O término previsto foi alterado de 31/03 para 22/05/2023 em razão da mudança da tecnologia da central telefônica.

PDI-14 - Eleições da Comunidade

Descrição						
1 item Atualizar						
Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	29/abr/22	29/abr/22	15/abr/24		CSEL	20

 ETAPAS

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Sindicato dos Trabalhadores dos Correios – SINTECT/GO	CANCELADO	10	11/nov/22	14/nov/22	17/fev/23	13/dez/22		
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás - COSEMS/GO	CANCELADO	10	16/jan/23	16/jan/23	13/mar/23	09/fev/23		
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC	CANCELADO	10	16/jan/23	16/jan/23	01/mai/23	28/fev/23		
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES	CANCELADO	10	18/jan/23	18/jan/23	12/mai/23	09/mar/23		
Eleitor do Futuro - Colégio Espaço Pedagógico Educacional - Grêmio Estudantil	CONCLUÍDO	100	01/fev/23	01/fev/23	27/fev/23	27/fev/23		
Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás - COOTEGO	CONCLUÍDO	100	10/fev/23	10/fev/23	14/mar/23	10/mar/23		
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023 - CMDCA 2023	EM ANDAMENTO	10	06/fev/23		06/out/23			

PDI-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições

Descrição
Desenvolvimento (Finalização) de Sistema de Substituição de Servidores, que envolve o processo indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança (FC) e Cargos Comissionados (CJ), por prazo determinado ou indeterminado.
Visa automatizar o processo de indicação e deferimento de substituições de cargos de direção, chefia e assessoramento no Tribunal
Meta: Automação do processo de indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança e Cargos Comissionados até setembro/2022.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	27/abr/22	27/abr/22	30/jun/23		CESCO	90

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	EM ANDAMENTO						
Realização de testes pela unidade demandante	EM ANDAMENTO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

PDI-25 - Nova Intranet

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO			30/jun/23		CESCO	20

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	EM ANDAMENTO						
Realização de testes pela unidade demandante	NÃO INICIADO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

Observações

- adequando tema para responsivo
- <http://orion3.tre-go.jus.br/cms/wordpress/>

PDI-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI

Descrição
SEI nº: 21.0.000005057-9 (principal) e 21.0.000005046-3

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO			30/jun/23		CESCO	80

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	EM ANDAMENTO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

Observações

Em testes na SJD <https://sei4-teste.tre-go.jus.br/sei/>

Adaptar manual

PDI-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015

Descrição
SEI nº 22.0.000015982-8

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/fev/23	01/fev/23	26/jun/23		CINF, CSEL	50

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Instalação dos kits biométricos	EM ANDAMENTO	01/fev/23	01/fev/23	13/jun/23			40
Treinamento dos operadores	EM ANDAMENTO						
Comunicar à CRE a relação das Zonas que estão aptas para iniciar o atendimento	EM ANDAMENTO						

PDI-28 - Criação de novos postos de atendimento (17 postos do TJ)

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO			31/mar/24		CINF	10

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Preparação de ambiente seguro e desenvolvimento de template	EM ANDAMENTO					CINF	
Rio Quente	NÃO INICIADO						
Portelândia	NÃO INICIADO						
Distrito Jardim ABC	NÃO INICIADO						
Caldazinha	NÃO INICIADO						
Perolândia	NÃO INICIADO						
São Miguel do Passa Quatro	NÃO INICIADO						

PDI-31 - Suporte às Eleições 2024

Descrição
Suporte técnico prestado pela STI nas atividades relacionadas às Eleições Municipais de 2024.

Situação	Execução%	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável
EM ANDAMENTO	10	09/jan/23	09/jan/23	19/dez/24		AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL

 MACROATIVIDADES

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Apuração e Totalização	CONCLUÍDO							
Cadastro Eleitoral	EM ANDAMENTO							
Voto Eletrônico	EM ANDAMENTO							

 ATIVIDADES CADASTRO ELEITORAL

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Atendimento Biométrico - Elaboração do Treinamento	CONCLUÍDO	100	23/jan/23	23/jan/23	17/fev/23	17/fev/23		
Retorno do Atendimento Biométrico - Goiânia - ZE 001, 002, 127, 133, 134, 135, 136, 146 e 147	CONCLUÍDO	100	16/jan/23	16/jan/23	01/mar/23	01/mar/23		

Retorno do Atendimento Biométrico - Aparecida de Goiânia - ZE 119, 132 e 145	CONCLUÍDO	100	23/jan/23	23/jan/23	20/mar/23	20/mar/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Anápolis - ZE 003, 141 e 144	CONCLUÍDO	100	30/jan/23	30/jan/23	20/mar/23	20/mar/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Senador Canedo - ZE 040	CONCLUÍDO	100	09/mar/23	09/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Trindade - ZE 049	CONCLUÍDO	100	10/mar/23	10/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Goianira - ZE 101	CONCLUÍDO	100	15/mar/23	15/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Bela Vista de Goiás - ZE 032	CONCLUÍDO	100	16/mar/23	16/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Inhumas - ZE 013	CONCLUÍDO	100	17/mar/23	17/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Guapó - ZE 056	CONCLUÍDO	100	20/mar/23	20/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Formoso - ZE 125	CONCLUÍDO	100	21/mar/23	21/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Firminópolis - ZE 063	CONCLUÍDO	100	10/abr/23	10/abr/23	17/abr/23	17/abr/23

Retorno Atendimento Biométrico - Alexânia - ZE 087	EM ANDAMENTO	10/abr/23	10/abr/23	08/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Novo Gama - ZE004	EM ANDAMENTO	11/abr/23	11/abr/23	08/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - São Luis de Montes Belos - ZE 080	EM ANDAMENTO	11/abr/23	11/abr/23	08/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Valparaíso - ZE 033	EM ANDAMENTO	12/abr/23	12/abr/23	08/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Iporá - ZE 053	EM ANDAMENTO	12/abr/23	12/abr/23	08/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Caiaapônia - ZE 006	EM ANDAMENTO	13/abr/23	13/abr/23	08/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Piranhas - ZE 102	EM ANDAMENTO	14/abr/23	13/abr/23	08/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Aragarças - ZE 035	EM ANDAMENTO	17/abr/23	17/abr/23	08/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Cidade Ocidental - ZE 042	EM ANDAMENTO	18/abr/23	18/abr/23	08/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Jussara - ZE 095	EM ANDAMENTO	18/abr/23	18/abr/23	08/mai/23
Retorno Atendimento	EM ANDAMENTO	19/abr/23	19/abr/23	08/mai/23

Biométrico -
Luziânia - ZE
019

Retorno	EM ANDAMENTO	19/abr/23	19/abr/23	08/mai/23
---------	--------------	-----------	-----------	-----------

Atendimento
Biométrico -
Fazenda
Nova - ZE
079

Retorno	EM ANDAMENTO	20/abr/23	20/abr/23	08/mai/23
---------	--------------	-----------	-----------	-----------

Atendimento
Biométrico -
Cristalina -
ZE 036

Retorno	EM ANDAMENTO	20/abr/23	19/abr/23	08/mai/23
---------	--------------	-----------	-----------	-----------

Atendimento
Biométrico -
Anicuns - ZE
034

Retorno	EM ANDAMENTO	24/abr/23	24/abr/23	08/mai/23
---------	--------------	-----------	-----------	-----------

Atendimento
Biométrico -
Catalão - ZE
008

Retorno	EM ANDAMENTO	24/abr/23	24/abr/23	08/mai/23
---------	--------------	-----------	-----------	-----------

Atendimento
Biométrico -
Edeia - ZE
068

Retorno	EM ANDAMENTO	25/abr/23	25/abr/23	08/mai/23
---------	--------------	-----------	-----------	-----------

Atendimento
Biométrico -
Ipameri - ZE
014

Retorno	EM ANDAMENTO	25/abr/23	25/abr/23	08/mai/23
---------	--------------	-----------	-----------	-----------

Atendimento
Biométrico -
Acreúna - ZE
128

Retorno	EM ANDAMENTO	26/abr/23	26/abr/23	08/mai/23
---------	--------------	-----------	-----------	-----------

Atendimento
Biométrico -
Pires do Rio
- ZE 027

Retorno	EM ANDAMENTO	26/abr/23	26/abr/23	08/mai/23
---------	--------------	-----------	-----------	-----------

Atendimento
Biométrico -
Rio Verde -
ZE 030 e 140

Retorno	EM ANDAMENTO	27/abr/23	26/abr/23	08/mai/23
---------	--------------	-----------	-----------	-----------

Atendimento
Biométrico -
Silvânia - ZE
031

Retorno Atendimento Biométrico - Jataí - ZE 018	EM ANDAMENTO	27/abr/23	27/abr/23	08/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Santo Antônio do Descoberto - ZE 024	EM ANDAMENTO	02/mai/23	02/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Mineiros - ZE 021	EM ANDAMENTO	02/mai/23	03/mai/23	29/mai/23

ATIVIDADES VOTO ELETRÔNICO

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Recolhimento das unas - Eleições 2022	EM ANDAMENTO		12/dez/22	12/dez/22	15/mai/23			CSEL
Manutenção das Urnas	EM ANDAMENTO		13/fev/23	02/mai/23	30/ago/24			CSEL

ENS-02 - Desenvolvimento Seguro de Software

Descrição
Possui o intuito de estabelecer padrões de segurança no desenvolvimento de software.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CESCO	40

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Elaboração da minuta do documento normativo	EM ANDAMENTO						

ENS-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados

Descrição
O gerenciamento de backup e restauração de dados objetiva instituir diretrizes, responsabilidades e competências que visam garantir a segurança, integridade e disponibilidade dos dados custodiados pelo TRE-GO.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	90

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Mapeamento do processo de trabalho	CONCLUÍDO						
Implantação	CONCLUÍDO						
Revisão do normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE	EM ANDAMENTO						

ENS-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades

Descrição
A gestão de vulnerabilidades tem como objetivo prevenir a exploração de vulnerabilidades técnicas na rede corporativa, por meio da aplicação sistemática das seguintes ações de prevenção, identificação, classificação e tratamento:
I - adoção de ações técnicas preventivas conforme norma de Configuração Segura de Ativos de TI vigente;
I - obtenção de informações para identificar vulnerabilidades técnicas em tempo hábil;
II - avaliação de exposição às vulnerabilidades técnicas;
III - adoção de medidas apropriadas e tempestivas para lidar com os riscos identificados.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI, CESCO, CINF	70

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Transferência de conhecimento	CONCLUÍDO						
Implantação	CONCLUÍDO						
Mapeamento do processo de trabalho	EM ANDAMENTO						

ENS-09 - Solução de Cofre de senhas

Descrição
SEI 1975-9
Possui o objetivo de proteger, controlar, gerenciar, auditar e monitorar contas privilegiadas a ativos críticos do TRE-GO. São considerados ativos críticos:
• Equipamentos servidores físicos e virtuais que hospedam todos os sistemas eleitorais, administrativos e judiciais; • Servidores de Banco de Dados; • Servidores de Arquivos Corporativos; • Servidores de Correio Eletrônico; • Equipamentos Firewalls, Balance adores de Carga, Switches de Rede, Proxy, Contas de Serviços, dentre outros.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	90

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Aquisição	CONCLUÍDO						
Instalação e configuração	CONCLUÍDO						
Transferência de conhecimento	CONCLUÍDO						
Disponibilizar em produção	EM ANDAMENTO						

ENS-10 - Solução de Gestão de Patches

Descrição
SEI 7716-3
A Gestão de Patches é fundamental para a proteção dos sistemas informatizados de uma organização. O objetivo principal dos patches é corrigir bugs funcionais e falhas de segurança que são suscetíveis a ataques cibernéticos, ajudando a reduzir o risco de segurança da informação.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	29/mai/21	29/mai/21	19/dez/23		CINF	90

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Aquisição	CONCLUÍDO						
Instalação e configuração	CONCLUÍDO						
Transferência de conhecimento	CONCLUÍDO						
Disponibilizar em produção	EM ANDAMENTO						

ENS-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)

Descrição
SEI 6237-9
Ferramenta que possui a finalidade de prover uma autenticação mais segura dos usuários de sistemas informatizados, por meio da confirmação da identidade do usuário, em dois ou mais momentos, antes de liberar o seu acesso a um determinado sistema.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	90

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Aquisição	CONCLUÍDO						
Instalação e configuração	CONCLUÍDO						
Transferência de conhecimento	CONCLUÍDO						
Disponibilizar em produção	EM ANDAMENTO						

ENS-12 - Solução de Plataforma de conscientização

Descrição

SEI 3619-0

As pessoas são o elo mais fraco quando falamos em segurança cibernética. Costumam ser a porta de entrada para criminosos cibernéticos invadirem a rede, roubarem informações valiosas e causarem grandes prejuízos financeiros e de imagem às instituições. Treinar e conscientizar pessoas é primordial para o fortalecimento da segurança da infraestrutura tecnológica e dos dados pessoais.

A contratação de solução para conscientização em segurança da informação está prevista na Estratégia Nacional de Cibersegurança da Justiça Eleitoral . A estratégia prevê que os servidores e colaboradores devem ser capacitados a fim de reduzir os riscos na área de segurança cibernética. É importante que os funcionários entendam os objetivos da segurança da informação e o impacto potencial, positivo e negativo d seu próprio comportamento na organização.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI, SGP	80

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Aquisição	CONCLUÍDO						
Instalação e configuração	CONCLUÍDO						
Transferência de conhecimento	CONCLUÍDO						
Implantação	EM ANDAMENTO						

Observações

A realização de simulação de phishing necessita da liberação de bloqueios dos e-mails por parte dos servidores do TSE.

ENS-13 - Solução de Segurança do AD

Descrição

O Active Directory (AD) é um banco de dados e um conjunto de serviços que conectam os usuários aos recursos de rede de que precisam para realizar seu trabalho. O banco de dados (ou diretório) contém informações essenciais sobre o seu ambiente, incluindo os usuários com todas as suas informações cadastradas, computadores existentes e quem tem permissão para fazer o quê. Os serviços controlam grande parte da atividade do seu ambiente de TI. Especificamente, eles se certificam de que cada pessoa é quem afirma ser (autenticação), geralmente verificando a ID do usuário e a senha inserida, e permitem que acessem apenas os dados que têm permissão para usar (autorização).

Nos últimos anos, cada vez mais, tem surgido brechas de segurança e implementações não seguras do Active Directory (AD). O AD tornou-se o alvo preferido dos invasores para elevar os privilégios e facilitar o movimento lateral por meio do aproveitamento de falhas e configurações incorretas conhecidas. A maioria das organizações luta com a segurança do Active Directory devido a configurações incorretas que se acumulam à medida que os domínios aumentam em complexidade, impedindo as equipes de segurança de encontrarem e corrigirem falhas antes que se tornem problemas que afetam os negócios. A aquisição de ferramenta para proteção do AD é essencial pois permite que você veja tudo, preveja o que é importante e aja para lidar com os riscos no Active Directory para interromper as vias de ataque antes que os invasores os explorem.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	90

i

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Aquisição	CONCLUÍDO						
Instalação e configuração	CONCLUÍDO						
Transferência de conhecimento	CONCLUÍDO						
Disponibilização em ambiente de produção	EM ANDAMENTO						

ENS-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação

Descrição
Possui a finalidade de estabelecer as diretrizes para o controle de acesso e uso aceitável dos recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal, bem como os direitos e as responsabilidades dos usuários desses recursos.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF, STI	90

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Norma finalizada	CONCLUÍDO						
Revisão do normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE	EM ANDAMENTO						

PTE-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC

Descrição
Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estabelecido no Guia

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		STI	50

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, alinhado ao número de usuários internos e externos de recursos de TIC conforme referencial mínimo estabelecido no Guia	CONCLUÍDO					STI	
Propor a adequação dos recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos da atividade anterior	EM ANDAMENTO					STI	

PTE-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26

Descrição
Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD e encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica.
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	28/jul/23		AGSTI	70

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Elaborar e acompanhar o Plano de Trabalho, conforme critérios da ENTIC	CONCLUÍDO					AGSTI	
Enviar o Plano de Trabalho ao CNJ	CONCLUÍDO					AGSTI	
Mapear e/ou validar processo de publicação e divulgação periódica de planos junto aos repositórios nacional e regional, designando responsáveis	EM ANDAMENTO					AGSTI	

PTE-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC

Descrição
Os projetos de Tecnologia da Informação, deverão passar por análise de riscos de segurança da informação antes de sua implementação.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	50

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Mapeamento do processo de trabalho	EM ANDAMENTO						
Elaborar, revisar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado com o plano institucional de gestão de riscos	NÃO INICIADO						
Transferência de conhecimento	NÃO INICIADO						
Implantação	NÃO INICIADO						

PTE-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO			19/dez/23		CESCO	10

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Análise dos requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	EM ANDAMENTO						
Elaborar / Revisar processo de aquisição/desenvolvimento de software, conforme a ENTIC-JUD.	EM ANDAMENTO					CESCO	

PTE-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.

Descrição
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		CESCO, CINF	20

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	EM ANDAMENTO					CESCO	

PTE-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020

Descrição
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		CESCO	10

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Participar de curso oferecido pelo CNJ	CONCLUÍDO					CESCO	
Adequar os padrões de desenvolvimento e a arquitetura de sistemas do Tribunal aos padrões estabelecidos na Res. 335/2020 (PDPI), justificando a adoção de arquiteturas alternativas, se for o caso	EM ANDAMENTO					CESCO	

PTE-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		CESCO	10

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Definir modelos de contrato de aquisição e de desenvolvimento de software em que constem cláusula que determine o depósito da documentação dos sistemas, além dos requisitos de direitos autorais etc	EM ANDAMENTO					CESCO	

Observações

Será elaborado um normativo que oriente a inclusão da cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas.

PTE-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33

Descrição
ENTIC-JUD: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706
Art. 33. Os sistemas de informação deverão atender a padrões de interoperabilidade e outros que venham a ser recomendados pelo Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.
Parágrafo único. Os novos sistemas de informação deverão atender aos seguintes requisitos:
I – ser portáteis e interoperáveis;
II – ser disponíveis para dispositivos móveis e responsivos;
III – possuir documentação atualizada;
IV – oferecer suporte para assinatura baseado em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil);
V – atender ao Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), do Governo Federal.
VI – recomenda-se o uso de sistemas de informação já desenvolvidos, disseminados e experimentados no âmbito do Poder Judiciário.
VII – recomenda-se o uso do Repositório Nacional para disseminação de boas práticas e compartilhamento de soluções colaborativas de TIC.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		CESCO	50

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Reformular ou readequar o processo de desenvolvimento de software	NÃO INICIADO					CESCO	20

PTE-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

Descrição

SEI nº:

Objetivo da demanda:

Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.

Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

A falta catalogação dos ativos de TI, tanto *hardware* quanto *software*, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataques cibernéticos de qualquer natureza.

Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Gestão de TI e apoio à Governança

Desenvolvimento e administração de soluções de TIC

Gestão de infraestrutura de TIC

Suporte técnico das soluções de TIC

Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

1. Visibilidade de todo o parque de *hardware* do Tribunal.
2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional.
3. Visibilidade de todos os *softwares* em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.

Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados

Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados.

Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026

Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):

Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?

Não

Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:

Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):

Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em *Software* Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		AGSTI	60

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Mapeamento do processo de trabalho	CONCLUÍDO						
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Aquisição da solução	CONCLUÍDO						
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	EM ANDAMENTO					CESCO, CINF, CSEL	
Instalação e configuração da solução	EM ANDAMENTO						
Transferência de conhecimento	EM ANDAMENTO						
Implantação	EM ANDAMENTO						
Estabelecer rotina de, regularmente, avaliar o parque, inventariar ativos, auditar e tratar não conformidades relativas aos registros dos ativos no CMDB, abrangendo hardwares, softwares, links etc.	NÃO INICIADO						

PTE-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente

Descrição

SEI nº:

Objetivo da demanda:

Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.

Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

A falta catalogação dos ativos de TI, tanto *hardware* quanto *software*, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataque cibernéticos de qualquer natureza.

Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Gestão de TI e apoio à Governança

Desenvolvimento e administração de soluções de TIC

Gestão de infraestrutura de TIC

Suporte técnico das soluções de TIC

Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

1. Visibilidade de todo o parque de *hardware* do Tribunal.
2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional.
3. Visibilidade de todos os *softwares* em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.

Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados

Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados.

Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026

Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):

Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?

Não

Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:

Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):

Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em *Software* Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		AGSTI	10

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Análise dos modelos de governança de serviços de TIC existentes	CONCLUÍDO						
Implementar/Avaliar processos de gerenciamento de serviços que impactem a satisfação dos usuários	EM ANDAMENTO					AGSTI	
Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções	EM ANDAMENTO						
Implementar as soluções prioritizadas	EM ANDAMENTO						
