



Tribunal Regional Eleitoral de Goiás  
Secretaria de Tecnologia da Informação

## Reunião CTGTI - 03/2023

### 1. Identificação

<b>Data da reunião:</b> 9 de mai. de 2023	<b>Início:</b> 14:15h <b>Término:</b> 15:26h	<b>Local:</b> Sala de reunião da STI
<b>Objetivo da reunião:</b> Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022		

### 2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

### 3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.


### 4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?


### 5. Participantes da reunião

Nome	Unidade	email
Frank Wendell Ribeiro	STI	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	AGSTI	paulo.taira@tre-go.jus.br
Augusto César de Castro Ovelar	CESCO	Augusto.overlar@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	CSEL	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Marcílio Zaccarelli Bersaneti	CINF	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br

## 6. Portfólio de projetos

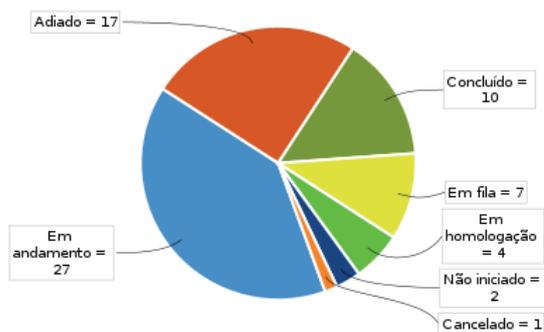

Total: 68 . Gráfico por: Status

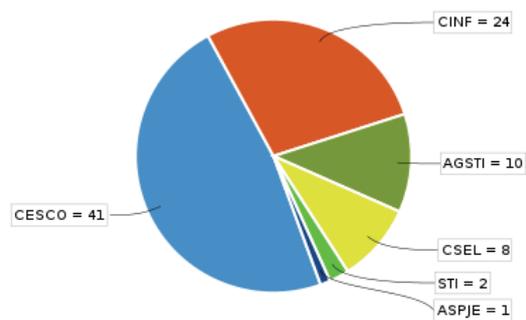

Total: 68 . Gráfico por: Unidade responsável

### 6.1. Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	EM ANDAMENTO	90	CESCO
PDI-22-R1-02 - Implantação do RDC ARQ	EM ANDAMENTO	20	CESCO
PDI-22-R1-06 - Implantar o Sistema de Gerenciamento de Propaganda Partidária Gratuita (SisAntena)	EM ANDAMENTO	20	CESCO
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	EM ANDAMENTO	10	CESCO
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC	EM ANDAMENTO	10	CESCO
PDI-22-R1-12 - Implantação de ferramenta automatizada de comunicação externa e prestação de serviços aos clientes cidadãos da Justiça Eleitoral em Goiás.	EM ANDAMENTO	50	CESCO
PDI-22-R1-14 - Eleições da Comunidade	EM ANDAMENTO	20	CSEL
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	EM ANDAMENTO	20	CESCO
PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI	EM ANDAMENTO	80	CESCO
PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015	EM ANDAMENTO	50	CINF, CSEL
PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (Acordo de colaboração TJ)	EM ANDAMENTO	50	CINF
PDI-22-R1-31 - Suporte às Eleições 2024	EM ANDAMENTO	10	AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL
PDI-22-R1-N-32 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023	EM ANDAMENTO	10	CSEL
PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede cabeada e sem fio	EM ANDAMENTO	10	CINF
PDI-22-R1-N-34 - Reaparelhamento dos serviços de impressão	EM ANDAMENTO		CINF
PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (SISCONS)	EM ANDAMENTO	30	CESCO, CSEL
PDI-22-R1-N-37 - Manutenção preventiva de urnas	EM ANDAMENTO		CSEL
PDI-22-R1-N-38 - Implantação do serviço VoIP	EM ANDAMENTO		CINF

## 6.2. Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	EM ANDAMENTO	70	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	EM ANDAMENTO	90	CINF
ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização	EM ANDAMENTO	80	AGSTI

## 6.3. Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC	EM ANDAMENTO	80	STI
PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26	EM ANDAMENTO	70	AGSTI
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	EM ANDAMENTO	50	AGSTI
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	EM ANDAMENTO	50	AGSTI
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	EM ANDAMENTO	60	AGSTI
PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente	EM ANDAMENTO	10	AGSTI

# 7. Anotações

## 7.1 - Projetos do Plano de Demandas Internas (PDI)

### Considerações/sugestões CESCO

- Apresentará na próxima reunião, os projetos que estão efetivamente em andamento.
- Incluir nas pautas das próximas reuniões a análise dos projetos que estão na situação Adiado.

### Considerações/sugestões CINF

- Incluir no PDTIC o projeto: Implantação do serviço VoIP.

## 7.2 - Projetos do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE)

### Considerações/sugestões CESCO

Tendo em vista o comprometimento da equipe com os projetos do PDI a CESCO solicitou o **adiamento** dos seguintes projetos:

- PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD;
- PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020;
- PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33;
- PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020;
- PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas.

### 7.3 - Projetos da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ)

#### Considerações/sugestões CINF

Tendo em vista o comprometimento da equipe com atividades solicitadas pela Diretoria Geral, a CINF solicitou o **adiamento** os seguintes projetos:

- ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados;
- ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas;
- ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches;
- ENS-22-R1-13 - Solução de Segurança do AD;
- ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação.

#### Considerações/sugestões CESCO

Tendo em vista o comprometimento da equipe com os projetos do PDI a CESCO solicitou o **adiamento** do projeto:

- ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software.

# PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições

## Descrição

Desenvolvimento (Finalização) de Sistema de Substituição de Servidores, que envolve o processo indicação e designação de servidores para ocupação

de Funções de Confiança (FC) e Cargos Comissionados (CJ), por prazo determinado ou indeterminado.

Visa automatizar o processo de indicação e deferimento de substituições de cargos de direção, chefia e assessoramento no Tribunal

**Meta:** Automação do processo de indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança e Cargos Comissionados até setembro/2022.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	27/abr/22	27/abr/22	30/jun/23		CESCO	90

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	EM ANDAMENTO						
Realização de testes pela unidade demandante	EM ANDAMENTO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

# PDI-22-R1-02 - Implantação do RDC ARQ

## Descrição

Para fins de preservação digital, os órgãos do Poder Judiciário adotarão repositório arquivístico digital confiável (RDC-Arq), desenvolvido como software livre, gratuito e de código aberto, projetado para manter os dados em padrões de preservação digital e o acesso em longo prazo.

<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3376>

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução% ↕
EM ANDAMENTO	06/mai/21	06/mai/21	31/jul/23		CESCO	20

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Etapa 2023	EM ANDAMENTO						
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	EM ANDAMENTO						
Realização de testes pela unidade demandante	NÃO INICIADO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

## Observações

Aguardando retorno do TRE-TO sobre a disponibilização das máquinas virtuais, desta forma, as etapas de teste e homologação que estavam em andamento retornaram para a situação Não iniciado.

# PDI-22-R1-06 - Implantar o Sistema de Gerenciamento de Propaganda Partidária Gratuita (SisAntena)

## Descrição

A SJD solicitou a implantação do sistema SisAntena ao invés do Sistema de Pautas de Julgamento que foi atendido por consulta realizada pela ASPJE.

Solicitação de modificação do projeto pela SJD no SEI nº22.0.000018920-4 (doc. id nº 0466213)

SEI que contém a solicitação de implantação do sistema por parte da SJD: 23.0.000001525-3

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	27/fev/23	27/fev/23	30/jun/23		CESCO	20

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	EM ANDAMENTO						
Realização de testes pela unidade demandante	EM ANDAMENTO						
Homologação do produto	EM ANDAMENTO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

## Observações

Aguardando a disponibilização dos pacotes pelo TRE-DF. A área de negócio do TRE-DF pediu algumas alterações que estão sendo feitas pela equipe de TI daquele Regional.

# PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores

## Descrição

**SEI:** 22.0.000008626-0

### Objetivo da demanda:

Desenvolver formulário pré preenchido de recadastramento de servidores, visando agilizar e otimizar o processo de revisão do cadastro de servidores.

### Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

Facilitar o processo de solicitação de alteração de dados cadastrais pelos servidores, com a permissão de alteração de dados livres e possibilidade de solicitação de alteração de dados que exigem comprovação, com a anexação de documentos.

### Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Macroprocesso de apoio: Gestão de Pessoas / Processo: Gestão do quadro de pessoal

### Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

Facilidade e celeridade da execução do processo de recadastramento de servidores, tanto para o servidor quanto para a unidade responsável.

### Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

8 - Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas.

### Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):

Disponibilização de formulário eletrônico pré-preenchido com os dados dos servidores, com opção de solicitação de alteração, anexação de documentos e possibilidade de deferimento pela unidade responsável, com gravação automática no SGRH.

### Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?

Não

### Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:

Não se aplica

### Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):

Não se aplica

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	27/fev/23	27/fev/23	30/set/23		CESCO	10

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	EM ANDAMENTO						
Criação e configuração do ambiente de testes	NÃO INICIADO						
Realização de testes pela	NÃO INICIADO						

unidade demandante

---

Homologação do produto

NÃO INICIADO

---

Disponibilização em  
ambiente de produção

---

NÃO INICIADO

---

---

### Observações

---

Aguardando SGP enviar a relação de informações que serão recadastradas

---

# PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC

## Descrição

Promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	29/abr/22	29/abr/22	19/dez/23		CESCO	10

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	NÃO INICIADO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						
Implementação das funcionalidades	NÃO INICIADO						
Levantamento de requisitos da nova versão	NÃO INICIADO						

## Observações

Equipe finalizando solicitações no Siapex

# PDI-22-R1-12 - Implantação de ferramenta automatizada de comunicação externa e prestação de serviços aos clientes cidadãos da Justiça Eleitoral em Goiás

## Descrição

Aperfeiçoar a comunicação externa e a prestação de serviços aos clientes da Justiça Eleitoral, por meio de ferramenta que integre o uso de redes sociais (WhatsApp, Telegram, Facebook e Instagram).

SEI nº 5925-8

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	10/dez/21	10/dez/21	22/mai/23		CESCO	50

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	NÃO INICIADO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						
Implementação das funcionalidades	NÃO INICIADO						
Levantamento de requisitos da nova versão	NÃO INICIADO						

## Observações

- Realizado o treinamento do perfil Supervisor, em 27/04/23
- Previsão de realização do treinamento para o perfil Atendente, na semana 02 à 12/05
- O término previsto foi alterado de 31/03 para 22/05/2023 em razão da mudança da tecnologia da central telefônica.

## PDI-14 - Eleições da Comunidade

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	29/abr/22	29/abr/22	15/abr/24		CSEL	20

### ETAPAS

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Sindicato dos Trabalhadores dos Correios – SINTECT/GO	CANCELADO	10	11/nov/22	14/nov/22	17/fev/23	13/dez/22		
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás - COSEMS/GO	CANCELADO	10	16/jan/23	16/jan/23	13/mar/23	09/fev/23		
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC	CANCELADO	10	16/jan/23	16/jan/23	01/mai/23	28/fev/23		
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES	CANCELADO	10	18/jan/23	18/jan/23	12/mai/23	09/mar/23		
Eleitor do Futuro - Colégio Espaço Pedagógico Educacional - Grêmio Estudantil	CONCLUÍDO	100	01/fev/23	01/fev/23	27/fev/23	27/fev/23		
Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás - COOTEGO	CONCLUÍDO	100	10/fev/23	10/fev/23	14/mar/23	10/mar/23		
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023 - CMDCA 2023	EM ANDAMENTO	10	06/fev/23		06/out/23			

## PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO			30/jun/23		CESCO	20

### ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	EM ANDAMENTO						
Realização de testes pela unidade demandante	NÃO INICIADO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

### Observações

- adequando tema para responsivo
- <http://orion3.tre-go.jus.br/cms/wordpress/>

# PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI

## Descrição

SEI nº: 21.0.000005057-9 (principal) e 21.0.000005046-3

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO			30/jun/23		CESCO	80

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	EM ANDAMENTO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

## Observações

Em testes na SJD <https://sei4-teste.tre-go.jus.br/sei/>

Adaptar manual

# PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015

## Descrição

SEI nº 22.0.000015982-8

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/fev/23	01/fev/23	26/jun/23		CINF, CSEL	50

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Instalação dos kits biométricos	EM ANDAMENTO	01/fev/23	01/fev/23	13/jun/23			40
Treinamento dos operadores	EM ANDAMENTO						
Comunicar à CRE a relação das Zonas que estão aptas para iniciar o atendimento	EM ANDAMENTO						

## PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (17 postos do TJ)

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO			31/mar/24		CINF	50

### ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Preparação de ambiente seguro e desenvolvimento de template	CONCLUÍDO					CINF	
Rio Quente	EM ANDAMENTO						
Portelândia	EM ANDAMENTO						
Distrito Jardim ABC	EM ANDAMENTO						
Caldazinha	EM ANDAMENTO						
Perolândia	EM ANDAMENTO						
São Miguel do Passa Quatro	EM ANDAMENTO						

# PDI-22-R1-31 - Suporte às Eleições 2024

## Descrição

Suporte técnico prestado pela STI nas atividades relacionadas às Eleições Municipais de 2024.

Situação	Execução%	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável
EM ANDAMENTO	10	09/jan/23	09/jan/23	19/dez/24		AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL

## MACROATIVIDADES

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Voto Eletrônico	EM ANDAMENTO							
Cadastro Eleitoral	EM ANDAMENTO	20						

## ATIVIDADES CADASTRO ELEITORAL

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Atendimento Biométrico - Elaboração do Treinamento	CONCLUÍDO	100	23/jan/23	23/jan/23	17/fev/23	17/fev/23		
Retorno do Atendimento Biométrico - Goiânia - ZE 001, 002, 127, 133, 134, 135, 136, 146 e 147	CONCLUÍDO	100	16/jan/23	16/jan/23	01/mar/23	01/mar/23		
Retorno do Atendimento Biométrico - Aparecida de Goiânia - ZE 119, 132 e 145	CONCLUÍDO	100	23/jan/23	23/jan/23	20/mar/23	20/mar/23		
Retorno do Atendimento Biométrico - Anápolis - ZE 003, 141 e 144	CONCLUÍDO	100	30/jan/23	30/jan/23	20/mar/23	20/mar/23		

Retorno do Atendimento Biométrico - Senador Canedo - ZE 040	CONCLUÍDO	100	09/mar/23	09/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Trindade - ZE 049	CONCLUÍDO	100	10/mar/23	10/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Goianira - ZE 101	CONCLUÍDO	100	15/mar/23	15/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Bela Vista de Goiás - ZE 032	CONCLUÍDO	100	16/mar/23	16/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Inhumas - ZE 013	CONCLUÍDO	100	17/mar/23	17/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Guapó - ZE 056	CONCLUÍDO	100	20/mar/23	20/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Formoso - ZE 125	CONCLUÍDO	100	21/mar/23	21/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Firminópolis - ZE 063	CONCLUÍDO	100	10/abr/23	10/abr/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Alexânia - ZE 087	EM ANDAMENTO	80	10/abr/23	10/abr/23	15/mai/23	
Retorno do Atendimento Biométrico - Novo Gama - ZE004	EM ANDAMENTO	80	11/abr/23	11/abr/23	15/mai/23	
Retorno do Atendimento Biométrico - São Luis de Montes Belos - ZE 080	EM ANDAMENTO	80	11/abr/23	11/abr/23	08/mai/23	
Retorno do Atendimento Biométrico - Valparaíso - ZE 033	EM ANDAMENTO	80	12/abr/23	12/abr/23	15/mai/23	
Retorno do Atendimento Biométrico - Iporá - ZE 053	EM ANDAMENTO	80	12/abr/23	12/abr/23	15/mai/23	

Retorno Atendimento Biométrico - Caiaipônia - ZE 006	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	13/abr/23	13/abr/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Piranhas - ZE 102	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	14/abr/23	13/abr/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Aragarças - ZE 035	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	17/abr/23	17/abr/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Cidade Occidental - ZE 042	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	18/abr/23	18/abr/23	08/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Jussara - ZE 095	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	18/abr/23	18/abr/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Luziânia - ZE 019	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	19/abr/23	19/abr/23	08/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Fazenda Nova - ZE 079	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	19/abr/23	19/abr/23	08/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Cristalina - ZE 036	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	20/abr/23	20/abr/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Anicuns - ZE 034	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	20/abr/23	19/abr/23	08/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Catalão - ZE 008	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	24/abr/23	24/abr/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Edeia - ZE 068	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	24/abr/23	24/abr/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Ipameri - ZE 014	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	25/abr/23	25/abr/23	08/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Acreúna - ZE 128	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	25/abr/23	25/abr/23	15/mai/23
Retorno Atendimento	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	26/abr/23	26/abr/23	15/mai/23

Biométrico - Pires  
do Rio - ZE 027

Retorno **EM ANDAMENTO** 80 26/abr/23 26/abr/23 08/mai/23

Atendimento  
Biométrico - Rio  
Verde - ZE 030 e 140

Retorno **EM ANDAMENTO** 80 27/abr/23 26/abr/23 15/mai/23

Atendimento  
Biométrico - Silvânia  
- ZE 031

Retorno **EM ANDAMENTO** 80 27/abr/23 27/abr/23 08/mai/23

Atendimento  
Biométrico - Jataí -  
ZE 018

Retorno **EM ANDAMENTO** 80 02/mai/23 02/mai/23 29/mai/23

Atendimento  
Biométrico - Santo  
Antônio do  
Descoberto - ZE 024

Retorno **EM ANDAMENTO** 80 02/mai/23 02/mai/23 29/mai/23

Atendimento  
Biométrico -  
Mineiros - ZE 021

Retorno **EM ANDAMENTO** 80 03/mai/23 03/mai/23 29/mai/23

Atendimento  
Biométrico -  
Planaltina - ZE 044

Retorno **EM ANDAMENTO** 80 03/mai/23 03/mai/23 29/mai/23

Atendimento  
Biométrico - Caçu -  
ZE 106

Retorno **EM ANDAMENTO** 80 04/mai/23 04/mai/23 29/mai/23

Atendimento  
Biométrico -  
Formosa - ZE 011

Retorno **EM ANDAMENTO** 80 04/mai/23 04/mai/23 29/mai/23

Atendimento  
Biométrico - Itajá -  
ZE 096

Retorno **EM ANDAMENTO** 80 05/mai/23 05/mai/23 29/mai/23

Atendimento  
Biométrico -  
Alvorada do Norte -  
ZE 123

Retorno **EM ANDAMENTO** 80 05/mai/23 04/mai/23 29/mai/23

Atendimento  
Biométrico -  
Cachoeira Alta - ZE  
097

Retorno **EM ANDAMENTO** 80 08/mai/23 08/mai/23 29/mai/23

Atendimento  
Biométrico - Posse -  
ZE 029

Retorno **EM ANDAMENTO** 80 08/mai/23 08/mai/23 29/mai/23

Atendimento  
Biométrico -

Quirinópolis - ZE  
046

---

Retorno Atendimento Biométrico - São Domingos - ZE 047	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	09/mai/23	09/mai/23	29/mai/23
---	---------------------	----	-----------	-----------	-----------

---

Retorno Atendimento Biométrico - Santa Helena - ZE 066	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	09/mai/23	09/mai/23	29/mai/23
---	---------------------	----	-----------	-----------	-----------

---

Retorno Atendimento Biométrico - Paraúna - ZE 043	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	10/mai/23	09/mai/23	29/mai/23
--	---------------------	----	-----------	-----------	-----------

---

**i** ATIVIDADES VOTO ELETRÔNICO

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Recolhimento das urnas - Eleições 2022	<b>EM ANDAMENTO</b>		12/dez/22	12/dez/22	15/mai/23			CSEL
Manutenção das Urnas	<b>EM ANDAMENTO</b>		13/fev/23	02/mai/23	30/ago/24			CSEL

---

# PDI-22-R1-N-32 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023

Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável
EM ANDAMENTO	10	06/fev/23	06/fev/23	06/out/23		CSEL

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Reunião Inicial com os representantes dos Conselhos Tutelares	CONCLUÍDO	100	09/fev/23	09/fev/23	09/fev/23	09/fev/23		
Elaboração do Questionário para os Conselhos Tutelares	CONCLUÍDO	100	09/fev/23	09/fev/23	17/fev/23	14/fev/23		
Elaboração da Resolução com calendário das principais Etapas	CONCLUÍDO	100	09/fev/23	09/fev/23	28/fev/23	24/fev/23		
Tramitação e Publicação da Resolução com calendário das principais Etapas	EM ANDAMENTO		24/fev/23	24/fev/23	14/mar/23			
Reunião com os Conselhos Tutelares - Orientações Gerais	CONCLUÍDO	100	15/mar/23	15/mar/23	15/mar/23	15/mar/23		
Elaboração da página das Eleições dos Conselhos Tutelares na Internet	EM ANDAMENTO		16/mar/23	16/mar/23	24/mar/23			
Elaboração do Fluxo do Processo (Recebimento do Pedido até a Totalização dos Resultados)	CONCLUÍDO	100	20/mar/23	20/mar/23	31/mar/23	30/mar/23		
Reunião para elaboração do Sistema de ComuniCANDEX	CONCLUÍDO	100	03/abr/23	03/abr/23	03/abr/23	03/abr/23		
Desenvolvimento do Sistema de ComuniCANDEX	EM ANDAMENTO		10/abr/23	10/abr/23	30/jun/23			

# PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede cabeada e sem fio

## Descrição

SEI nº 23.0.000003147-0

Aquisição de Solução de rede cabeada (LAN e TOR) e sem fio (Wi-fi) com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	28/fev/23	28/fev/23	30/set/23		CINF	10

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Elaboração do DOD.	CONCLUÍDO						
Elaboração do ETP.	EM ANDAMENTO						
Elaboração do TR.	NÃO INICIADO						
Processo de licitação.	NÃO INICIADO						
Execução da ARP.	NÃO INICIADO						
Implementação da solução.	NÃO INICIADO						

## PDI-22-R1-N-34 - Reaparelhamento dos serviços de impressão

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO					CINF	

## PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (SISCONS)

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	03/abr/23	03/abr/23	31/jul/23		CESCO, CSEL	30

## PDI-22-R1-N-37 - Manutenção preventiva de urnas

Situação	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	13/fev/23	02/mai/23	30/ago/24			

### ATIVIDADES

Situação	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Equipe	Execução%
CANCELADO	13/fev/23		28/abr/23		SEVIN	
EM ANDAMENTO	01/mai/23	03/mai/23	31/ago/23		SEVIN	
NÃO INICIADO	01/set/23		19/dez/23		SEVIN	
NÃO INICIADO	08/jan/24		30/abr/24		SEVIN	
NÃO INICIADO	01/mai/24		30/ago/24		SEVIN	

## PDI-22-R1-N-38 - Implantação do serviço VoIP

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO					CINF	

## ENS-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades

### Descrição

A gestão de vulnerabilidades tem como objetivo prevenir a exploração de vulnerabilidades técnicas na rede corporativa, por meio da aplicação sistemática das seguintes ações de prevenção, identificação, classificação e tratamento:

I - adoção de ações técnicas preventivas conforme norma de Configuração Segura de Ativos de TI vigente;

I - obtenção de informações para identificar vulnerabilidades técnicas em tempo hábil;

II - avaliação de exposição às vulnerabilidades técnicas;

III - adoção de medidas apropriadas e tempestivas para lidar com os riscos identificados.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
<b>EM ANDAMENTO</b>	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI, CESCO, CINF	70

### ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	<b>CONCLUÍDO</b>						
Elaboração da minuta do documento normativo	<b>CONCLUÍDO</b>						
Transferência de conhecimento	<b>CONCLUÍDO</b>						
Implantação	<b>CONCLUÍDO</b>						
Mapeamento do processo de trabalho	<b>EM ANDAMENTO</b>						

# ENS-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)

## Descrição

### SEI 6237-9

Ferramenta que possui a finalidade de prover uma autenticação mais segura dos usuários de sistemas informatizados, por meio da confirmação da identidade do usuário, em dois ou mais momentos, antes de liberar o seu acesso a um determinado sistema.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	90

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Aquisição	CONCLUÍDO						
Instalação e configuração	CONCLUÍDO						
Transferência de conhecimento	CONCLUÍDO						
Disponibilizar em produção	EM ANDAMENTO						

## ENS-12 - Solução de Plataforma de conscientização

### Descrição

#### SEI 3619-0

As pessoas são o elo mais fraco quando falamos em segurança cibernética. Costumam ser a porta de entrada para criminosos cibernéticos invadirem a rede, roubarem informações valiosas e causarem grandes prejuízos financeiros e de imagem às instituições. Treinar e conscientizar pessoas é primordial para o fortalecimento da segurança da infraestrutura tecnológica e dos dados pessoais.

A contratação de solução para conscientização em segurança da informação está prevista na Estratégia Nacional de Cibersegurança da Justiça Eleitoral. A estratégia prevê que os servidores e colaboradores devem ser capacitados a fim de reduzir os riscos na área de segurança cibernética. É importante que os funcionários entendam os objetivos da segurança da informação e o impacto potencial, positivo e negativo de seu próprio comportamento na organização.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	80

### ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Aquisição	CONCLUÍDO						
Instalação e configuração	CONCLUÍDO						
Transferência de conhecimento	CONCLUÍDO						
Implantação	EM ANDAMENTO						

### Observações

A realização de simulação de phishing necessita da liberação de bloqueios dos e-mails por parte dos servidores do TSE.

## PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC

### Descrição

Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estabelecido no Guia

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		STI	80

### ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, alinhado ao número de usuários internos e externos de recursos de TIC conforme referencial mínimo estabelecido no Guia	CONCLUÍDO					STI	
Propor a adequação dos recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos da atividade anterior	EM ANDAMENTO					STI	

## PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26

### Descrição ▾

Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD e encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica.

<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706>

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	28/jul/23		AGSTI	70

### ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Elaborar e acompanhar o Plano de Trabalho, conforme critérios da ENTIC	CONCLUÍDO					AGSTI	
Enviar o Plano de Trabalho ao CNJ	CONCLUÍDO					AGSTI	
Mapear e/ou validar processo de publicação e divulgação periódica de planos junto aos repositórios nacional e regional, designando responsáveis	EM ANDAMENTO					AGSTI	

# PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC

## Descrição

Definir processos de continuidade de serviços de TI, em caso de eventos de causas naturais, acidentais, tecnológicas ou humanas.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	50

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Estabelecer Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papeis e responsabilidades	EM ANDAMENTO						
Estabelecer o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC	EM ANDAMENTO						
Transferência de conhecimento	NÃO INICIADO						
Testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC	NÃO INICIADO						

## PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC

### Descrição

Os projetos de Tecnologia da Informação, deverão passar por análise de riscos de segurança da informação antes de sua implementação.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	50

### ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Mapeamento do processo de trabalho	EM ANDAMENTO						
Elaborar, revisar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado com o plano institucional de gestão de riscos	NÃO INICIADO						
Transferência de conhecimento	NÃO INICIADO						
Implantação	NÃO INICIADO						

# PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

## Descrição

SEI nº:

### Objetivo da demanda:

Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.

### Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

A falta catalogação dos ativos de TI, tanto *hardware* quanto *software*, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataque cibernéticos de qualquer natureza.

### Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Gestão de TI e apoio à Governança

Desenvolvimento e administração de soluções de TIC

Gestão de infraestrutura de TIC

Suporte técnico das soluções de TIC

### Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

1. Visibilidade de todo o parque de *hardware* do Tribunal.
2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional.
3. Visibilidade de todos os *softwares* em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.

### Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados

Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados.

Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026

### Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):

#### Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?

Não

#### Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:

#### Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):

Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em *Software* Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		AGSTI	60

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Mapeamento do processo de trabalho	CONCLUÍDO						
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Aquisição da solução	CONCLUÍDO						
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	EM ANDAMENTO					CESCO, CINF, CSEL	
Instalação e configuração da solução	EM ANDAMENTO						
Transferência de conhecimento	EM ANDAMENTO						
Implantação	EM ANDAMENTO						
Estabelecer rotina de, regularmente, avaliar o parque, inventariar ativos, auditar e tratar não conformidades relativas aos registros dos ativos no CMDB, abrangendo hardwares, softwares, links etc.	NÃO INICIADO						

# PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente

## Descrição

SEI nº:

### Objetivo da demanda:

Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.

### Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

A falta catalogação dos ativos de TI, tanto *hardware* quanto *software*, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataques cibernéticos de qualquer natureza.

### Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Gestão de TI e apoio à Governança

Desenvolvimento e administração de soluções de TIC

Gestão de infraestrutura de TIC

Suporte técnico das soluções de TIC

### Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

1. Visibilidade de todo o parque de *hardware* do Tribunal.
2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional.
3. Visibilidade de todos os *softwares* em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.

### Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados

Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados.

Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026

### Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):

#### Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?

Não

#### Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:

#### Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):

Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em *Software* Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		AGSTI	10

**i** ATIVIDADES

<b>Resumo</b>	<b>Situação</b>	<b>Início Previsto</b>	<b>Início Real</b>	<b>Término Previsto</b>	<b>Término Real</b>	<b>Unidade Responsável</b>	<b>Execução%</b>
Análise dos modelos de governança de serviços de TIC existentes	CONCLUÍDO						
Implementar/Avaliar processos de gerenciamento de serviços que impactem a satisfação dos usuários	EM ANDAMENTO					AGSTI	
Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções	EM ANDAMENTO						
Implementar as soluções priorizadas	EM ANDAMENTO						
