



Tribunal Regional Eleitoral de Goiás  
Secretaria de Tecnologia da Informação

## Reunião CTGTI - 04/2023

### 1. Identificação

<b>Data da reunião:</b> 16 de mai. de 2023	<b>Início:</b> 14:10h <b>Término:</b> 15:40h	<b>Local:</b> Sala de reunião da STI
<b>Objetivo da reunião:</b> Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022		

### 2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

### 3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.



### 4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados.

### 5. Participantes da reunião

Nome	Unidade	email
Frank Wendell Ribeiro	STI	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	AGSTI	paulo.taira@tre-go.jus.br
Augusto César de Castro Ovelar	CESCO	Augusto.overlar@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	CSEL	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Marcílio Zaccarelli Bersaneti	CINF	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br

## 6. Portfólio de projetos

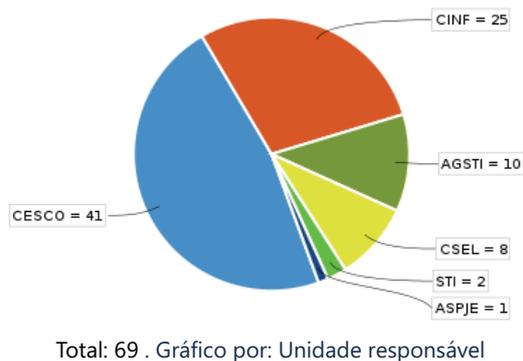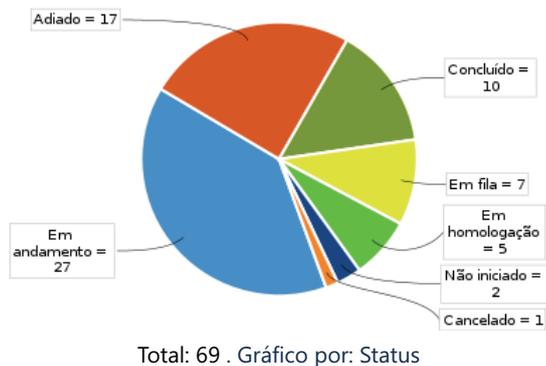

### 6.1. Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	EM ANDAMENTO	90	CESCO
PDI-22-R1-02 - Implantação do RDC ARQ	EM ANDAMENTO	30	CESCO
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	EM ANDAMENTO	10	CESCO
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC	EM ANDAMENTO	10	CESCO
PDI-22-R1-12 - Implantação de ferramenta automatizada de comunicação externa e prestação de serviços aos clientes cidadãos da Justiça Eleitoral em Goiás.	EM ANDAMENTO	90	CESCO
PDI-22-R1-14 - Eleições da Comunidade	EM ANDAMENTO	20	CSEL
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	EM ANDAMENTO	20	CESCO
PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI	EM ANDAMENTO	80	CESCO
PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015	EM ANDAMENTO	50	CINF, CSEL
PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (Acordo de colaboração TJ)	EM ANDAMENTO	50	CINF
PDI-22-R1-31 - Suporte às Eleições 2024	EM ANDAMENTO	10	AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL
PDI-22-R1-N-32 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023	EM ANDAMENTO	10	CSEL
PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede cabeada e sem fio	EM ANDAMENTO	10	CINF
PDI-22-R1-N-34 - Reparelhamento dos serviços de impressão	EM ANDAMENTO	30	CINF
PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (SISCONS)	EM ANDAMENTO	30	CESCO, CSEL
PDI-22-R1-N-37 - Manutenção preventiva de urnas	EM ANDAMENTO	10	CSEL
PDI-22-R1-N-38 - Adequação da rede para o serviço VOIP	EM ANDAMENTO	30	CINF
PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante	EM ANDAMENTO	70	CINF

## 6.2. Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches	EM ANDAMENTO	90	CINF
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	EM ANDAMENTO	90	CINF
ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização	EM ANDAMENTO	80	AGSTI

## 6.3. Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC	EM ANDAMENTO	80	STI
PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26	EM ANDAMENTO	70	AGSTI
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	EM ANDAMENTO	50	AGSTI
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	EM ANDAMENTO	50	AGSTI
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	EM ANDAMENTO	60	AGSTI
PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente	EM ANDAMENTO	10	AGSTI

## 6.4. Projetos adiados e não iniciados

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	ADIADO	40	CESCO, CINF
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	ADIADO	40	CESCO
ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados	ADIADO	90	CINF
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	ADIADO	70	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	ADIADO	40	CINF
ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	ADIADO	40	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	ADIADO	40	CINF
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	ADIADO	90	CINF
ENS-22-R1-13 - Solução de Segurança do AD	ADIADO	90	CINF
ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF	ADIADO	20	CINF
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	ADIADO	90	CINF, STI

ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	ADIADO	40	CESCO, CINF
PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	ADIADO	10	CESCO
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	ADIADO	20	CESCO, CINF
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	ADIADO	10	CESCO
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	ADIADO	10	CESCO
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	ADIADO	50	CESCO
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	NÃO INICIADO		CESCO
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	NÃO INICIADO		CESCO, CINF

## 7. Anotações

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas;
- O projeto ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches que estava adiado teve a sua execução retomada;
- O projeto ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades teve a situação alterada para "Adiado", em razão de ter sido priorizado os projetos de Gestão de Ativos e de Continuidade de Serviços de TI.

# PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições

## Descrição

Desenvolvimento (Finalização) de Sistema de Substituição de Servidores, que envolve o processo indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança (FC) e Cargos Comissionados (CJ), por prazo determinado ou indeterminado.

Visa automatizar o processo de indicação e deferimento de substituições de cargos de direção, chefia e assessoramento no Tribunal

**Meta:** Automação do processo de indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança e Cargos Comissionados até setembro/2022.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	27/abr/22	27/abr/22	30/jun/23		CESCO	90

## ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	CONCLUÍDO						
Homologação do produto	EM ANDAMENTO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

## Observações

### Impedimentos:

- Configuração do novo servidor apps;
- Tratamento das vulnerabilidades detectadas pelo Tenable;
- Adequação das aplicações para o domínio JUS;
- Instalação do SISANTENA.

# PDI-22-R1-02 - Implantação do RDC ARQ

## Descrição

Para fins de preservação digital, os órgãos do Poder Judiciário adotarão repositório arquivístico digital confiável (RDC-Arq), desenvolvido como software livre, gratuito e de código aberto, projetado para manter os dados em padrões de preservação digital e o acesso em longo prazo.

<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3376>

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	06/mai/21	06/mai/21	31/jul/23		CESCO	30

## ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Etapa 2023	EM ANDAMENTO						
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	EM ANDAMENTO						
Realização de testes pela unidade demandante	NÃO INICIADO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

## Observações

Consultar o TRE-TO, para tratar do problema de integração entre o ATOM e Archivematica

# PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores

## Descrição

SEI: 22.0.000008626-0

### Objetivo da demanda:

Desenvolver formulário pré preenchido de recadastramento de servidores, visando agilizar e otimizar o processo de revisão do cadastro de servidores.

### Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

Facilitar o processo de solicitação de alteração de dados cadastrais pelos servidores, com a permissão de alteração de dados livres e possibilidade de solicitação de alteração de dados que exigem comprovação, com a anexação de documentos.

### Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Macroprocesso de apoio: Gestão de Pessoas / Processo: Gestão do quadro de pessoal

### Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

Facilidade e celeridade da execução do processo de recadastramento de servidores, tanto para o servidor quanto para a unidade responsável.

### Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

8 - Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas.

### Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):

Disponibilização de formulário eletrônico pré-preenchido com os dados dos servidores, com opção de solicitação de alteração, anexação de documentos e possibilidade de deferimento pela unidade responsável, com gravação automática no SGRH.

### Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?

Não

### Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:

Não se aplica

### Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):

Não se aplica

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	27/fev/23	27/fev/23	30/set/23		CESCO	10

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	EM ANDAMENTO						
Criação e configuração do ambiente de testes	NÃO INICIADO						
Realização de testes pela	NÃO INICIADO						

unidade demandante

---

Homologação do produto

NÃO INICIADO

---

Disponibilização em  
ambiente de produção

---

NÃO INICIADO

---

---

### Observações

---

Aguardando SGP enviar a relação de informações que serão recadastradas

---

# PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC

## Descrição

Promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	29/abr/22	29/abr/22	19/dez/23		CESCO	10

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	NÃO INICIADO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						
Implementação das funcionalidades	NÃO INICIADO						
Levantamento de requisitos da nova versão	NÃO INICIADO						

## Observações

Equipe finalizando solicitações no Siapex

# PDI-22-R1-12 - Implantação de ferramenta automatizada de comunicação externa e prestação de serviços aos clientes cidadãos da Justiça Eleitoral em Goiás

## Descrição

Aperfeiçoar a comunicação externa e a prestação de serviços aos clientes da Justiça Eleitoral, por meio de ferramenta que integre o uso de redes sociais (WhatsApp, Telegram, Facebook e Instagram).

SEI nº 5925-8

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	10/dez/21	10/dez/21	22/mai/23		CESCO	90

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	NÃO INICIADO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						
Implementação das funcionalidades	NÃO INICIADO						
Levantamento de requisitos da nova versão	NÃO INICIADO						

## Observações

- Realizado o treinamento do perfil Supervisor, em 27/04/23
- Previsão de realização do treinamento para o perfil Atendente, na semana 02 à 12/05
- O término previsto foi alterado de 31/03 para 22/05/2023 em razão da mudança da tecnologia da central telefônica.

## PDI-14 - Eleições da Comunidade

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	29/abr/22	29/abr/22	15/abr/24		CSEL	20

### ETAPAS

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Sindicato dos Trabalhadores dos Correios – SINTECT/GO	CANCELADO	10	11/nov/22	14/nov/22	17/fev/23	13/dez/22		
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás - COSEMS/GO	CANCELADO	10	16/jan/23	16/jan/23	13/mar/23	09/fev/23		
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC	CANCELADO	10	16/jan/23	16/jan/23	01/mai/23	28/fev/23		
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES	CANCELADO	10	18/jan/23	18/jan/23	12/mai/23	09/mar/23		
Eleitor do Futuro - Colégio Espaço Pedagógico Educacional - Grêmio Estudantil	CONCLUÍDO	100	01/fev/23	01/fev/23	27/fev/23	27/fev/23		
Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás - COOTEGO	CONCLUÍDO	100	10/fev/23	10/fev/23	14/mar/23	10/mar/23		
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023 - CMDCA 2023	EM ANDAMENTO	10	06/fev/23		06/out/23			

## PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO			30/jun/23		CESCO	20

### ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	EM ANDAMENTO						
Realização de testes pela unidade demandante	EM ANDAMENTO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

### Observações

- adequando tema para responsivo
- <http://orion3.tre-go.jus.br/cms/wordpress/>

## PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI

### Descrição

SEI nº: 21.0.000005057-9 (principal) e 21.0.000005046-3

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO			30/jun/23		CESCO	80

### ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	EM ANDAMENTO						
Validação do MFA (CISCO-DUO) no sistema	NÃO INICIADO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

### Observações

Em testes na SJD <https://sei4-teste.tre-go.jus.br/sei/>

Adaptar manual

## PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015

### Descrição

SEI nº 22.0.000015982-8

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/fev/23	01/fev/23	26/jun/23		CINF, CSEL	50

### ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Instalação dos kits biométricos	EM ANDAMENTO	01/fev/23	01/fev/23	13/jun/23			40
Treinamento dos operadores	EM ANDAMENTO						
Comunicar à CRE a relação das Zonas que estão aptas para iniciar o atendimento	EM ANDAMENTO						

## PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (17 postos do TJ)

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO			31/mar/24		CINF	50

### ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Preparação de ambiente seguro e desenvolvimento de template	CONCLUÍDO					CINF	
Rio Quente	EM ANDAMENTO						
Portelândia	EM ANDAMENTO						
Distrito Jardim ABC	EM ANDAMENTO						
Caldazinha	EM ANDAMENTO						
Perolândia	EM ANDAMENTO						
São Miguel do Passa Quatro	EM ANDAMENTO						
Faina	EM ANDAMENTO	17/mai/23	17/mai/23	23/mai/23		CINF	10
Aporé	EM ANDAMENTO	17/mai/23	17/mai/23				10

## PDI-22-R1-31 - Suporte às Eleições 2024

### Descrição

Suporte técnico prestado pela STI nas atividades relacionadas às Eleições Municipais de 2024.

Situação	Execução%	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável
EM ANDAMENTO	10	09/jan/23	09/jan/23	19/dez/24		AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL

### MACROATIVIDADES

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Voto Eletrônico	EM ANDAMENTO							
Cadastro Eleitoral	EM ANDAMENTO	40	23/jan/23	23/jan/23				

### ATIVIDADES CADASTRO ELEITORAL

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Atendimento Biométrico - Elaboração do Treinamento	CONCLUÍDO	100	23/jan/23	23/jan/23	17/fev/23	17/fev/23		
Retorno do Atendimento Biométrico - Goiânia - ZE 001, 002, 127, 133, 134, 135, 136, 146 e 147	CONCLUÍDO	100	16/jan/23	16/jan/23	01/mar/23	01/mar/23		
Retorno do Atendimento Biométrico -	CONCLUÍDO	100	23/jan/23	23/jan/23	20/mar/23	20/mar/23		

Aparecida de Goiânia - ZE 119, 132 e 145						
Retorno do Atendimento Biométrico - Anápolis - ZE 003, 141 e 144	CONCLUÍDO	100	30/jan/23	30/jan/23	20/mar/23	20/mar/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Senador Canedo - ZE 040	CONCLUÍDO	100	09/mar/23	09/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Trindade - ZE 049	CONCLUÍDO	100	10/mar/23	10/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Goianira - ZE 101	CONCLUÍDO	100	15/mar/23	15/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Bela Vista de Goiás - ZE 032	CONCLUÍDO	100	16/mar/23	16/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Inhumas - ZE 013	CONCLUÍDO	100	17/mar/23	17/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Guapó - ZE 056	CONCLUÍDO	100	20/mar/23	20/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Formoso - ZE 125	CONCLUÍDO	100	21/mar/23	21/mar/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico - Firminópolis - ZE 063	CONCLUÍDO	100	10/abr/23	10/abr/23	17/abr/23	17/abr/23
Retorno do Atendimento Biométrico -	CONCLUÍDO	100	10/abr/23	10/abr/23	15/mai/23	15/mai/23

Alexânia - ZE  
087

Retorno Atendimento Biométrico - Novo Gama - ZE004	CONCLUÍDO	100	11/abr/23	11/abr/23	15/mai/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Valparaíso - ZE 033	CONCLUÍDO	100	12/abr/23	12/abr/23	15/mai/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Iporá - ZE 053	CONCLUÍDO	100	12/abr/23	12/abr/23	15/mai/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Caiaipônia - ZE 006	CONCLUÍDO	100	13/abr/23	13/abr/23	15/mai/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Piranhas - ZE 102	CONCLUÍDO	100	14/abr/23	13/abr/23	15/mai/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Aragarças - ZE 035	CONCLUÍDO	100	17/abr/23	17/abr/23	15/mai/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Jussara - ZE 095	CONCLUÍDO	100	18/abr/23	18/abr/23	15/mai/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Cristalina - ZE 036	CONCLUÍDO	100	20/abr/23	20/abr/23	15/mai/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Catalão - ZE 008	CONCLUÍDO	100	24/abr/23	24/abr/23	15/mai/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Edeia - ZE 068	CONCLUÍDO	100	24/abr/23	24/abr/23	15/mai/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico -	CONCLUÍDO	100	25/abr/23	25/abr/23	15/mai/23	15/mai/23

Acreúna - ZE  
128

Retorno Atendimento Biométrico - Pires do Rio - ZE 027	<b>CONCLUÍDO</b>	100	26/abr/23	26/abr/23	15/mai/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Silvânia - ZE 031	<b>CONCLUÍDO</b>	100	27/abr/23	26/abr/23	15/mai/23	15/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - São Luis de Montes Belos - ZE 080	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	11/abr/23	11/abr/23	08/mai/23	
Retorno Atendimento Biométrico - Cidade Ocidental - ZE 042	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	18/abr/23	18/abr/23	08/mai/23	
Retorno Atendimento Biométrico - Luziânia - ZE 019	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	19/abr/23	19/abr/23	08/mai/23	
Retorno Atendimento Biométrico - Fazenda Nova - ZE 079	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	19/abr/23	19/abr/23	08/mai/23	
Retorno Atendimento Biométrico - Anicuns - ZE 034	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	20/abr/23	19/abr/23	08/mai/23	
Retorno Atendimento Biométrico - Ipameri - ZE 014	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	25/abr/23	25/abr/23	08/mai/23	
Retorno Atendimento Biométrico - Rio Verde - ZE 030 e 140	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	26/abr/23	26/abr/23	08/mai/23	
Retorno Atendimento Biométrico -	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	27/abr/23	27/abr/23	08/mai/23	

Jataí - ZE  
018

Retorno Atendimento Biométrico - Santo Antônio do Descoberto - ZE 024	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	02/mai/23	02/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Mineiros - ZE 021	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	02/mai/23	02/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Planaltina - ZE 044	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	03/mai/23	03/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Caçu - ZE 106	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	03/mai/23	03/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Formosa - ZE 011	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	04/mai/23	04/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Itajá - ZE 096	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	04/mai/23	04/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Alvorada do Norte - ZE 123	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	05/mai/23	05/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Cachoeira Alta - ZE 097	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	05/mai/23	04/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Posse - ZE 029	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	08/mai/23	08/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Quirinópolis - ZE 046	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	08/mai/23	08/mai/23	29/mai/23

Retorno Atendimento Biométrico - São Domingos - ZE 047	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	09/mai/23	09/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Santa Helena - ZE 066	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	09/mai/23	09/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Campos Belos - ZE 105	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	10/mai/23	10/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Paraúna - ZE 043	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	10/mai/23	09/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Cavalcante - ZE 099	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	11/mai/23	10/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Palmeiras de Goiás - ZE 020	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	11/mai/23	10/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Alto Paraíso - ZE 143	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	15/mai/23	15/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Jaraguá - ZE 017	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	15/mai/23	15/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Padre Bernardo - ZE 131	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	16/mai/23	16/mai/23	29/mai/23
Retorno Atendimento Biométrico - Goianésia - ZE 074	<b>EM ANDAMENTO</b>	80	16/mai/23	16/mai/23	29/mai/23

 ATIVIDADES VOTO ELETRÔNICO

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Recolhimento das urnas - Eleições 2022	CONCLUÍDO	100	12/dez/22	12/dez/22	15/mai/23	12/mai/23		CSEL
Manutenção das Urnas	EM ANDAMENTO	10	13/fev/23	02/mai/23	30/ago/24			CSEL

# PDI-22-R1-N-32 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023

Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável
EM ANDAMENTO	10	06/fev/23	06/fev/23	06/out/23		CSEL

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Reunião Inicial com os representantes dos Conselhos Tutelares	CONCLUÍDO	100	09/fev/23	09/fev/23	09/fev/23	09/fev/23		
Elaboração do Questionário para os Conselhos Tutelares	CONCLUÍDO	100	09/fev/23	09/fev/23	17/fev/23	14/fev/23		
Elaboração da Resolução com calendário das principais Etapas	CONCLUÍDO	100	09/fev/23	09/fev/23	28/fev/23	24/fev/23		
Tramitação e Publicação da Resolução com calendário das principais Etapas	CONCLUÍDO		24/fev/23	24/fev/23	14/mar/23			
Reunião com os Conselhos Tutelares - Orientações Gerais	CONCLUÍDO	100	15/mar/23	15/mar/23	15/mar/23	15/mar/23		
Elaboração da página das Eleições dos Conselhos Tutelares na Internet	CONCLUÍDO		16/mar/23	16/mar/23	24/mar/23			
Elaboração do Fluxo do Processo (Recebimento do Pedido até a Totalização dos Resultados)	CONCLUÍDO	100	20/mar/23	20/mar/23	31/mar/23	30/mar/23		
Reunião para elaboração do Sistema de ComuniCANDEX	CONCLUÍDO	100	03/abr/23	03/abr/23	03/abr/23	03/abr/23		
Desenvolvimento do Sistema de EleCons	EM ANDAMENTO		10/abr/23	10/abr/23	30/jun/23			

# PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede cabeada e sem fio

## Descrição

SEI nº 23.0.000003147-0

Aquisição de Solução de rede cabeada (LAN e TOR) e sem fio (Wi-fi) com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral.

Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	28/fev/23	28/fev/23	30/set/23		CINF	10

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Elaboração do DOD.	CONCLUÍDO	20/fev/23	20/fev/23	28/fev/23	28/fev/23	CINF	100
Elaboração do ETP.	EM ANDAMENTO	20/mar/23	20/mar/23	19/mai/23		CINF	80
Elaboração do TR.	NÃO INICIADO						
Processo de licitação.	NÃO INICIADO						
Execução da ARP.	NÃO INICIADO						
Implementação da solução.	NÃO INICIADO						

## Observações

Em análise dos documentos pela equipe de planejamento da contratação desde o dia 09/05/2023.

## PDI-22-R1-N-34 - Reaparelhamento dos serviços de impressão

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO					CINF	30

### ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Elaboração do TR.	EM ANDAMENTO						
Implantação da solução.	NÃO INICIADO						
Execução da ARP.	NÃO INICIADO						
Processo de licitação.	NÃO INICIADO						
Elaboração do ETP.	CONCLUÍDO						
Elaboração do DOD.	CONCLUÍDO						

# PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (SISCONS)

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	03/abr/23	03/abr/23	31/jul/23		CESCO, CSEL	30

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Primeira etapa de cadastro dos Conselhos, informações para configuração dos sistemas e definição dos locais de votação concluída.	CONCLUÍDO						
Desenvolvimento da funcionalidade de agregação	EM ANDAMENTO						

## PDI-22-R1-N-37 - Manutenção preventiva de urnas

Situação	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	13/fev/23	02/mai/23	30/ago/24			10

### ATIVIDADES

Resumo	Situação	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Equipe	Execução%
Realização do 1º Run In 2023	CANCELADO	13/fev/23		28/abr/23		SEVIN	
Realização do 2º Run In 2024	NÃO INICIADO	01/mai/24		30/ago/24		SEVIN	
Realização do 1º Run In 2024	NÃO INICIADO	08/jan/24		30/abr/24		SEVIN	
Realização do 3º Run In 2023	NÃO INICIADO	01/set/23		19/dez/23		SEVIN	
Realização do 2º Run In 2023	EM ANDAMENTO	01/mai/23	03/mai/23	31/ago/23		SEVIN	10

## PDI-22-R1-N-38 - Adequação da rede para o serviço VOIP

### Descrição

Projeto tem como objetivo modernizar a Central Telefônica e acoplar a solução VoIP.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO					CINF	30

### ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Equipe	Execução%
Configurar os firewalls/switches para as conexões entre os telefones IP e a Central telefônica.	CONCLUÍDO	03/mai/23	03/mai/23	02/jun/23		CINF	SESRE	30
Configurar Firewall, as VLans de acesso nos switches e o serviço de DHCP no Anexo II.	CONCLUÍDO	03/mai/23	03/mai/23	05/mai/23	05/mai/23	CINF	SESRE	100
Configurar Firewall, VLans de acesso nos switches e o serviço de DHCP no prédio Ialba.	NÃO INICIADO	05/jun/23				CINF	SESRE	
Configurar Firewall, as VLans de acesso nos switches e o serviço de DHCP no cartório de Ap. de Gyn.	EM ANDAMENTO	08/mai/23	08/mai/23	31/mai/23		CINF	SESRE	70
Configurar Firewall, Vlan de acesso nos switches e o serviço de DHCP nos cartórios do interior.	EM ANDAMENTO	08/mai/23	08/mai/23	16/jun/23		CINF	SESRE	20

### Observações

Alterado o nome do projeto de Implantação do serviço VOIP, para Adequação da rede para o serviço VOIP.

## PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante

### Descrição

Projeto de instalação de links internet dedicados redundantes nos Cartórios Eleitorais.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO					CINF	70

### ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Equipe	Execução%
Processo de contratação.	CONCLUÍDO							
Preparação da infraestrutura de rede.	CONCLUÍDO							
Reunião de planejamento da implantação.	CONCLUÍDO							
Implantação dos links nos cartórios eleitorais.	EM ANDAMENTO							

## ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches

### Descrição

#### SEI 7716-3

A Gestão de Patches é fundamental para a proteção dos sistemas informatizados de uma organização. O objetivo principal dos patches é corrigir bugs funcionais e falhas de segurança que são suscetíveis a ataques cibernéticos, ajudando a reduzir o risco de segurança da informação.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	29/mai/21	29/mai/21	19/dez/23		CINF	90

### ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Aquisição	CONCLUÍDO						
Instalação e configuração	CONCLUÍDO						
Transferência de conhecimento	CONCLUÍDO						
Disponibilizar em produção	EM ANDAMENTO	16/mai/23	16/mai/23	02/jun/23		CINF	10

# ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)

## Descrição

### SEI 6237-9

Ferramenta que possui a finalidade de prover uma autenticação mais segura dos usuários de sistemas informatizados, por meio da confirmação da identidade do usuário, em dois ou mais momentos, antes de liberar o seu acesso a um determinado sistema.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	90

## ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Aquisição	CONCLUÍDO						
Instalação e configuração	CONCLUÍDO						
Transferência de conhecimento	CONCLUÍDO						
Disponibilizar em produção	EM ANDAMENTO						

## Impedimentos

- Aguardando a definição da configuração do CISCO-DUO para utilização na nova versão do sistema SEI.
- Priorização dos projetos: PDI-22-R1-N-38 - Adequação da rede para o serviço VOIP e PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (Acordo de colaboração TJ).

## ENS-12 - Solução de Plataforma de conscientização

### Descrição

#### SEI 3619-0

As pessoas são o elo mais fraco quando falamos em segurança cibernética. Costumam ser a porta de entrada para criminosos cibernéticos invadirem a rede, roubarem informações valiosas e causarem grandes prejuízos financeiros e de imagem às instituições. Treinar e conscientizar pessoas é primordial para o fortalecimento da segurança da infraestrutura tecnológica e dos dados pessoais.

A contratação de solução para conscientização em segurança da informação está prevista na Estratégia Nacional de Cibersegurança da Justiça Eleitoral. A estratégia prevê que os servidores e colaboradores devem ser capacitados a fim de reduzir os riscos na área de segurança cibernética. É importante que os funcionários entendam os objetivos da segurança da informação e o impacto potencial, positivo e negativo de seu próprio comportamento na organização.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	80

### ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Aquisição	CONCLUÍDO						
Instalação e configuração	CONCLUÍDO						
Transferência de conhecimento	CONCLUÍDO						
Implantação	EM ANDAMENTO						

### Observações

A realização de simulação de phishing necessita da liberação de bloqueios dos e-mails por parte dos servidores do TSE.

## PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC

### Descrição

Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estabelecido no Guia

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		STI	80

### ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, alinhado ao número de usuários internos e externos de recursos de TIC conforme referencial mínimo estabelecido no Guia	CONCLUÍDO					STI	
Propor a adequação dos recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos da atividade anterior	EM ANDAMENTO					STI	

## PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26

### Descrição ▾

Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD e encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica.

<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706>

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	28/jul/23		AGSTI	70

### ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Elaborar e acompanhar o Plano de Trabalho, conforme critérios da ENTIC	CONCLUÍDO					AGSTI	
Enviar o Plano de Trabalho ao CNJ	CONCLUÍDO					AGSTI	
Mapear e/ou validar processo de publicação e divulgação periódica de planos junto aos repositórios nacional e regional, designando responsáveis	EM ANDAMENTO					AGSTI	

# PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC

## Descrição

Definir processos de continuidade de serviços de TI, em caso de eventos de causas naturais, acidentais, tecnológicas ou humanas.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	50

## ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Estabelecer Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papeis e responsabilidades	EM ANDAMENTO						
Estabelecer o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC	EM ANDAMENTO						
Transferência de conhecimento	NÃO INICIADO						
Testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC	NÃO INICIADO						

## PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC

### Descrição

Os projetos de Tecnologia da Informação, deverão passar por análise de riscos de segurança da informação antes de sua implementação.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	50

### ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Mapeamento do processo de trabalho	EM ANDAMENTO						
Elaborar, revisar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado com o plano institucional de gestão de riscos	EM ANDAMENTO						
Transferência de conhecimento	NÃO INICIADO						
Implantação	NÃO INICIADO						

# PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

## Descrição

### SEI nº:

#### Objetivo da demanda:

Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.

#### Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

A falta catalogação dos ativos de TI, tanto *hardware* quanto *software*, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataques cibernéticos de qualquer natureza.

#### Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Gestão de TI e apoio à Governança

Desenvolvimento e administração de soluções de TIC

Gestão de infraestrutura de TIC

Suporte técnico das soluções de TIC

#### Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

1. Visibilidade de todo o parque de *hardware* do Tribunal.
2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional.
3. Visibilidade de todos os *softwares* em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.

#### Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados

Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados.

Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026

#### Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):

#### Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?

Não

#### Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:

#### Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):

Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em *Software* Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		AGSTI	60

**i** ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Mapeamento do processo de trabalho	CONCLUÍDO						
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Aquisição da solução	CONCLUÍDO						
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	EM ANDAMENTO					CESCO, CINF, CSEL	
Instalação e configuração da solução	EM ANDAMENTO						
Transferência de conhecimento	EM ANDAMENTO						
Implantação	NÃO INICIADO						
Estabelecer rotina de, regularmente, avaliar o parque, inventariar ativos, auditar e tratar não conformidades relativas aos registros dos ativos no CMDB, abrangendo hardwares, softwares, links etc.	NÃO INICIADO						

## PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		AGSTI	10

### ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Análise dos modelos de governança de serviços de TIC existentes	CONCLUÍDO						
Implementar/Avaliar processos de gerenciamento de serviços que impactem a satisfação dos usuários	EM ANDAMENTO					AGSTI	
Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções	ADIADO						
Implementar as soluções priorizadas	ADIADO						
