



Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
Secretaria de Tecnologia da Informação

Reunião CTGTI - 06/2023

1. Identificação

Data da reunião: 30 de mai. de 2023	Início: 14:20h Término: 15:24h	Local: Sala de reunião da STI
Objetivo da reunião: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.



4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados.

5. Participantes da reunião

Nome	Unidade	email
Paulo Sérgio Taira	AGSTI	paulo.taira@tre-go.jus.br
Augusto César de Castro Ovelar	CESCO	Augusto.overlar@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	CSEL	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Marcílio Zaccarelli Bersaneti	CINF	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br

6. Portfólio de projetos

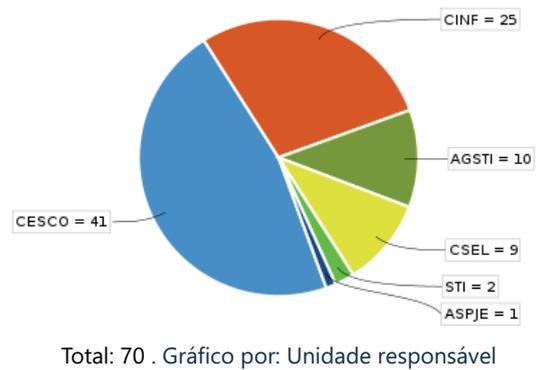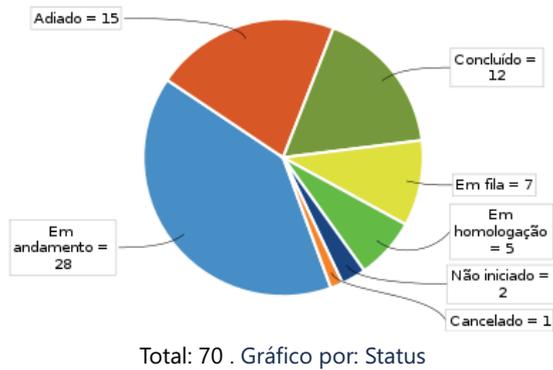

6.1. Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	EM ANDAMENTO	90	CESCO
PDI-22-R1-02 - Implantação do RDC ARQ	EM ANDAMENTO	40	CESCO
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	EM ANDAMENTO	10	CESCO
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC	EM ANDAMENTO	10	CESCO
PDI-22-R1-14 - Eleições da Comunidade	EM ANDAMENTO	20	CSEL
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	EM ANDAMENTO	30	CESCO
PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI	EM ANDAMENTO	80	CESCO
PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015	EM ANDAMENTO	80	CINF, CSEL
PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (Acordo de colaboração TJ)	EM ANDAMENTO	50	CINF
PDI-22-R1-31 - Suporte às Eleições 2024	EM ANDAMENTO	10	AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL
PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023	EM ANDAMENTO	20	CSEL
PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede cabeada e sem fio	EM ANDAMENTO	30	CINF
PDI-22-R1-N-34 - Reparelhamento dos serviços de impressão	EM ANDAMENTO	40	CINF
PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (SISCONS)	EM ANDAMENTO	30	CESCO, CSEL
PDI-22-R1-N-37 - Manutenção preventiva de urnas	EM ANDAMENTO	10	CSEL
PDI-22-R1-N-38 - Adequação da rede para o serviço VOIP	EM ANDAMENTO	50	CINF
PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante	EM ANDAMENTO	70	CINF

6.2. Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	EM ANDAMENTO	40	CESCO
ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	EM ANDAMENTO	40	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches	EM ANDAMENTO	90	CINF
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	EM ANDAMENTO	90	CINF
ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização	EM ANDAMENTO	80	AGSTI

6.3. Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
PTE-22-R1-06 - Compôr o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC	EM ANDAMENTO	80	STI
PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26	EM ANDAMENTO	70	AGSTI
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	EM ANDAMENTO	50	AGSTI
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	EM ANDAMENTO	50	AGSTI
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	EM ANDAMENTO	60	AGSTI
PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente	EM ANDAMENTO	10	AGSTI

7. Anotações

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas;
- O projeto ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software, teve o seu andamento retomado;
- O projeto ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação teve o seu andamento retomado;
- Foi incluído no portfólio, o projeto PDI-22-R1-N-40 - Eleição da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás - CIPA executado no período de 10 à 31/05/2023.

PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições

Descrição

Desenvolvimento (Finalização) de Sistema de Substituição de Servidores, que envolve o processo indicação e designação de servidores para ocupação

de Funções de Confiança (FC) e Cargos Comissionados (CJ), por prazo determinado ou indeterminado.

Visa automatizar o processo de indicação e deferimento de substituições de cargos de direção, chefia e assessoramento no Tribunal

Meta: Automação do processo de indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança e Cargos Comissionados até setembro/2022.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	27/abr/22	27/abr/22	30/jun/23		CESCO	90

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	CONCLUÍDO						
Homologação do produto	EM ANDAMENTO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

Observações

Impedimentos:

- Configuração do novo servidor apps;
- Tratamento das vulnerabilidades detectadas pelo Tenable;
- Adequação das aplicações para o domínio JUS.

PDI-22-R1-02 - Implantação do RDC ARQ

Descrição

Para fins de preservação digital, os órgãos do Poder Judiciário adotarão repositório arquivístico digital confiável (RDC-Arq), desenvolvido como software livre, gratuito e de código aberto, projetado para manter os dados em padrões de preservação digital e o acesso em longo prazo.

<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3376>

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	06/mai/21	06/mai/21	31/jul/23		CESCO	40

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Etapa 2023	EM ANDAMENTO						
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	EM ANDAMENTO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

Observações

Conclusão da integração entre o ATOM e Archivematica

PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores

Descrição

SEI: 22.0.000008626-0

Objetivo da demanda:

Desenvolver formulário pré preenchido de recadastramento de servidores, visando agilizar e otimizar o processo de revisão do cadastro de servidores.

Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

Facilitar o processo de solicitação de alteração de dados cadastrais pelos servidores, com a permissão de alteração de dados livres e possibilidade de solicitação de alteração de dados que exigem comprovação, com a anexação de documentos.

Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Macroprocesso de apoio: Gestão de Pessoas / Processo: Gestão do quadro de pessoal

Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

Facilidade e celeridade da execução do processo de recadastramento de servidores, tanto para o servidor quanto para a unidade responsável.

Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

8 - Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas.

Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):

Disponibilização de formulário eletrônico pré-preenchido com os dados dos servidores, com opção de solicitação de alteração, anexação de documentos e possibilidade de deferimento pela unidade responsável, com gravação automática no SGRH.

Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?

Não

Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:

Não se aplica

Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):

Não se aplica

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	27/fev/23	27/fev/23	30/set/23		CESCO	10

ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	EM ANDAMENTO						
Criação e configuração do ambiente de testes	NÃO INICIADO						
Realização de testes pela	NÃO INICIADO						

unidade demandante

Homologação do produto

NÃO INICIADO

Disponibilização em
ambiente de produção

NÃO INICIADO

Observações

Aguardando SGP enviar a relação de informações que serão recadastradas

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC

Descrição

Promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	29/abr/22	29/abr/22	19/dez/23		CESCO	10

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	NÃO INICIADO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						
Implementação das funcionalidades	NÃO INICIADO						
Levantamento de requisitos da nova versão	NÃO INICIADO						

Observações

Retornando as atividades após a conclusão das solicitações no Siapex

PDI-22-R1-14 - Eleições da Comunidade

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	29/abr/22	29/abr/22	15/abr/24		CSEL	20

ETAPAS

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Sindicato dos Trabalhadores dos Correios – SINTECT/GO	CANCELADO	10	11/nov/22	14/nov/22	17/fev/23	13/dez/22		
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás - COSEMS/GO	CANCELADO	10	16/jan/23	16/jan/23	13/mar/23	09/fev/23		
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC	CANCELADO	10	16/jan/23	16/jan/23	01/mai/23	28/fev/23		
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES	CANCELADO	10	18/jan/23	18/jan/23	12/mai/23	09/mar/23		
Eleitor do Futuro - Colégio Espaço Pedagógico Educacional - Grêmio Estudantil	CONCLUÍDO	100	01/fev/23	01/fev/23	27/fev/23	27/fev/23		
Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás - COOTEGO	CONCLUÍDO	100	10/fev/23	10/fev/23	14/mar/23	10/mar/23		
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás - CIPA	CONCLUÍDO	100	10/mai/23	10/mai/23	31/mai/23	31/mai/23		
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023 - CMDCA 2023	EM ANDAMENTO	30	06/fev/23	06/fev/23	06/out/23		CSEL	

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO			30/jun/23		CESCO	30

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	EM ANDAMENTO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

Observações

- Será realizada apresentação para as unidades
- Adequação para tema responsivo concluída
- <http://wp.tre-go.jus.br/>

PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI

Descrição

SEI nº: 21.0.000005057-9 (principal) e 21.0.000005046-3

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO			30/jun/23		CESCO	80

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	EM ANDAMENTO						
Validação do MFA (CISCO-DUO) no sistema	NÃO INICIADO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

Observações

Em testes na SJD <https://sei4-teste.tre-go.jus.br/sei/>

Adaptar manual

PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015

Descrição							
SEI nº 22.0.000015982-8							
Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%	
EM ANDAMENTO	01/fev/23	01/fev/23	26/jun/23		CINF, CSEL	80	
i ETAPAS							
Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Instalação dos kits biométricos	EM ANDAMENTO	01/fev/23	01/fev/23	13/jun/23			40
Treinamento dos operadores	EM ANDAMENTO						
Comunicar à CRE a relação das Zonas que estão aptas para iniciar o atendimento	EM ANDAMENTO						

PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (17 postos do TJ)

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO			31/mar/24		CINF	50

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Preparação de ambiente seguro e desenvolvimento de template	CONCLUÍDO						100
Distrito Jardim ABC	CONCLUÍDO						100
Rio Quente	CONCLUÍDO						100
Portelândia	EM ANDAMENTO						
Caldazinha	EM ANDAMENTO						
Perolândia	EM ANDAMENTO						
São Miguel do Passa Quatro	EM ANDAMENTO						
Faina	EM ANDAMENTO	17/mai/23	17/mai/23	23/mai/23			
Aporé	EM ANDAMENTO	17/mai/23	17/mai/23				

PDI-22-R1-31 - Suporte às Eleições 2024

Descrição

Suporte técnico prestado pela STI nas atividades relacionadas às Eleições Municipais de 2024.

Situação	Execução%	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável
EM ANDAMENTO	10	09/jan/23	09/jan/23	19/dez/24		AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL

MACROATIVIDADES

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Voto Eletrônico	EM ANDAMENTO	20						
Cadastro Eleitoral	EM ANDAMENTO	50	23/jan/23	23/jan/23				

ATIVIDADES CADASTRO ELEITORAL

Resumo	Situação
Retorno Atendimento Biométrico - Caçu - ZE 106	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Formosa - ZE 011	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Alvorada do Norte - ZE 123	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Posse - ZE 029	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - São Domingos - ZE 047	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Santa Helena de Goiás - ZE 066	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Paraúna - ZE 043	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Cavalcante - ZE 099	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Padre Bernardo - ZE 131	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Goianésia - ZE 074	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Águas Lindas de Goiás - ZE 028	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Pirenópolis - ZE 026	CONCLUÍDO

Retorno Atendimento Biométrico - Uruaçu - ZE 050	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Formoso - ZE 125	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Silvânia - ZE 031	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Pires do Rio - ZE 027	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Catalão - ZE 008	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Cristalina - ZE 036	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Valparaíso - ZE 033	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Novo Gama - ZE004	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Alexânia - ZE 087	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Acreúna - ZE 128	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Edeia - ZE 068	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Jussara - ZE 095	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Aragarças - ZE 035	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Piranhas - ZE 102	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Caiapônia - ZE 006	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Iporá - ZE 053	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Firminópolis - ZE 063	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Formoso - ZE 125	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Guapó - ZE 056	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Inhumas - ZE 013	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Bela Vista de Goiás - ZE 032	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Goianira - ZE 101	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Trindade - ZE 049	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Senador Canedo - ZE 040	CONCLUÍDO
Atendimento Biométrico - Elaboração do Treinamento	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Aparecida de Goiânia - ZE 119, 132 e 145	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Anápolis - ZE 003, 141 e 144	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Goiânia - ZE 001, 002, 127, 133, 134, 135, 136, 146 e 147	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Nerópolis - ZE 054	NÃO INICIADO
Retorno Atendimento Biométrico - Itumbiara - ZE 016	NÃO INICIADO
Retorno Atendimento Biométrico - Bom Jesus - ZE 124	NÃO INICIADO
Retorno Atendimento Biométrico - Crixás - ZE 085	NÃO INICIADO
Retorno Atendimento Biométrico - Pontalina - ZE 045	NÃO INICIADO
Retorno Atendimento Biométrico - Itapaci - ZE 039	NÃO INICIADO
Retorno Atendimento Biométrico - Ceres - ZE 072	NÃO INICIADO
Retorno Atendimento Biométrico - Itauçu - ZE 057	NÃO INICIADO
Retorno Atendimento Biométrico - Rubiataba - ZE 076	NÃO INICIADO

Retorno Atendimento Biométrico - Itaberaí - ZE 015	NÃO INICIADO
Retorno Atendimento Biométrico - Mozarlândia - ZE 110	NÃO INICIADO
Retorno Atendimento Biométrico - Itapuranga - ZE 077	NÃO INICIADO
Retorno Atendimento Biométrico - São Miguel do Araguaia - ZE 094	NÃO INICIADO
Retorno Atendimento Biométrico - Goiás - ZE 012	NÃO INICIADO
Retorno Atendimento Biométrico - Santo Antônio do Descoberto - ZE 024	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Mineiros - ZE 021	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Planaltina - ZE 044	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Itajá - ZE 096	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Cachoeira Alta - ZE 097	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Quirinópolis - ZE 046	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Campos Belos - ZE 105	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Palmeiras de Goiás - ZE 020	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Alto Paraíso - ZE 143	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Jaraguá - ZE 017	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Niquelândia - ZE 041	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Piracanjuba - ZE 025	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Mara Rosa - ZE 088	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Caldas Novas - ZE 007	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Morrinhos - ZE 022	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Minaçu - ZE 130	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Goiatuba - ZE 038	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Porangatu - ZE 055	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Buriti Alegre - ZE 005	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Ipameri - ZE 014	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Luziânia - ZE 019	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Cidade Ocidental - ZE 042	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Jataí - ZE 018	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Rio Verde - ZE 030 e 140	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Anicuns - ZE 034	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Fazenda Nova - ZE 079	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - São Luis de Montes Belos - ZE 080	EM ANDAMENTO

i ATIVIDADES VOTO ELETRÔNICO

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equi
Manutenção das Urnas	EM ANDAMENTO	20	13/fev/23	02/mai/23	30/ago/24			CSEL
Distribuição das urnas - Eleições 2024	NÃO INICIADO							
Preparação de Materiais	NÃO INICIADO							
Aquisição de Suprimentos de Urna	NÃO INICIADO							
Patrimônio e Almoarifado	NÃO INICIADO							
Recolhimento das urnas - Eleições 2022	CONCLUÍDO	100	12/dez/22	12/dez/22	15/mai/23	12/mai/23		CSEL

PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023

Descrição

- <https://www.tre-go.jus.br/eleicoes/eleicoes-da-comunidade/conselhos-tutelares-2023>
- Data da eleição: 01/10/2023

Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável
EM ANDAMENTO	30	06/fev/23	06/fev/23	06/out/23		CSEL

ATIVIDADES

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Reunião Inicial com os representantes dos Conselhos Tutelares	CONCLUÍDO	100	09/fev/23	09/fev/23	09/fev/23	09/fev/23	CSEL	
Elaboração do Questionário para os Conselhos Tutelares	CONCLUÍDO	100	09/fev/23	09/fev/23	17/fev/23	14/fev/23	CSEL	
Elaboração da Resolução com calendário das principais Etapas	CONCLUÍDO	100	09/fev/23	09/fev/23	28/fev/23	24/fev/23	CSEL	
Tramitação e Publicação da Resolução com calendário das principais Etapas	CONCLUÍDO	100	24/fev/23	24/fev/23	14/mar/23	27/abr/23	CSEL	
Reunião com os Conselhos Tutelares - Orientações Gerais	CONCLUÍDO	100	15/mar/23	15/mar/23	15/mar/23	15/mar/23	CSEL	
Elaboração da página das Eleições dos Conselhos Tutelares na Internet	CONCLUÍDO	100	16/mar/23	16/mar/23	24/mar/23	18/mar/23	CSEL	
Elaboração do Fluxo do Processo (Recebimento do Pedido até a Totalização dos Resultados)	CONCLUÍDO	100	20/mar/23	20/mar/23	31/mar/23	30/mar/23	CSEL	
Reunião para elaboração do Sistema de ComuniCANDEX	CONCLUÍDO	100	03/abr/23	03/abr/23	03/abr/23	03/abr/23	CSEL	SESCO, CESCO

Desenv. Sist. EleCons - Etapa 1 (Cadastro dos dados, Conselhos, Representantes e Locais de Votação)	CONCLUÍDO	100	10/abr/23	10/abr/23	30/mai/23	31/mai/23	CSEL	SESCO, CESCO
Cadastro dos usuários do Elecons (Oficial)	EM ANDAMENTO		31/mai/23	31/mai/23	02/jun/23		CSEL	SESEL
Desenv. Sist. EleCons - Etapa 2 (Agregação de Seções)	EM ANDAMENTO		31/mai/23	31/mai/23	23/jun/23		CSEL	SESCO, CESCO
Desenv. Sist. EleCons - Etapa 3 (Cadastro dos Candidatos)	NÃO INICIADO		19/jun/23		14/jul/23		CSEL	SESCO, CESCO
Desenv. Sist. EleCons - Etapa 4 (Cadastro do Suporte Técnico)	NÃO INICIADO		17/jul/23		31/jul/23		CSEL	SESCO, CESCO
Teste dos Sistemas Parametrizador, GEDAI e Sistemas de Urna (Versão: Onça Pintada)	NÃO INICIADO		01/jun/23		14/jul/23		CSEL	SESEL, SEVIN
Disponibilizar, na internet, os municípios que serão atendidos (urnas eletrônicas ou de lona)	NÃO INICIADO		12/jun/23		12/jun/23		CSEL	CSEL
Disponibilizar, na internet, o quantitativo de eleitoras e eleitores por seção eleitoral nos locais de votação	NÃO INICIADO		07/jul/23		07/jul/23		CSEL	SECAD
Locais de Votação e Agregação de Seções (CMDCA)	NÃO INICIADO		26/jun/23		20/jul/23		CSEL	SESEL
Registro de Candidatos (CMDCA)	NÃO INICIADO		17/jul/23		04/ago/23		CSEL	SESEL
Parametrização Oficial (Versão: Onça Pintada)	NÃO INICIADO		31/jul/23		11/ago/23		CSEL	SESEL
Validação dos Candidatos (Número, Nome, Foto) (CMDCA)	NÃO INICIADO		14/ago/23		18/ago/23		CSEL	SESEL

Observações

- Concluída a ETAPA 1 - SOLICITAÇÃO AO CARTÓRIO ELEITORAL (até 26 de maio de 2023).
- Cadastradas as solicitações de 189 municípios sendo 182 com urna eletrônica.

PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede cabeada e sem fio

Descrição

SEI nº 23.0.000003147-0

Aquisição de Solução de rede cabeada (LAN e TOR) e sem fio (Wi-fi) com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral.

Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	28/fev/23	28/fev/23	30/set/23		CINF	30

ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Elaboração do DOD.	CONCLUÍDO	20/fev/23	20/fev/23	28/fev/23	28/fev/23	CINF	100
Elaboração do ETP.	CONCLUÍDO	20/mar/23	20/mar/23	19/mai/23	18/mai/23	CINF	100
Elaboração do TR.	EM ANDAMENTO						10
Processo de licitação.	NÃO INICIADO						
Execução da ARP.	NÃO INICIADO						
Implementação da solução.	NÃO INICIADO						

Observações

Estudos técnicos preliminares assinados pela equipe de planejamento da contratação.

PDI-22-R1-N-34 - Reaparelhamento dos serviços de impressão

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO					CINF	40

ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Elaboração do TR.	EM ANDAMENTO						90
Implantação da solução.	NÃO INICIADO						
Execução da ARP.	NÃO INICIADO						
Processo de licitação.	NÃO INICIADO						
Elaboração do ETP.	CONCLUÍDO						
Elaboração do DOD.	CONCLUÍDO						

Observações

Finalizada análise pelo integrante administrativo no TR e iniciada a pesquisa de preços.

PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (SISCONS)

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	03/abr/23	03/abr/23	31/jul/23		CESCO, CSEL	30

ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Primeira etapa de cadastro dos Conselhos, informações para configuração dos sistemas e definição dos locais de votação concluída.	CONCLUÍDO						
Desenvolvimento da funcionalidade de agregação	EM ANDAMENTO						

Observações

Link para o ambiente de teste do sistema: <http://10.10.1.201:3010>

PDI-22-R1-N-37 - Manutenção preventiva de urnas

Descrição

Painel de acompanhamento

[https://app.powerbi.com/view?](https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojOGM4ZDA2ZTEtYjk4OC00YjI3LWExNTItZDM2MzZmMDFmZThkIiwidCI6IjI2ZjA4NzlyLTJjOWUtNGVhZS1iIn2VklThhMml3N2ZmM2Q5YyJ9)

r=eyJrIjojOGM4ZDA2ZTEtYjk4OC00YjI3LWExNTItZDM2MzZmMDFmZThkIiwidCI6IjI2ZjA4NzlyLTJjOWUtNGVhZS1iIn2VklThhMml3N2ZmM2Q5YyJ9

Situação	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	13/fev/23	02/mai/23	30/ago/24			10

ATIVIDADES

Resumo	Situação	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Equipe	Execução%
Realização do 1º Run In 2023	CANCELADO	13/fev/23		28/abr/23		SEVIN	
Realização do 2º Run In 2023	EM ANDAMENTO	01/mai/23	03/mai/23	31/ago/23		SEVIN	20
Realização do 3º Run In 2023	NÃO INICIADO	01/set/23		19/dez/23		SEVIN	
Realização do 1º Run In 2024	NÃO INICIADO	08/jan/24		30/abr/24		SEVIN	
Realização do 2º Run In 2024	NÃO INICIADO	01/mai/24		30/ago/24		SEVIN	

PDI-22-R1-N-38 - Adequação da rede para o serviço VOIP

Descrição

Projeto tem como objetivo modernizar a Central Telefônica e acoplar a solução VoIP.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	03/mai/23	03/mai/23	30/jun/23		CINF	50

ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Equipe	Execução%
Configurar os firewalls/switches para as conexões entre os telefones IP e a Central telefônica.	CONCLUÍDO	03/mai/23	03/mai/23	02/jun/23		CINF	SESRE	30
Configurar Firewall, as VLans de acesso nos switches e o serviço de DHCP no Anexo II.	CONCLUÍDO	03/mai/23	03/mai/23	05/mai/23	05/mai/23	CINF	SESRE	100
Configurar Firewall, VLans de acesso nos switches e o serviço de DHCP no prédio Ialba.	NÃO INICIADO	05/jun/23				CINF	SESRE	
Configurar Firewall, as VLans de acesso nos switches e o serviço de DHCP no cartório de Ap. de Gyn.	EM ANDAMENTO	08/mai/23	08/mai/23	31/mai/23		CINF	SESRE	70
Configurar Firewall, Vlan de acesso nos switches e o serviço de DHCP nos cartórios do interior.	EM ANDAMENTO	08/mai/23	08/mai/23	16/jun/23		CINF	SESRE	20

Observações

Alterado o nome do projeto de Implantação do serviço VOIP, para Adequação da rede para o serviço VOIP.

PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante

Descrição

Projeto de instalação de links internet dedicados redundantes nos Cartórios Eleitorais.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO					CINF	70

ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Equipe	Execução%
Processo de contratação.	CONCLUÍDO							
Preparação da infraestrutura de rede.	CONCLUÍDO							
Reunião de planejamento da implantação.	CONCLUÍDO							
Implantação dos links nos cartórios eleitorais.	EM ANDAMENTO							

Observações

Foi realizada uma reavaliação a respeito do andamento do projeto, identificou-se o percentual de execução de 70% dos links.

ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software

Descrição

Possui o intuito de estabelecer padrões de segurança no desenvolvimento de software.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CESCO	40

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Elaboração da minuta do documento normativo	EM ANDAMENTO						

Observações

Retomando o andamento do projeto.

ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação

Descrição

Dispõe sobre as regras e os procedimentos para gestão de incidentes de segurança da informação do TRE-GO.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI, CESCO, CINF	40

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Mapeamento do processo de trabalho	EM ANDAMENTO						
Transferência de conhecimento	NÃO INICIADO						
Implantação	NÃO INICIADO						

Observações

O projeto teve o seu andamento retomado.

ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches

Descrição

SEI 7716-3

A Gestão de Patches é fundamental para a proteção dos sistemas informatizados de uma organização. O objetivo principal dos patches é corrigir bugs funcionais e falhas de segurança que são suscetíveis a ataques cibernéticos, ajudando a reduzir o risco de segurança da informação.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	29/mai/21	29/mai/21	19/dez/23		CINF	90

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Aquisição	CONCLUÍDO						
Instalação e configuração	CONCLUÍDO						
Transferência de conhecimento	CONCLUÍDO						
Disponibilizar em produção	EM ANDAMENTO	16/mai/23	16/mai/23	02/jun/23		CINF	10

ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)

Descrição

SEI 6237-9

Ferramenta que possui a finalidade de prover uma autenticação mais segura dos usuários de sistemas informatizados, por meio da confirmação da identidade do usuário, em dois ou mais momentos, antes de liberar o seu acesso a um determinado sistema.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	90

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Aquisição	CONCLUÍDO						
Instalação e configuração	CONCLUÍDO						
Transferência de conhecimento	CONCLUÍDO						
Disponibilizar em produção - Sistema SEI	EM ANDAMENTO						
Disponibilizar em produção - E-mail.	EM ANDAMENTO						
Disponibilizar em produção - Portal internet.	EM ANDAMENTO						

Observações

- Incluir o MFA na versão atual do SEI (3.0), com duas opções (com e sem DUO).
- Aguardando a definição da configuração do CISCO-DUO para utilização na nova versão do sistema SEI.
- Avaliar a aquisição de tokens para usuários que possuem os sistemas Android e IOS incompatíveis.

ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização

Descrição

SEI 3619-0

As pessoas são o elo mais fraco quando falamos em segurança cibernética. Costumam ser a porta de entrada para criminosos cibernéticos invadirem a rede, roubarem informações valiosas e causarem grandes prejuízos financeiros e de imagem às instituições. Treinar e conscientizar pessoas é primordial para o fortalecimento da segurança da infraestrutura tecnológica e dos dados pessoais. A contratação de solução para conscientização em segurança da informação está prevista na Estratégia Nacional de Cibersegurança da Justiça Eleitoral. A estratégia prevê que os servidores e colaboradores devem ser capacitados a fim de reduzir os riscos na área de segurança cibernética. É importante que os funcionários entendam os objetivos da segurança da informação e o impacto potencial, positivo e negativo de seu próprio comportamento na organização.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	80

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Aquisição	CONCLUÍDO						
Instalação e configuração	CONCLUÍDO						
Transferência de conhecimento	CONCLUÍDO						
Implantação	EM ANDAMENTO						

Observações

Será encaminhado e-mail pela ACIBER, com orientações para realização do piloto do curso: "A Segurança na Internet e Você".

PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC

Descrição

Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estabelecido no Guia

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		STI	80

ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, alinhado ao número de usuários internos e externos de recursos de TIC conforme referencial mínimo estabelecido no Guia	CONCLUÍDO					STI	
Propor a adequação dos recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos da atividade anterior	EM ANDAMENTO					STI	

PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26

Descrição ▾

Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD e encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica.

<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706>

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	28/jul/23		AGSTI	70

ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Elaborar e acompanhar o Plano de Trabalho, conforme critérios da ENTIC	CONCLUÍDO					AGSTI	
Enviar o Plano de Trabalho ao CNJ	CONCLUÍDO					AGSTI	
Mapear e/ou validar processo de publicação e divulgação periódica de planos junto aos repositórios nacional e regional, designando responsáveis	EM ANDAMENTO					AGSTI	

PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC

Descrição

Definir processos de continuidade de serviços de TI, em caso de eventos de causas naturais, acidentais, tecnológicas ou humanas.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	50

ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Estabelecer Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papeis e responsabilidades	EM ANDAMENTO						
Estabelecer o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC	EM ANDAMENTO						
Transferência de conhecimento	NÃO INICIADO						
Testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC	NÃO INICIADO						

PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC

Descrição

Os projetos de Tecnologia da Informação, deverão passar por análise de riscos de segurança da informação antes de sua implementação.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	50

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Mapeamento do processo de trabalho	EM ANDAMENTO						
Elaborar, revisar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado com o plano institucional de gestão de riscos	EM ANDAMENTO						
Transferência de conhecimento	NÃO INICIADO						
Implantação	NÃO INICIADO						

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

Descrição

SEI nº:

Objetivo da demanda:

Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.

Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

A falta catalogação dos ativos de TI, tanto *hardware* quanto *software*, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataques cibernéticos de qualquer natureza.

Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Gestão de TI e apoio à Governança

Desenvolvimento e administração de soluções de TIC

Gestão de infraestrutura de TIC

Suporte técnico das soluções de TIC

Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

1. Visibilidade de todo o parque de *hardware* do Tribunal.
2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional.
3. Visibilidade de todos os *softwares* em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.

Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados

Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados.

Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026

Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):

Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?

Não

Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:

Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):

Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em *Software Livre*, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		AGSTI	60

i ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Mapeamento do processo de trabalho	CONCLUÍDO						
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Aquisição da solução	CONCLUÍDO						
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	EM ANDAMENTO					CESCO, CINF, CSEL	
Instalação e configuração da solução	EM ANDAMENTO						
Transferência de conhecimento	NÃO INICIADO						
Implantação	NÃO INICIADO						
Estabelecer rotina de, regularmente, avaliar o parque, inventariar ativos, auditar e tratar não conformidades relativas aos registros dos ativos no CMDB, abrangendo hardwares, softwares, links etc.	NÃO INICIADO						

PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		AGSTI	10

 ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Análise dos modelos de governança de serviços de TIC existentes	CONCLUÍDO						
Implementar/Avaliar processos de gerenciamento de serviços que impactem a satisfação dos usuários	EM ANDAMENTO					AGSTI	
Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções	ADIADO						
Implementar as soluções priorizadas	ADIADO						
