



Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
Secretaria de Tecnologia da Informação

Reunião CTGTI - 07/2023

1. Identificação

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Data da reunião: 6 de jun. de 2023 | Início: 14:22h Término: 15:25h | Local: Sala de reunião da STI |
| Objetivo da reunião: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022 | | |

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.



4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados.

5. Participantes da reunião

| Nome | Unidade | email |
|--------------------------------|---------|----------------------------------|
| Frank Wendell Ribeiro | STI | frank.ribeiro@tre-go.jus.br |
| Paulo Sérgio Taira | AGSTI | paulo.taira@tre-go.jus.br |
| Augusto César de Castro Ovelar | CESCO | Augusto.overlar@tre-go.jus.br |
| Dory Gonzaga Rodrigues | CSEL | dory.gonzaga@tre-go.jus.br |
| Marcílio Zaccarelli Bersaneti | CINF | marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br |

6. Portfólio de projetos

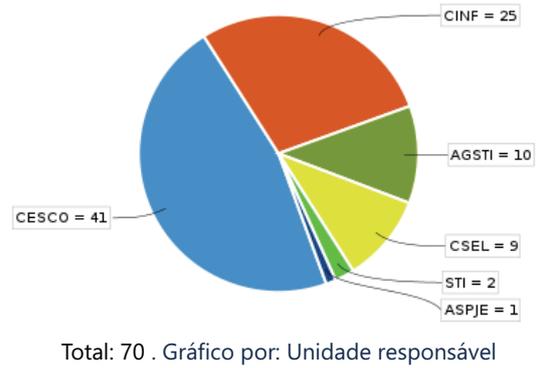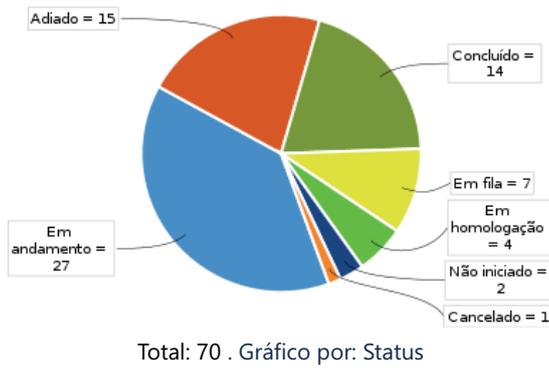

6.1. Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos em Andamento

| Resumo | Situação | Execução% | Unidade Responsável |
|--|--------------|-----------|---------------------------------|
| PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições | EM ANDAMENTO | 90 | CESCO |
| PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores | EM ANDAMENTO | 10 | CESCO |
| PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC | EM ANDAMENTO | 10 | CESCO |
| PDI-22-R1-14 - Eleições da Comunidade | EM ANDAMENTO | 20 | CSEL |
| PDI-22-R1-25 - Nova Intranet | EM ANDAMENTO | 30 | CESCO |
| PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI | EM ANDAMENTO | 80 | CESCO |
| PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015 | EM ANDAMENTO | 90 | CINF, CSEL |
| PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (Acordo de colaboração TJ) | EM ANDAMENTO | 60 | CINF |
| PDI-22-R1-31 - Suporte às Eleições 2024 | EM ANDAMENTO | 10 | AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL |
| PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023 | EM ANDAMENTO | 20 | CSEL |
| PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede cabeada e sem fio | EM ANDAMENTO | 30 | CINF |
| PDI-22-R1-N-34 - Reparelhamento dos serviços de impressão | EM ANDAMENTO | 40 | CINF |
| PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (ELECONS) | EM ANDAMENTO | 30 | CESCO, CSEL |
| PDI-22-R1-N-37 - Manutenção preventiva de urnas | EM ANDAMENTO | 10 | CSEL |
| PDI-22-R1-N-38 - Adequação da rede para o serviço VOIP | EM ANDAMENTO | 60 | CINF |
| PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante | EM ANDAMENTO | 70 | CINF |

6.2. Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos em Andamento

| Resumo | Situação | Execução% | Unidade Responsável |
|---|--------------|-----------|---------------------|
| ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software | EM ANDAMENTO | 40 | CESCO |
| ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação | EM ANDAMENTO | 40 | AGSTI, CESCO, CINF |
| ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches | EM ANDAMENTO | 90 | CINF |
| ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA) | EM ANDAMENTO | 90 | CINF |
| ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização | EM ANDAMENTO | 80 | AGSTI |

6.3. Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos em Andamento

| Resumo | Situação | Execução% | Unidade Responsável |
|---|--------------|-----------|---------------------|
| PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC | EM ANDAMENTO | 80 | STI |
| PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26 | EM ANDAMENTO | 70 | AGSTI |
| PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC | EM ANDAMENTO | 50 | AGSTI |
| PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC | EM ANDAMENTO | 50 | AGSTI |
| PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica | EM ANDAMENTO | 60 | AGSTI |
| PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente | EM ANDAMENTO | 10 | AGSTI |

6.4. Projetos adiados e não iniciados

| Resumo | Situação | Execução% | Unidade Responsável |
|--|----------|-----------|---------------------|
| ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes | ADIADO | 40 | CESCO, CINF |
| ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados | ADIADO | 90 | CINF |
| ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades | ADIADO | 70 | AGSTI, CESCO, CINF |
| ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico | ADIADO | 40 | CINF |
| ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs) | ADIADO | 40 | CINF |
| ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas | ADIADO | 90 | CINF |
| ENS-22-R1-13 - Solução de Segurança do AD | ADIADO | 90 | CINF |
| ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF | ADIADO | 20 | CINF |

| | | | |
|---|--------------|----|-------------|
| ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação | ADIADO | 90 | CINF, STI |
| ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos | ADIADO | 40 | CESCO, CINF |
| PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD | ADIADO | 10 | CESCO |
| PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020. | ADIADO | 20 | CESCO, CINF |
| PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020 | ADIADO | 10 | CESCO |
| PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas | ADIADO | 10 | CESCO |
| PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33 | ADIADO | 50 | CESCO |
| PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle | NÃO INICIADO | | CESCO |
| PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem | NÃO INICIADO | | CESCO, CINF |

6.5. Projetos/macro atividades com término previsto em até 60 dias

| Resumo | Situação | Execução% | Unidade Responsável | Término Previsto | End Date (Baseline) |
|---|----------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|
| PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015 | EM ANDAMENTO | 90 | CINF, CSEL | 26/jun/23 | |
| PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante | EM ANDAMENTO | 70 | CINF | 30/jun/23 | |
| PDI-22-R1-N-38 - Adequação da rede para o serviço VOIP | EM ANDAMENTO | 60 | CINF | 30/jun/23 | |
| PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI | EM ANDAMENTO | 80 | CESCO | 30/jun/23 | |
| PDI-22-R1-25 - Nova Intranet | EM ANDAMENTO | 30 | CESCO | 30/jun/23 | |
| PDI-22-R1-06 - Implantar o Sistema de Gerenciamento de Propaganda Partidária Gratuita (SisAntena) | EM HOMOLOGAÇÃO | 20 | CESCO | 30/jun/23 | |
| PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições | EM ANDAMENTO | 90 | CESCO | 30/jun/23 | |
| PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26 | EM ANDAMENTO | 70 | AGSTI | 28/jul/23 | |
| PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (ELECONS) | EM ANDAMENTO | 30 | CESCO, CSEL | 31/jul/23 | |
| Retorno Atendimento Biométrico - Nerópolis - ZE 054 | EM ANDAMENTO | 70 | CINF, CSEL | | 01/mar/23 |

| | | | | |
|--|--------------|----|------------|-----------|
| Retorno Atendimento Biométrico - Luziânia - ZE 019 | EM ANDAMENTO | 90 | CINF, CSEL | 08/mai/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Cidade Ocidental - ZE 042 | EM ANDAMENTO | 80 | CINF, CSEL | 08/mai/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Rio Verde - ZE 030 e 140 | EM ANDAMENTO | 80 | CINF, CSEL | 08/mai/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Anicuns - ZE 034 | EM ANDAMENTO | 80 | CINF, CSEL | 08/mai/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Fazenda Nova - ZE 079 | EM ANDAMENTO | 90 | CINF, CSEL | 08/mai/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - São Luis de Montes Belos - ZE 080 | EM ANDAMENTO | 90 | CINF, CSEL | 08/mai/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Mineiros - ZE 021 | EM ANDAMENTO | 80 | CINF, CSEL | 29/mai/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Campos Belos - ZE 105 | EM ANDAMENTO | 90 | CINF, CSEL | 29/mai/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Jaraguá - ZE 017 | EM ANDAMENTO | 90 | CINF, CSEL | 29/mai/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Niquelândia - ZE 041 | EM ANDAMENTO | 90 | CINF, CSEL | 29/mai/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Piracanjuba - ZE 025 | EM ANDAMENTO | 80 | CINF, CSEL | 12/jun/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Mara Rosa - ZE 088 | EM ANDAMENTO | 90 | CINF, CSEL | 12/jun/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Caldas Novas - ZE 007 | EM ANDAMENTO | 80 | CINF, CSEL | 12/jun/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Morrinhos - ZE 022 | EM ANDAMENTO | 90 | CINF, CSEL | 12/jun/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Porangatu - ZE 055 | EM ANDAMENTO | 80 | CINF, CSEL | 12/jun/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Buriti Alegre - ZE 005 | EM ANDAMENTO | 80 | CINF, CSEL | 12/jun/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Itumbiara - ZE 016 | EM ANDAMENTO | 80 | CINF, CSEL | 12/jun/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Crixás - ZE 085 | EM ANDAMENTO | 80 | CINF, CSEL | 12/jun/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Itauçu - ZE 057 | NÃO INICIADO | | CINF, CSEL | 26/jun/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Rubiataba - ZE 076 | NÃO INICIADO | | CINF, CSEL | 26/jun/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Itaberaí - ZE 015 | NÃO INICIADO | | CINF, CSEL | 26/jun/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Mozarlândia - ZE 110 | NÃO INICIADO | | CINF, CSEL | 26/jun/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Itapuranga - ZE 077 | NÃO INICIADO | | CINF, CSEL | 26/jun/23 |

| | | | |
|--|--------------|------------|-----------|
| Retorno Atendimento Biométrico - São Miguel do Araguaia - ZE 094 | NÃO INICIADO | CINF, CSEL | 26/jun/23 |
| Retorno Atendimento Biométrico - Goiás - ZE 012 | NÃO INICIADO | CINF, CSEL | 26/jun/23 |
| 12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH) | NÃO INICIADO | CSEL | 14/jul/23 |

7. Anotações

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas.
- O projeto PDI-22-R1-02 - Implantação do RDC ARQ (etapa 2023) foi concluído.

PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições

Descrição

Desenvolvimento (Finalização) de Sistema de Substituição de Servidores, que envolve o processo indicação e designação de servidores para ocupação

de Funções de Confiança (FC) e Cargos Comissionados (CJ), por prazo determinado ou indeterminado.

Visa automatizar o processo de indicação e deferimento de substituições de cargos de direção, chefia e assessoramento no Tribunal

Meta: Automação do processo de indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança e Cargos Comissionados até setembro/2022.

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 27/abr/22 | 27/abr/22 | 30/jun/23 | | CESCO | 90 |

ETAPAS

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|---|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Criação e configuração do ambiente de testes | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Realização de testes pela unidade demandante | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Homologação do produto | EM ANDAMENTO | | | | | | |
| Disponibilização em ambiente de produção | NÃO INICIADO | | | | | | |

Impedimentos:

- Adequação das aplicações para o domínio JUS.

PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores

Descrição

SEI: 22.0.000008626-0

Objetivo da demanda:

Desenvolver formulário pré preenchido de recadastramento de servidores, visando agilizar e otimizar o processo de revisão do cadastro de servidores.

Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

Facilitar o processo de solicitação de alteração de dados cadastrais pelos servidores, com a permissão de alteração de dados livres e possibilidade de solicitação de alteração de dados que exigem comprovação, com a anexação de documentos.

Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Macroprocesso de apoio: Gestão de Pessoas / Processo: Gestão do quadro de pessoal

Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

Facilidade e celeridade da execução do processo de recadastramento de servidores, tanto para o servidor quanto para a unidade responsável.

Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

8 - Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas.

Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):

Disponibilização de formulário eletrônico pré-preenchido com os dados dos servidores, com opção de solicitação de alteração, anexação de documentos e possibilidade de deferimento pela unidade responsável, com gravação automática no SGRH.

Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?

Não

Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:

Não se aplica

Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):

Não se aplica

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 27/fev/23 | 27/fev/23 | 30/set/23 | | CESCO | 10 |

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento | EM ANDAMENTO | | | | | | |
| Criação e configuração do ambiente de testes | NÃO INICIADO | | | | | | |
| Realização de testes pela unidade demandante | NÃO INICIADO | | | | | | |
| Homologação do produto | NÃO INICIADO | | | | | | |
| Disponibilização em ambiente de produção | NÃO INICIADO | | | | | | |

Observações

Aguardando SGP enviar a relação de informações que serão recadastradas

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC

Descrição

Promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal.

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 29/abr/22 | 29/abr/22 | 19/dez/23 | | CESCO | 10 |

ETAPAS

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Criação e configuração do ambiente de testes | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Realização de testes pela unidade demandante | NÃO INICIADO | | | | | | |
| Homologação do produto | NÃO INICIADO | | | | | | |
| Disponibilização em ambiente de produção | NÃO INICIADO | | | | | | |
| Implementação das funcionalidades | NÃO INICIADO | | | | | | |
| Levantamento de requisitos da nova versão | NÃO INICIADO | | | | | | |

Observações

Retornando as atividades após a conclusão das solicitações no Siapex

PDI-22-R1-14 - Eleições da Comunidade

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 29/abr/22 | 29/abr/22 | 15/abr/24 | | CSEL | 20 |

ETAPAS

| Resumo | Situação | Execução% | Start Date (Baseline) | Start Date | End Date (Baseline) | End Date | Unidade Responsável | Equipe |
|---|---------------------|-----------|-----------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|--------|
| Sindicato dos Trabalhadores dos Correios – SINTECT/GO | CANCELADO | 10 | 11/nov/22 | 14/nov/22 | 17/fev/23 | 13/dez/22 | | |
| Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás - COSEMS/GO | CANCELADO | 10 | 16/jan/23 | 16/jan/23 | 13/mar/23 | 09/fev/23 | | |
| Secretaria de Estado da Educação - SEDUC | CANCELADO | 10 | 16/jan/23 | 16/jan/23 | 01/mai/23 | 28/fev/23 | | |
| Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES | CANCELADO | 10 | 18/jan/23 | 18/jan/23 | 12/mai/23 | 09/mar/23 | | |
| Eleitor do Futuro - Colégio Espaço Pedagógico Educacional - Grêmio Estudantil | CONCLUÍDO | 100 | 01/fev/23 | 01/fev/23 | 27/fev/23 | 27/fev/23 | | |
| Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás - COOTEGO | CONCLUÍDO | 100 | 10/fev/23 | 10/fev/23 | 14/mar/23 | 10/mar/23 | | |
| Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás - CIPA | CONCLUÍDO | 100 | 10/mai/23 | 10/mai/23 | 31/mai/23 | 31/mai/23 | | |
| Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023 - CMDCA 2023 | EM ANDAMENTO | 30 | 06/fev/23 | 06/fev/23 | 06/out/23 | | CSEL | |

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | | | 30/jun/23 | | CESCO | 30 |

ETAPAS

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|---|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Criação e configuração do ambiente de testes | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Realização de testes pela unidade demandante | EM ANDAMENTO | | | | | | |
| Homologação do produto | NÃO INICIADO | | | | | | |
| Disponibilização em ambiente de produção | NÃO INICIADO | | | | | | |

Observações

- Será realizada apresentação para as unidades
- Adequação para tema responsivo concluída
- <http://wp.tre-go.jus.br/>

PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI

Descrição

SEI nº: 21.0.000005057-9 (principal) e 21.0.000005046-3

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | | | 30/jun/23 | | CESCO | 80 |

ETAPAS

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|---|----------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Criação e configuração do ambiente de testes | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Realização de testes pela unidade demandante | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Validação do MFA (CISCO-DUO) no sistema | EM HOMOLOGAÇÃO | | | | | | |
| Homologação do produto | EM ANDAMENTO | | | | | | |
| Disponibilização em ambiente de produção | NÃO INICIADO | | | | | | |

Observações

Em testes na SJD <https://sei4-teste.tre-go.jus.br/sei/>

Adaptar manual

PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015

Descrição

SEI nº 22.0.000015982-8

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 01/fev/23 | 01/fev/23 | 26/jun/23 | | CINF, CSEL | 90 |

ETAPAS

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Instalação dos kits biométricos | EM ANDAMENTO | 01/fev/23 | 01/fev/23 | 13/jun/23 | | | 40 |
| Treinamento dos operadores | EM ANDAMENTO | | | | | | |
| Comunicar à CRE a relação das Zonas que estão aptas para iniciar o atendimento | EM ANDAMENTO | | | | | | |

Observações

Situação de retorno de coletas biométricas

- 49 Zonas com biometria já ativa
- 16 Zonas com retorno para 12/06
- 08 Zonas com retorno para 26/06
- 12 Zonas prontas mas sem data de retorno programada
- 07 Zonas com instalação programada entre 12 e 16/06

PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (17 postos do TJ)

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | | | 31/mar/24 | | CINF | 60 |

ETAPAS

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|---|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Preparação de ambiente seguro e desenvolvimento de template | CONCLUÍDO | | | | | | 100 |
| Distrito Jardim ABC | CONCLUÍDO | | | | | | 100 |
| Rio Quente | CONCLUÍDO | | | | | | 100 |
| Portelândia | EM ANDAMENTO | | | | | | |
| Caldazinha | EM ANDAMENTO | | | | | | |
| Perolândia | EM ANDAMENTO | | | | | | |
| São Miguel do Passa Quatro | EM ANDAMENTO | | | | | | |
| Faina | EM ANDAMENTO | 17/mai/23 | 17/mai/23 | 23/mai/23 | | | |
| Aporé | EM ANDAMENTO | 17/mai/23 | 17/mai/23 | | | | |
| Carmo do Rio Verde | EM ANDAMENTO | 31/mai/23 | 31/mai/23 | 09/jun/23 | | CINF | 10 |

Observações

Faina

Os equipamentos serão enviados para o cartório eleitoral de 012ZGO - Goiás, através da rota de instalação, configuração e teste dos kits biométricos, com previsão da entrega efetiva para o dia 15/06/2023.

Carmo do Rio Verde

Os equipamentos serão enviados para o cartório eleitoral de 076ZGO - Rubiataba, através da rota de instalação, configuração e teste dos kits biométricos, com previsão da entrega efetiva para o dia 12/06/2023.

PDI-22-R1-31 - Suporte às Eleições 2024

| Descrição | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------------|
| Suporte técnico prestado pela STI nas atividades relacionadas às Eleições Municipais de 2024. | | | | | | |
| Situação | Execução% | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável |
| EM ANDAMENTO | 10 | 09/jan/23 | 09/jan/23 | 19/dez/24 | | AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL |

MACROATIVIDADES

| Resumo | Situação | Execução% | Start Date (Baseline) | Start Date | End Date (Baseline) | End Date | Unidade Responsável | Equipe |
|--------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|---------------------|----------|---------------------|--------|
| Voto Eletrônico | EM ANDAMENTO | 20 | | | | | | |
| Cadastro Eleitoral | EM ANDAMENTO | 50 | 23/jan/23 | 23/jan/23 | | | CSEL | |

ATIVIDADES CADASTRO ELEITORAL

| Resumo | Situação |
|---|-----------|
| Retorno Atendimento Biométrico - Santo Antônio do Descoberto - ZE 024 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Planaltina - ZE 044 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Caçu - ZE 106 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Formosa - ZE 011 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Itajá - ZE 096 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Alvorada do Norte - ZE 123 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Cachoeira Alta - ZE 097 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Posse - ZE 029 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Quirinópolis - ZE 046 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - São Domingos - ZE 047 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Santa Helena de Goiás - ZE 066 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Paraúna - ZE 043 | CONCLUÍDO |

| | |
|--|-----------|
| Retorno Atendimento Biométrico - Cavalcante - ZE 099 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Palmeiras de Goiás - ZE 020 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Alto Paraíso - ZE 143 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Padre Bernardo - ZE 131 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Goianésia - ZE 074 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Águas Lindas de Goiás - ZE 028 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Pirenópolis - ZE 026 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Uruaçu - ZE 050 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Formoso - ZE 125 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Minaçu - ZE 130 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Goiatuba - ZE 038 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Bom Jesus - ZE 124 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Pontalina - ZE 045 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Itapaci - ZE 039 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Ceres - ZE 072 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Silvânia - ZE 031 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Pires do Rio - ZE 027 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Ipameri - ZE 014 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Catalão - ZE 008 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Cristalina - ZE 036 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Valparaíso - ZE 033 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Novo Gama - ZE004 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Alexânia - ZE 087 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Jataí - ZE 018 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Acreúna - ZE 128 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Edeia - ZE 068 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Jussara - ZE 095 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Aragarças - ZE 035 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Piranhas - ZE 102 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Caiapônia - ZE 006 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Iporá - ZE 053 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Firminópolis - ZE 063 | CONCLUÍDO |
| Retorno do Atendimento Biométrico - Formoso - ZE 125 | CONCLUÍDO |
| Retorno do Atendimento Biométrico - Guapó - ZE 056 | CONCLUÍDO |
| Retorno do Atendimento Biométrico - Inhumas - ZE 013 | CONCLUÍDO |
| Retorno do Atendimento Biométrico - Bela Vista de Goiás - ZE 032 | CONCLUÍDO |
| Retorno do Atendimento Biométrico - Goianira - ZE 101 | CONCLUÍDO |

| | |
|---|--------------|
| Retorno do Atendimento Biométrico - Trindade - ZE 049 | CONCLUÍDO |
| Retorno do Atendimento Biométrico - Senador Canedo - ZE 040 | CONCLUÍDO |
| Atendimento Biométrico - Elaboração do Treinamento | CONCLUÍDO |
| Retorno do Atendimento Biométrico - Aparecida de Goiânia - ZE 119, 132 e 145 | CONCLUÍDO |
| Retorno do Atendimento Biométrico - Anápolis - ZE 003, 141 e 144 | CONCLUÍDO |
| Retorno do Atendimento Biométrico - Goiânia - ZE 001, 002, 127, 133, 134, 135, 136, 146 e 147 | CONCLUÍDO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Itauçu - ZE 057 | NÃO INICIADO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Rubiataba - ZE 076 | NÃO INICIADO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Itaberaí - ZE 015 | NÃO INICIADO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Mozarlândia - ZE 110 | NÃO INICIADO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Itapuranga - ZE 077 | NÃO INICIADO |
| Retorno Atendimento Biométrico - São Miguel do Araguaia - ZE 094 | NÃO INICIADO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Goiás - ZE 012 | NÃO INICIADO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Nerópolis - ZE 054 | EM ANDAMENTO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Mineiros - ZE 021 | EM ANDAMENTO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Campos Belos - ZE 105 | EM ANDAMENTO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Jaraguá - ZE 017 | EM ANDAMENTO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Niquelândia - ZE 041 | EM ANDAMENTO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Piracanjuba - ZE 025 | EM ANDAMENTO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Mara Rosa - ZE 088 | EM ANDAMENTO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Caldas Novas - ZE 007 | EM ANDAMENTO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Morrinhos - ZE 022 | EM ANDAMENTO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Porangatu - ZE 055 | EM ANDAMENTO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Buriti Alegre - ZE 005 | EM ANDAMENTO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Itumbiara - ZE 016 | EM ANDAMENTO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Crixás - ZE 085 | EM ANDAMENTO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Luziânia - ZE 019 | EM ANDAMENTO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Cidade Ocidental - ZE 042 | EM ANDAMENTO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Rio Verde - ZE 030 e 140 | EM ANDAMENTO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Anicuns - ZE 034 | EM ANDAMENTO |
| Retorno Atendimento Biométrico - Fazenda Nova - ZE 079 | EM ANDAMENTO |
| Retorno Atendimento Biométrico - São Luis de Montes Belos - ZE 080 | EM ANDAMENTO |

i ATIVIDADES VOTO ELETRÔNICO

| Resumo | Situação | Execução% | Start Date (Baseline) | Start Date | End Date (Baseline) | End Date | Unidade Responsável | Equi |
|--|--------------|-----------|-----------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------|
| Manutenção das Urnas | EM ANDAMENTO | 20 | 13/fev/23 | 02/mai/23 | 30/ago/24 | | | CSEL |
| Distribuição das urnas - Eleições 2024 | NÃO INICIADO | | | | | | | |
| Preparação de Materiais | NÃO INICIADO | | | | | | | |
| Aquisição de Suprimentos de Urna | NÃO INICIADO | | | | | | | |
| Patrimônio e Almoarifado | NÃO INICIADO | | | | | | | |
| Recolhimento das urnas - Eleições 2022 | CONCLUÍDO | 100 | 12/dez/22 | 12/dez/22 | 15/mai/23 | 12/mai/23 | | CSEL |

PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023

Descrição

- <https://www.tre-go.jus.br/eleicoes/eleicoes-da-comunidade/conselhos-tutelares-2023>
- Data da eleição: 01/10/2023

| Situação | Execução% | Start Date (Baseline) | Start Date | End Date (Baseline) | End Date | Unidade Responsável |
|--------------|-----------|-----------------------|------------|---------------------|----------|---------------------|
| EM ANDAMENTO | 30 | 06/fev/23 | 06/fev/23 | 06/out/23 | | CSEL |

ATIVIDADES

| Resumo | Situação | Execução% | Start Date (Baseline) | Start Date | End Date (Baseline) | End Date | Unidade Responsável | Equipe |
|---|-----------|-----------|-----------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| Reunião Inicial com os representantes dos Conselhos Tutelares | CONCLUÍDO | 100 | 09/fev/23 | 09/fev/23 | 09/fev/23 | 09/fev/23 | CSEL | SESEL, SEVIN, CSEL |
| Elaboração do Questionário para os Conselhos Tutelares | CONCLUÍDO | 100 | 09/fev/23 | 09/fev/23 | 17/fev/23 | 14/fev/23 | CSEL | SESEL |
| Elaboração da Resolução com calendário das principais Etapas | CONCLUÍDO | 100 | 09/fev/23 | 09/fev/23 | 28/fev/23 | 24/fev/23 | CSEL | CSEL |
| Tramitação e Publicação da Resolução com calendário das principais Etapas | CONCLUÍDO | 100 | 24/fev/23 | 24/fev/23 | 14/mar/23 | 27/abr/23 | CSEL | CSEL |
| Reunião com os Conselhos Tutelares - Orientações Gerais | CONCLUÍDO | 100 | 15/mar/23 | 15/mar/23 | 15/mar/23 | 15/mar/23 | CSEL | SESEL, SEVIN, CSEL |
| Elaboração da página das Eleições dos Conselhos Tutelares na Internet | CONCLUÍDO | 100 | 16/mar/23 | 16/mar/23 | 24/mar/23 | 18/mar/23 | CSEL | CSEL |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------|
| Elaboração do Fluxo do Processo (Recebimento do Pedido até a Totalização dos Resultados) | CONCLUÍDO | 100 | 20/mar/23 | 20/mar/23 | 31/mar/23 | 30/mar/23 | CSEL | CSEL |
| Reunião para elaboração do Sistema de ComunicANDEX | CONCLUÍDO | 100 | 03/abr/23 | 03/abr/23 | 03/abr/23 | 03/abr/23 | CSEL | SESCO, CESCO |
| Desenv. Sist. EleCons - Etapa 1 (Cadastro dos dados, Conselhos, Representantes e Locais de Votação) | CONCLUÍDO | 100 | 10/abr/23 | 10/abr/23 | 30/mai/23 | 02/jun/23 | CSEL | SESCO, CESCO |
| Reunião de Alinhamento e fechamento do Planejamento | CONCLUÍDO | 100 | 05/jun/23 | 05/jun/23 | 05/jun/23 | 05/jun/23 | CSEL | SESEL, SEVIN, SECAD |
| Cadastro dos usuários do Elecons (Oficial) | EM ANDAMENTO | | 05/jun/23 | 05/jun/23 | 09/jun/23 | | CSEL | SESEL |
| Desenv. Sist. EleCons - Etapa 3 (Cadastro dos Candidatos) | EM ANDAMENTO | | 05/jun/23 | 05/jun/23 | 14/jul/23 | | CSEL | SESCO, CESCO |
| Desenv. Sist. EleCons - Etapa 2 (Agregação de Seções) | EM ANDAMENTO | | 05/jun/23 | 05/jun/23 | 23/jun/23 | | CSEL | SESCO, CESCO |
| Desenv. Sist. EleCons - Etapa 4 (Cadastro do Suporte Técnico) | NÃO INICIADO | | 17/jul/23 | | 31/jul/23 | | CSEL | SESCO, CESCO |
| Configuração do Parametrizador (Versão: Onça Pintada) | NÃO INICIADO | | 05/jun/23 | | 07/jun/23 | | CSEL | SESEL, SEVIN, SECAD |
| Teste dos Sistemas Parametrizador, GEDAI e Sistemas de Urna (Versão: Onça Pintada) | NÃO INICIADO | | 05/jun/23 | | 14/jul/23 | | CSEL | SESEL, SEVIN |
| Disponibilizar, na internet, os municípios que serão atendidos (urnas | NÃO INICIADO | | 12/jun/23 | | 12/jun/23 | | CSEL | CSEL |

eletrônicas ou
de lona)

| | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------|-------|
| Teste da Parametrização (Versão: Onça Pintada) com urna | NÃO INICIADO | 12/jun/23 | 16/jun/23 | CSEL | SEVIN |
| Adaptação do Sistemas de Geração de Etiquetas | NÃO INICIADO | 19/jun/23 | 30/jun/23 | CSEL | CSEL |
| Locais de Votação e Agregação de Seções (CMDCA) | NÃO INICIADO | 26/jun/23 | 20/jul/23 | CSEL | SESEL |

Observações

- Cadastradas as solicitações de 218 municípios sendo 204 com urna eletrônica e 14 com urna de lona.

PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede cabeada e sem fio

Descrição

SEI nº 23.0.000003147-0

Aquisição de Solução de rede cabeada (LAN e TOR) e sem fio (Wi-fi) com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral.

Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 28/fev/23 | 28/fev/23 | 30/set/23 | | CINF | 30 |

ATIVIDADES

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Elaboração do DOD. | CONCLUÍDO | 20/fev/23 | 20/fev/23 | 28/fev/23 | 28/fev/23 | CINF | 100 |
| Elaboração do ETP. | CONCLUÍDO | 20/mar/23 | 20/mar/23 | 19/mai/23 | 18/mai/23 | CINF | 100 |
| Elaboração do TR. | EM ANDAMENTO | | | | | | 10 |
| Processo de licitação. | NÃO INICIADO | | | | | | |
| Execução da ARP. | NÃO INICIADO | | | | | | |
| Implementação da solução. | NÃO INICIADO | | | | | | |

Observações

Estudos técnicos preliminares assinados pela equipe de planejamento da contratação.

PDI-22-R1-N-34 - Reaparelhamento dos serviços de impressão

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | | | | | CINF | 40 |

ATIVIDADES

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|-------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Elaboração do TR. | EM ANDAMENTO | | | | | | 90 |
| Implantação da solução. | NÃO INICIADO | | | | | | |
| Execução da ARP. | NÃO INICIADO | | | | | | |
| Processo de licitação. | NÃO INICIADO | | | | | | |
| Elaboração do ETP. | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Elaboração do DOD. | CONCLUÍDO | | | | | | |

Observações

Finalizada análise pelo integrante administrativo no TR e iniciada a pesquisa de preços.

PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do

Descrição

Link para o ambiente de teste do sistema: <https://elecons.tre-go.jus.br>

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 03/abr/23 | 03/abr/23 | 31/jul/23 | | CESCO, CSEL | 30 |

ATIVIDADES

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|---|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Primeira etapa de cadastro dos Conselhos, informações para configuração dos sistemas e definição dos locais de votação concluída. | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Desenvolvimento da funcionalidade de agregação | EM ANDAMENTO | | | | | | |

Observações

O nome do sistema foi alterado para ELECONS

PDI-22-R1-N-37 - Manutenção preventiva de urnas

Descrição

Painel de acompanhamento

[https://app.powerbi.com/view?](https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJjoiOGM4ZDA2ZTEtYjk4OC00YjI3LWExNTItZDM2MzZmM4MDFmZThkIiwidCI6IjI2ZjA4NzlyLTJfOWUtNGVkbkZS1iN2VklThhMml3N2ZmM2Q5YyJ9)

[r=eyJrJjoiOGM4ZDA2ZTEtYjk4OC00YjI3LWExNTItZDM2MzZmM4MDFmZThkIiwidCI6IjI2ZjA4NzlyLTJfOWUtNGVkbkZS1iN2VklThhMml3N2ZmM2Q5YyJ9](https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJjoiOGM4ZDA2ZTEtYjk4OC00YjI3LWExNTItZDM2MzZmM4MDFmZThkIiwidCI6IjI2ZjA4NzlyLTJfOWUtNGVkbkZS1iN2VklThhMml3N2ZmM2Q5YyJ9)

| Situação | Start Date (Baseline) | Start Date | End Date (Baseline) | End Date | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------|----------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 13/fev/23 | 02/mai/23 | 30/ago/24 | | | 20 |

ATIVIDADES

| Resumo | Situação | Start Date (Baseline) | Start Date | End Date (Baseline) | End Date | Equipe | Execução% |
|------------------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------------|----------|--------|-----------|
| Realização do 1º Run In 2023 | CANCELADO | 13/fev/23 | | 28/abr/23 | | SEVIN | |
| Realização do 2º Run In 2023 | EM ANDAMENTO | 01/mai/23 | 03/mai/23 | 31/ago/23 | | SEVIN | 20 |
| Realização do 3º Run In 2023 | NÃO INICIADO | 01/set/23 | | 19/dez/23 | | SEVIN | |
| Realização do 1º Run In 2024 | NÃO INICIADO | 08/jan/24 | | 30/abr/24 | | SEVIN | |
| Realização do 2º Run In 2024 | NÃO INICIADO | 01/mai/24 | | 30/ago/24 | | SEVIN | |

PDI-22-R1-N-38 - Adequação da rede para o serviço VOIP

Descrição

Projeto tem como objetivo modernizar a Central Telefônica e acoplar a solução VoIP.

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 03/mai/23 | 03/mai/23 | 30/jun/23 | | CINF | 60 |

ATIVIDADES

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Equipe | Execução% |
|---|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------|-----------|
| Configurar os firewalls/switches para as conexões entre os telefones IP e a Central telefônica. | CONCLUÍDO | 03/mai/23 | 03/mai/23 | 02/jun/23 | | CINF | SESRE | 30 |
| Configurar Firewall, as VLans de acesso nos switches e o serviço de DHCP no Anexo II. | CONCLUÍDO | 03/mai/23 | 03/mai/23 | 05/mai/23 | 05/mai/23 | CINF | SESRE | 100 |
| Configurar Firewall, as VLans de acesso nos switches e o serviço de DHCP no cartório de Ap. de Gyn. | CONCLUÍDO | 08/mai/23 | 08/mai/23 | 31/mai/23 | | CINF | SESRE | 70 |
| Configurar Firewall, VLans de acesso nos switches e o serviço de DHCP no prédio Ialba. | NÃO INICIADO | 05/jun/23 | | | | CINF | SESRE | |
| Configurar Firewall, VLAN de acesso nos switches e o serviço de DHCP nos cartórios do interior. | EM ANDAMENTO | 08/mai/23 | 08/mai/23 | 16/jun/23 | | CINF | SESRE | 20 |

Observações

Alterado o nome do projeto de Implantação do serviço VOIP, para Adequação da rede para o serviço VOIP.

PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante

Descrição

Projeto de instalação de links internet dedicados redundantes nos Cartórios Eleitorais.

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | | | | | CINF | 70 |

ATIVIDADES

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Equipe | Execução% |
|---|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------|-----------|
| Processo de contratação. | CONCLUÍDO | | | | | | | |
| Preparação da infraestrutura de rede. | CONCLUÍDO | | | | | | | |
| Reunião de planejamento da implantação. | CONCLUÍDO | | | | | | | |
| Implantação dos links nos cartórios eleitorais. | EM ANDAMENTO | | | | | | | |

Observações

Foi realizada uma reavaliação a respeito do andamento do projeto, identificou-se o percentual de execução de 70% dos links.

ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software

Descrição

Possui o intuito de estabelecer padrões de segurança no desenvolvimento de software.

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 01/jul/21 | 01/jul/21 | 19/dez/23 | | CESCO | 40 |

ETAPAS

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|---|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Elaboração da minuta do documento normativo | EM ANDAMENTO | | | | | | |

Observações

Retomando o andamento do projeto.

ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação

Descrição

Dispõe sobre as regras e os procedimentos para gestão de incidentes de segurança da informação do TRE-GO.

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 01/jul/21 | 01/jul/21 | 19/dez/23 | | AGSTI, CESCO, CINF | 40 |

ETAPAS

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|---|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Elaboração da minuta do documento normativo | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Mapeamento do processo de trabalho | EM ANDAMENTO | | | | | | |
| Transferência de conhecimento | NÃO INICIADO | | | | | | |
| Implantação | NÃO INICIADO | | | | | | |

Observações

Foi encaminhado para o CTGTI minutas dos normativos para análise e sugestões por parte dos integrantes do Comitê.

ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches

Descrição

SEI 7716-3

A Gestão de Patches é fundamental para a proteção dos sistemas informatizados de uma organização. O objetivo principal dos patches é corrigir bugs funcionais e falhas de segurança que são suscetíveis a ataques cibernéticos, ajudando a reduzir o risco de segurança da informação.

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 29/mai/21 | 29/mai/21 | 19/dez/23 | | CINF | 90 |

ETAPAS

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|-------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Aquisição | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Instalação e configuração | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Transferência de conhecimento | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Disponibilizar em produção | EM ANDAMENTO | 16/mai/23 | 16/mai/23 | 02/jun/23 | | CINF | 10 |

ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)

Descrição

SEI 6237-9

Ferramenta que possui a finalidade de prover uma autenticação mais segura dos usuários de sistemas informatizados, por meio da confirmação da identidade do usuário, em dois ou mais momentos, antes de liberar o seu acesso a um determinado sistema.

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 01/jul/21 | 01/jul/21 | 19/dez/23 | | CINF | 90 |

ETAPAS

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|---|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Aquisição | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Instalação e configuração | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Transferência de conhecimento | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Disponibilizar em produção - Sistema SEI | EM ANDAMENTO | | | | | | |
| Disponibilizar em produção - E-mail. | EM ANDAMENTO | | | | | | |
| Disponibilizar em produção - Portal internet. | EM ANDAMENTO | | | | | | |

Observações

- **As atividades abaixo estão aguardando as configurações de rede para sustentar a implantação do Voip:**
 - Incluir o MFA na versão atual do SEI (3.0), com duas opções (com e sem DUO).
 - Aguardando a definição da configuração do CISCO-DUO para utilização na nova versão do sistema SEI.

ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização

Descrição

SEI 3619-0

As pessoas são o elo mais fraco quando falamos em segurança cibernética. Costumam ser a porta de entrada para criminosos cibernéticos invadirem a rede, roubarem informações valiosas e causarem grandes prejuízos financeiros e de imagem às instituições. Treinar e conscientizar pessoas é primordial para o fortalecimento da segurança da infraestrutura tecnológica e dos dados pessoais. A contratação de solução para conscientização em segurança da informação está prevista na Estratégia Nacional de Cibersegurança da Justiça Eleitoral. A estratégia prevê que os servidores e colaboradores devem ser capacitados a fim de reduzir os riscos na área de segurança cibernética. É importante que os funcionários entendam os objetivos da segurança da informação e o impacto potencial, positivo e negativo de seu próprio comportamento na organização.

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 01/jul/21 | 01/jul/21 | 19/dez/23 | | AGSTI | 80 |

ETAPAS

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|-------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Aquisição | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Instalação e configuração | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Transferência de conhecimento | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Implantação | EM ANDAMENTO | | | | | | |

Observações

Será encaminhado e-mail pela ACIBER, com orientações para realização do piloto do curso: "A Segurança na Internet e Você".

PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC

Descrição

Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estabelecido no Guia

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 01/jul/21 | 01/jul/21 | 19/dez/23 | | STI | 80 |

ATIVIDADES

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, alinhado ao número de usuários internos e externos de recursos de TIC conforme referencial mínimo estabelecido no Guia | CONCLUÍDO | | | | | STI | |
| Propor a adequação dos recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos da atividade anterior | EM ANDAMENTO | | | | | STI | |

PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26

Descrição ▾

Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD e encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica.

<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706>

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 07/jan/22 | 07/jan/22 | 28/jul/23 | | AGSTI | 70 |

ATIVIDADES

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|---|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Elaborar e acompanhar o Plano de Trabalho, conforme critérios da ENTIC | CONCLUÍDO | | | | | AGSTI | |
| Enviar o Plano de Trabalho ao CNJ | CONCLUÍDO | | | | | AGSTI | |
| Mapear e/ou validar processo de publicação e divulgação periódica de planos junto aos repositórios nacional e regional, designando responsáveis | EM ANDAMENTO | | | | | AGSTI | |

PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC

Descrição

Definir processos de continuidade de serviços de TI, em caso de eventos de causas naturais, acidentais, tecnológicas ou humanas.

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 01/jul/21 | 01/jul/21 | 19/dez/23 | | AGSTI | 50 |

ETAPAS

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Elaboração da minuta do documento normativo | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Estabelecer Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papeis e responsabilidades | EM ANDAMENTO | | | | | | |
| Estabelecer o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC | EM ANDAMENTO | | | | | | |
| Transferência de conhecimento | NÃO INICIADO | | | | | | |
| Testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC | NÃO INICIADO | | | | | | |

Observações

Impedimentos

Foram priorizados a implementação e manuais da Portaria CNJ 162/2021, o levantamento do atendimento do SLA, a publicação dos artefatos da contratação (ETP, DOD, TR.), elaboração do Plano de Transformação Digital.

PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC

Descrição

Os projetos de Tecnologia da Informação, deverão passar por análise de riscos de segurança da informação antes de sua implementação.

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 01/jul/21 | 01/jul/21 | 19/dez/23 | | AGSTI | 50 |

ETAPAS

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|---|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Elaboração da minuta do documento normativo | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Mapeamento do processo de trabalho | EM ANDAMENTO | | | | | | |
| Elaborar, revisar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado com o plano institucional de gestão de riscos | EM ANDAMENTO | | | | | | |
| Transferência de conhecimento | NÃO INICIADO | | | | | | |
| Implantação | NÃO INICIADO | | | | | | |

Impedimentos

Foram priorizados a implementação e manuais da Portaria CNJ 162/2021, o levantamento do atendimento do SLA, a publicação dos artefatos da contratação (ETP, DOD, TR.), elaboração do Plano de Transformação Digital.

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

Objetivo da demanda:

Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.

Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

A falta catalogação dos ativos de TI, tanto *hardware* quanto *software*, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataques cibernéticos de qualquer natureza.

Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Gestão de TI e apoio à Governança

Desenvolvimento e administração de soluções de TIC

Gestão de infraestrutura de TIC

Suporte técnico das soluções de TIC

Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

1. Visibilidade de todo o parque de *hardware* do Tribunal.
2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional.
3. Visibilidade de todos os *softwares* em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.

Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados

Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados.

Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026

Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):

Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?

Não

Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:

Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):

Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em *Software* Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 07/jan/22 | 07/jan/22 | 19/dez/23 | | AGSTI | 60 |

ATIVIDADES

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|---|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Planejamento | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Mapeamento do processo de trabalho | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Elaboração da minuta do documento normativo | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Aquisição da solução | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB) | EM ANDAMENTO | | | | | CESCO, CINF, CSEL | |
| Instalação e configuração da solução | EM ANDAMENTO | | | | | | |
| Transferência de conhecimento | NÃO INICIADO | | | | | | |
| Implantação | NÃO INICIADO | | | | | | |
| Estabelecer rotina de, regularmente, avaliar o parque, inventariar ativos, auditar e tratar não conformidades relativas aos registros dos ativos no CMDB, abrangendo hardwares, softwares, links etc. | NÃO INICIADO | | | | | | |

Impedimento

Aguardando o término das configurações de rede para o projeto Voip, para iniciar a implementação do inventário de ativos de rede.

PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente

| Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| EM ANDAMENTO | 07/jan/22 | 07/jan/22 | 19/dez/23 | | AGSTI | 10 |

i ATIVIDADES

| Resumo | Situação | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Unidade Responsável | Execução% |
|---|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Análise dos modelos de governança de serviços de TIC existentes | CONCLUÍDO | | | | | | |
| Implementar/Avaliar processos de gerenciamento de serviços que impactem a satisfação dos usuários | EM ANDAMENTO | | | | | AGSTI | |
| Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções | ADIADO | | | | | | |
| Implementar as soluções priorizadas | ADIADO | | | | | | |
