



Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
Secretaria de Tecnologia da Informação

Reunião CTGTI - 12/2023

1. Identificação

Data da reunião: 2 de ago. de 2023	Início: 14:27h Término: 15:35h	Local: Sala de reunião da STI
Objetivo da reunião: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.



4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados.

5. Participantes da reunião

Nome	Unidade	email
Frank Wendell Ribeiro	STI	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	AGSTI	paulo.taira@tre-go.jus.br
Augusto César de Castro Ovelar	CESCO	Augusto.overlar@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	CSEL	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Alessandro Maurício de Jesus	CINF	alessandro.mauricio@tre-go.jus.br

6. Portfólio de projetos

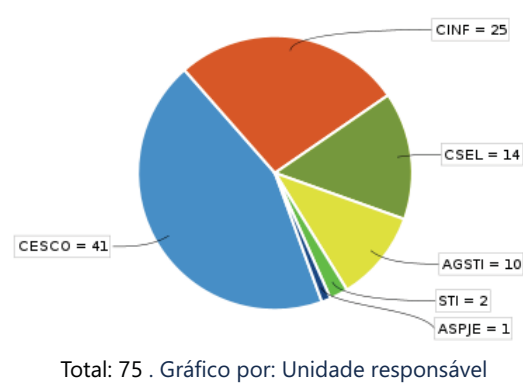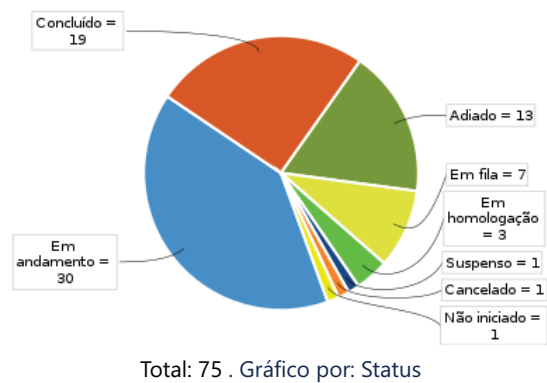

6.1. Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	EM ANDAMENTO	90	CESCO
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	EM ANDAMENTO	10	CESCO
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAAC	EM ANDAMENTO	30	CESCO
PDI-22-R1-14 - Eleições da Comunidade	EM ANDAMENTO	20	CSEL
PDI-22-R1-15 - Eleições Suplementares	EM ANDAMENTO		CSEL
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	EM ANDAMENTO	30	CESCO
PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI	EM ANDAMENTO	80	CESCO
PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (Acordo de colaboração TJ)	EM ANDAMENTO	70	CINF
PDI-22-R1-31 - Suporte às Eleições 2024	EM ANDAMENTO	10	AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL
PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023	EM ANDAMENTO	30	CSEL
PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede cabeada e sem fio	EM ANDAMENTO	30	CINF
PDI-22-R1-N-34 - Reaparelhamento dos serviços de impressão	EM ANDAMENTO	50	CINF
PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (ELECONS)	EM ANDAMENTO	90	CESCO, CSEL
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	EM ANDAMENTO		CESCO
PDI-22-R1-N-37 - Manutenção preventiva de urnas	EM ANDAMENTO		CSEL
PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante	EM ANDAMENTO	90	CINF
PDI-22-R1-N-42 - Eleição Suplementar de Cachoeira Alta	EM ANDAMENTO	90	CSEL
PDI-22-R1-N-43 - 12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH)	EM ANDAMENTO	10	CSEL
PDI-22-R1-N-45 - Eleição Suplementar de São Simão	EM ANDAMENTO		CSEL

6.2. Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	EM ANDAMENTO	60	CESCO
ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	EM ANDAMENTO	70	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	EM ANDAMENTO	80	CINF
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	EM ANDAMENTO	90	CINF
ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização	EM ANDAMENTO	80	AGSTI
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	EM ANDAMENTO	50	CESCO, CINF

6 itens

6.3. Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC	EM ANDAMENTO	80	STI
PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26	EM ANDAMENTO	70	AGSTI
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	EM ANDAMENTO	50	AGSTI
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	EM ANDAMENTO	50	AGSTI
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	EM ANDAMENTO	60	AGSTI
PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente	EM ANDAMENTO	10	AGSTI

6 itens

6.4. Projetos adiados e não iniciados

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	ADIADO	40	CESCO, CINF
ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados	ADIADO	90	CINF
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	ADIADO	70	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	ADIADO	40	CINF
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	ADIADO	40	CINF
ENS-22-R1-13 - Solução de Segurança do AD	ADIADO	90	CINF
ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF	ADIADO	20	CINF

ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	ADIADO	90	CINF, STI
PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	ADIADO	10	CESCO
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	ADIADO	20	CESCO, CINF
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	ADIADO	10	CESCO
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	ADIADO	10	CESCO
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	ADIADO	50	CESCO
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	NÃO INICIADO		CESCO, CINF

14 itens

6.5. Projetos/macro atividades com término previsto em até 60 dias

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável	Término Previsto	End Date (Baseline)
PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante	EM ANDAMENTO	90	CINF	30/jun/23	
PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI	EM ANDAMENTO	80	CESCO	30/jun/23	
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	EM ANDAMENTO	30	CESCO	30/jun/23	
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	EM ANDAMENTO	90	CESCO	30/jun/23	
PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26	EM ANDAMENTO	70	AGSTI	28/jul/23	
PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (ELECONS)	EM ANDAMENTO	90	CESCO, CSEL	31/jul/23	
PDI-22-R1-N-43 - 12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH)	EM ANDAMENTO	10	CSEL	02/ago/23	
PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede cabeada e sem fio	EM ANDAMENTO	30	CINF	30/set/23	
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	EM ANDAMENTO	10	CESCO	30/set/23	
PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023	EM ANDAMENTO	30	CSEL	06/out/23	
Eleição Suplementar de Turvelândia	SUSPENSO	20	CSEL		09/ago/23
Eleição Suplementar de São Simão	EM ANDAMENTO	50	CSEL		06/set/23
Patrimônio e Almoxarifado	EM ANDAMENTO	70	CSEL		30/set/23
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023 - CMDCA 2023	EM ANDAMENTO	50	CSEL		06/out/23

14 itens

6.6. Projetos concluídos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade Responsável
ENS-22-R1-08 - Solução de Antivírus	CONCLUÍDO	100	CINF
ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches	CONCLUÍDO	100	CINF
PDI-21-R1-16 - INF06 - JUS – Eleições 2022 e Atualização da Plataforma Microsoft	CONCLUÍDO	100	CINF
PDI-21-R1-18 - SIS21 - Auditse	CONCLUÍDO	100	CESCO
PDI-21-R1-19 - SIS20 - Adaptação do Sistema - SGRH	CONCLUÍDO	100	CESCO
PDI-22-R1-01 - Suporte às Eleições 2022	CONCLUÍDO	100	AGSTI, CESCO, CINF, CSEL
PDI-22-R1-02 - Implantação do RDC ARQ	CONCLUÍDO	100	CESCO
PDI-22-R1-03 - Atualização do Sistema de Diárias	CONCLUÍDO	100	CESCO
PDI-22-R1-04 - Atualização do Sistema de Gestão de Serviços Extraordinários (GSE)	CONCLUÍDO	100	CESCO
PDI-22-R1-06 - Implantar o Sistema de Gerenciamento de Propaganda Partidária Gratuita (SisAntena)	CONCLUÍDO	100	CESCO
PDI-22-R1-12 - Implantação de ferramenta automatizada de comunicação externa e prestação de serviços aos clientes cidadãos da Justiça Eleitoral em Goiás.	CONCLUÍDO	100	CESCO
PDI-22-R1-17 - eSocial – 4ª fase	CONCLUÍDO	100	CESCO
PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015	CONCLUÍDO	100	CINF, CSEL
PDI-22-R1-N-38 - Adequação da rede para o serviço VOIP	CONCLUÍDO	100	CINF
PDI-22-R1-N-40 - Eleição da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás - CIPA	CONCLUÍDO	100	CSEL
PDI-22-R1-N-41 - Eleição Suplementar de Iaciara	CONCLUÍDO	100	CSEL
PTE-22-R1-02 - Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral	CONCLUÍDO	100	CESCO
PTE-22-R1-22 - Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente	CONCLUÍDO	100	CESCO

18 itens

7. Anotações

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas.
- Augusto atualizará as informações do projeto PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC
- Augusto atualizará as informações do projeto PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle que entrou em andamento
- Dory atualizará as informações do projeto PDI-22-R1-N-45 - Eleição Suplementar de São Simão

PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições

Descrição

Desenvolvimento (Finalização) de Sistema de Substituição de Servidores, que envolve o processo indicação e designação de servidores para ocupação

de Funções de Confiança (FC) e Cargos Comissionados (CJ), por prazo determinado ou indeterminado.

Visa automatizar o processo de indicação e deferimento de substituições de cargos de direção, chefia e assessoramento no Tribunal

Meta: Automação do processo de indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança e Cargos Comissionados até setembro/2022.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	27/abr/22	27/abr/22	30/jun/23		CESCO	90

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	CONCLUÍDO						
Homologação do produto	EM ANDAMENTO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

Observações

- Concluída a adequação das aplicações para o domínio JUS.
- O término previsto será reprogramado.

PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores

Descrição

SEI: 22.0.000008626-0

Objetivo da demanda:

Desenvolver formulário pré preenchido de recadastramento de servidores, visando agilizar e otimizar o processo de revisão do cadastro de servidores.

Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

Facilitar o processo de solicitação de alteração de dados cadastrais pelos servidores, com a permissão de alteração de dados livres e possibilidade de solicitação de alteração de dados que exigem comprovação, com a anexação de documentos.

Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Macroprocesso de apoio: Gestão de Pessoas / Processo: Gestão do quadro de pessoal

Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

Facilidade e celeridade da execução do processo de recadastramento de servidores, tanto para o servidor quanto para a unidade responsável.

Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

8 - Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas.

Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):

Disponibilização de formulário eletrônico pré-preenchido com os dados dos servidores, com opção de solicitação de alteração, anexação de documentos e possibilidade de deferimento pela unidade responsável, com gravação automática no SGRH.

Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?

Não

Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:

Não se aplica

Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):

Não se aplica

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	27/fev/23	27/fev/23	30/set/23		CESCO	10

- Aguardando SGP enviar a relação de informações que serão recadastradas
- O SEI foi encaminhado para SGP

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC

Descrição

Promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal.

1 item Atualizar

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	29/abr/22	29/abr/22	19/dez/23		CESCO	30

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	EM ANDAMENTO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						
Implementação das funcionalidades	NÃO INICIADO						
Levantamento de requisitos da nova versão	NÃO INICIADO						

Observações

Realizada reunião com os usuários a respeito do plano de trabalho no dia 26/06/2023.

PDI-22-R1-14 - Eleições da Comunidade

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	29/abr/22	29/abr/22	15/abr/24		CSEL	20

1 item [Atualizar](#)

ETAPAS

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Sindicato dos Trabalhadores dos Correios – SINTECT/GO	CANCELADO	10	11/nov/22	14/nov/22	17/fev/23	13/dez/22		
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás - COSEMS/GO	CANCELADO	10	16/jan/23	16/jan/23	13/mar/23	09/fev/23		
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC	CANCELADO	10	16/jan/23	16/jan/23	01/mai/23	28/fev/23		
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES	CANCELADO	10	18/jan/23	18/jan/23	12/mai/23	09/mar/23		
Eleitor do Futuro - Colégio Espaço Pedagógico Educativo - Grêmios Estudantis	CONCLUÍDO	100	01/fev/23	01/fev/23	27/fev/23	27/fev/23		
Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás - COOTEGO	CONCLUÍDO	100	10/fev/23	10/fev/23	14/mar/23	10/mar/23		
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás - CIPA	CONCLUÍDO	100	10/mai/23	10/mai/23	31/mai/23	31/mai/23		
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023 - CMDCA 2023	EM ANDAMENTO	30	06/fev/23	06/fev/23	06/out/23		CSEL	

PDI-22-R1-15 - Eleições Suplementares

 ETAPAS

Resumo	Situação	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe	Execução%
Eleição Suplementar de Iaciara	CONCLUÍDO	09/jan/23	09/jan/23	15/mar/23	13/mar/23	CSEL	SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD	100
Eleição Suplementar de Cachoeira Alta	EM ANDAMENTO	12/jun/23	12/jun/23	09/ago/23		CSEL	SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD	40
Eleição Suplementar de Turvelândia	SUSPENSO	12/jun/23	12/jun/23	09/ago/23		CSEL	SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD	
Eleição Suplementar de São Simão	NÃO INICIADO					CSEL	SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD	

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO			30/jun/23		CESCO	30

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	EM ANDAMENTO						
Homologação do produto	NÃO INICIADO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

Observações

- Aguardando nivelamento de conhecimento do novo colaborador a respeito do projeto.
- Aguardando conclusão do desenvolvimento do escopo do projeto PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (ELECONS).
- O término previsto será reprogramado.
- Será realizada apresentação para as unidades.

PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI

Descrição

SEI nº: 21.0.000005057-9 (principal) e 21.0.000005046-3

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO			30/jun/23		CESCO	80

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Criação e configuração do ambiente de testes	CONCLUÍDO						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	CONCLUÍDO						
Realização de testes pela unidade demandante	CONCLUÍDO						
Validação do MFA (CISCO-DUO) no sistema	CONCLUÍDO						
Homologação do produto	EM ANDAMENTO						
Elaboração do manual de instalação e configuração do DUO	EM ANDAMENTO						
Disponibilização em ambiente de produção	NÃO INICIADO						

Observações

- Em testes na SJD <https://sei4-teste.trc-go.jus.br/sei/>
- Será configurado o DUO no SEI 3.5 até todos os servidores terem instalado nos seus aparelhos celulares para autenticação via MFA.
- O término previsto será reprogramado.

PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (17 postos do TJ)

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO			31/mar/24		CINF	70

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Execução%
Faina	CONCLUÍDO	17/mai/23	17/mai/23	23/mai/23		100
Perolândia	CONCLUÍDO					100
Caldazinha	CONCLUÍDO					100
Distrito Jardim ABC	CONCLUÍDO					100
Portelândia	CONCLUÍDO					100
Preparação de ambiente seguro e desenvolvimento de template	CONCLUÍDO					100
Rio Quente	CONCLUÍDO					100
Fazenda Nova - Novo Brasil	NÃO INICIADO					
Fazenda Nova - Jaupaci	NÃO INICIADO					
Fazenda Nova - Israelândia	NÃO INICIADO					
Luziânia - Jardim Ingá	NÃO INICIADO	31/jul/23				
Carmo do Rio Verde	EM ANDAMENTO	31/mai/23	31/mai/23	09/jun/23		10
Aporé	EM ANDAMENTO	17/mai/23	17/mai/23			
São Miguel do Passa Quatro	EM ANDAMENTO					

PDI-22-R1-31 - Suporte às Eleições 2024

Situação	Execução%	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável
EM ANDAMENTO	10	09/jan/23	09/jan/23	19/dez/24		AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL

MACROATIVIDADES

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH)	EM ANDAMENTO	20	12/jun/23	12/jun/23	02/ago/23		CSEL	
Voto Eletrônico	EM ANDAMENTO	30	12/dez/22	12/dez/22	20/dez/24		CSEL	
Cadastro Eleitoral	EM ANDAMENTO	90	23/jan/23	23/jan/23	20/dez/24		CSEL	

ATIVIDADES CADASTRO ELEITORAL

Resumo	Situação
Retorno Atendimento Biométrico - Santo Antônio do Descoberto - ZE 024	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Mineiros - ZE 021	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Planaltina - ZE 044	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Caçu - ZE 106	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Formosa - ZE 011	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Itajá - ZE 096	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Alvorada do Norte - ZE 123	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Cachoeira Alta - ZE 097	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Posse - ZE 029	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Quirinópolis - ZE 046	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - São Domingos - ZE 047	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Santa Helena de Goiás - ZE 066	CONCLUÍDO

Retorno Atendimento Biométrico - Campos Belos - ZE 105	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Paraúna - ZE 043	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Cavalcante - ZE 099	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Palmeiras de Goiás - ZE 020	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Alto Paraíso - ZE 143	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Jaraguá - ZE 017	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Padre Bernardo - ZE 131	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Goianésia - ZE 074	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Águas Lindas de Goiás - ZE 028	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Niquelândia - ZE 041	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Pirenópolis - ZE 026	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Uruaçu - ZE 050	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Piracanjuba - ZE 025	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Mara Rosa - ZE 088	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Caldas Novas - ZE 007	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Formoso - ZE 125	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Morrinhos - ZE 022	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Minaçu - ZE 130	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Goiatuba - ZE 038	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Porangatu - ZE 055	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Buriti Alegre - ZE 005	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Itumbiara - ZE 016	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Bom Jesus - ZE 124	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Crixás - ZE 085	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Pontalina - ZE 045	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Itapaci - ZE 039	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Ceres - ZE 072	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Itauçu - ZE 057	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Itaberaí - ZE 015	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Itapuranga - ZE 077	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - São Miguel do Araguaia - ZE 094	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Goiás - ZE 012	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Silvânia - ZE 031	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Pires do Rio - ZE 027	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Ipameri - ZE 014	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Catalão - ZE 008	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Cristalina - ZE 036	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Luziânia - ZE 019	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Cidade Ocidental - ZE 042	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Valparaíso - ZE 033	CONCLUÍDO

Retorno Atendimento Biométrico - Novo Gama - ZE004	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Alexânia - ZE 087	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Jataí - ZE 018	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Acreúna - ZE 128	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Edeia - ZE 068	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Jussara - ZE 095	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Aragarças - ZE 035	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Piranhas - ZE 102	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Caiapônia - ZE 006	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Iporá - ZE 053	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - São Luis de Montes Belos - ZE 080	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Firminópolis - ZE 063	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Formoso - ZE 125	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Guapó - ZE 056	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Inhumas - ZE 013	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Bela Vista de Goiás - ZE 032	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Goianira - ZE 101	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Trindade - ZE 049	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Senador Canedo - ZE 040	CONCLUÍDO
Atendimento Biométrico - Elaboração do Treinamento	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Aparecida de Goiânia - ZE 119, 132 e 145	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Anápolis - ZE 003, 141 e 144	CONCLUÍDO
Retorno do Atendimento Biométrico - Goiânia - ZE 001, 002, 127, 133, 134, 135, 136, 146 e 147	CONCLUÍDO
Retorno Atendimento Biométrico - Nerópolis - ZE 054	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Rubiataba - ZE 076	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Mozarlândia - ZE 110	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Rio Verde - ZE 030 e 140	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Anicuns - ZE 034	EM ANDAMENTO
Retorno Atendimento Biométrico - Fazenda Nova - ZE 079	EM ANDAMENTO

 ATIVIDADES VOTO ELETRÔNICO

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Manutenção das Urnas	EM ANDAMENTO	70	13/fev/23	02/mai/23	30/ago/24		CSEL	CSEL
Distribuição das urnas - Eleições 2024	NÃO INICIADO							
Preparação de	NÃO INICIADO							

Materiais

Aquisição de Suprimentos de Urna	NÃO INICIADO							
Recolhimento das urnas - Eleições 2022	CONCLUÍDO	100	12/dez/22	12/dez/22	15/mai/23	12/mai/23	CSEL	CSEL
Patrimônio e Almoxarifado	CONCLUÍDO	100	14/jun/23	14/jun/23	23/jun/23	23/jun/23	CSEL	SEVIN

ATIVIDADES 12º SIMULADO NACIONAL DE HARDWARE (12SNH)

Resumo	Situação	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Planejamento do Simulado de Hardware	CONCLUÍDO	12/jun/23	12/jun/23	14/jun/23	12/jun/23	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD
Configuração da Eleição - CFE	CONCLUÍDO	19/jun/23		21/jun/23		CSEL	CSEL
Concessão de Autorizações nos sistemas SISTOT, SIMON, MSSB e SOS	CONCLUÍDO	22/jun/23		23/jun/23		STI	CSEL
Definição da ZE/Seções, Preparação e Replicação dos eleitores com biometria (ELO/MSSB)	CONCLUÍDO	24/jul/23		04/ago/23		CSEL	SECAD
Solicitação de geração dos pacotes no Intercad	EM ANDAMENTO	06/jul/23		07/jul/23		CSEL	SECAD
Preparação/Separação das urnas	EM ANDAMENTO	17/jul/23		18/jul/23		CSEL	SEVIN
Geração e Validação dos pacotes no Intercad (município/zona, eleitores, seção e complemento município)	NÃO INICIADO	10/jul/23		11/jul/23		CSEL	SECAD
Importação dos Dados no SISTOT (Candidatos e Seções)	NÃO INICIADO	13/jul/23		14/jul/23		CSEL	SESEL
Instalação dos Softwares necessários à realização do evento	NÃO INICIADO	17/jul/23		18/jul/23		CSEL	SEVIN
Geração de mídias	NÃO INICIADO	19/jul/23		20/jul/23		CSEL	SEVIN
Carga das Urnas (183 Urnas Eletrônicas por dia)	NÃO INICIADO	21/jul/23		27/jul/23		CSEL	SEVIN
Transmissão das Correspondências	NÃO INICIADO	21/jul/23		27/jul/23		CSEL	SEVIN
Validação da Transmissão das Correspondências	NÃO INICIADO	21/jul/23		27/jul/23		CSEL	SESEL
Votação de 120 MRV por dia - Qtde: 600 (140 UE10, 27 UE11,	NÃO INICIADO	24/jul/23		28/jul/23		CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD

43 UE13, 107 UE15 e 283
UE20)

Impressão do Ambiente de Votação	NÃO INICIADO	31/jul/23	31/jul/23	CSEL	SESEL
Impressão da Zerésima	NÃO INICIADO	31/jul/23	31/jul/23	CSEL	SESEL
Transmissão do BU	NÃO INICIADO	31/jul/23	01/ago/23	CSEL	SESEL
Validação dos Resultados no SISTOT	NÃO INICIADO	01/ago/23	02/ago/23	CSEL	SESEL

Observações

Situação de retorno de coletas biométricas

- Falta a instalação do kit biométrico na Zona 54 (Nerópolis) previsto para 28/07.
- As 07 Zonas que ainda não iniciaram o atendimento biométrico deverão retornar dia 31/07.

PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023

Descrição
- https://www.tre-go.jus.br/eleicoes/eleicoes-da-comunidade/conselhos-tutelares-2023 - Data da eleição: 01/10/2023

Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável
EM ANDAMENTO	30	06/fev/23	06/fev/23	06/out/23		CSEL

 ATIVIDADES

Resumo	Situação	Execução%	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe
Reunião Inicial com os representantes dos Conselhos Tutelares	CONCLUÍDO	100	09/fev/23	09/fev/23	09/fev/23	09/fev/23	CSEL	SESEL, SEVIN, CSEL
Elaboração do Questionário para os Conselhos Tutelares	CONCLUÍDO	100	09/fev/23	09/fev/23	17/fev/23	14/fev/23	CSEL	SESEL
Elaboração da Resolução com calendário das principais Etapas	CONCLUÍDO	100	09/fev/23	09/fev/23	28/fev/23	24/fev/23	CSEL	CSEL
Tramitação e Publicação da Resolução com calendário das principais Etapas	CONCLUÍDO	100	24/fev/23	24/fev/23	14/mar/23	27/abr/23	CSEL	CSEL
Reunião com os Conselhos Tutelares - Orientações Gerais	CONCLUÍDO	100	15/mar/23	15/mar/23	15/mar/23	15/mar/23	CSEL	SESEL, SEVIN, CSEL
Elaboração da página das Eleições dos Conselhos Tutelares na Internet	CONCLUÍDO	100	16/mar/23	16/mar/23	24/mar/23	18/mai/23	CSEL	CSEL
Elaboração do Fluxo do Processo	CONCLUÍDO	100	20/mar/23	20/mar/23	31/mar/23	30/mar/23	CSEL	CSEL

(Recebimento do
Pedido até a
Totalização dos
Resultados)

Reunião para elaboração do Sistema de ComuniCANDEX	CONCLUÍDO	100	03/abr/23	03/abr/23	03/abr/23	03/abr/23	CSEL	SESCO, CESCO
Desenv. Sist. EleCons - Etapa 1 (Cadastro dos dados, Conselhos, Representantes e Locais de Votação)	CONCLUÍDO	100	10/abr/23	10/abr/23	30/mai/23	02/jun/23	CSEL	SESCO, CESCO
Reunião de Alinhamento e fechamento do Planejamento	CONCLUÍDO	100	05/jun/23	05/jun/23	05/jun/23	05/jun/23	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD
Cadastro dos usuários do Elecons (Oficial)	CONCLUÍDO	90	05/jun/23	08/jun/23	03/jul/23		CSEL	SESEL
Desenv. Sist. EleCons - Etapa 2 (Definição de Locais e Urnas)	CONCLUÍDO	100	05/jun/23	05/jun/23	23/jun/23	29/jun/23	CSEL	SESCO, CESCO
Desenv. Sist. EleCons - Etapa 3 (Cadastro dos Candidatos)	CONCLUÍDO	100	05/jun/23	05/jun/23	23/jun/23	19/jun/23	CSEL	SESCO, CESCO
Disponibilizar, na internet, os municípios que serão atendidos (urnas eletrônicas ou de lona)	EM ANDAMENTO	90	12/jun/23	12/jun/23	12/jun/23		CSEL	CSEL
Locais de Votação e Agregação de Seções (CMDCA)	EM ANDAMENTO	50	19/jun/23	19/jun/23	14/jul/23		CSEL	SESEL
Disponibilizar, na internet, o quantitativo de eleitores por seção eleitoral nos locais de votação	EM ANDAMENTO		07/jul/23		07/jul/23		CSEL	SECAD
Registro de Candidatos (CMDCA)	EM ANDAMENTO		17/jul/23		04/ago/23		CSEL	SESEL
Desenv. Sist. EleCons - Etapa 4 (Caderno de Votação)	EM ANDAMENTO		26/jun/23	26/jun/23	07/jul/23		CSEL	SESCO, SECAD, CESCO
Desenv. Sist. EleCons - Etapa	NÃO INICIADO		17/jul/23		31/jul/23		CSEL	SESCO, CESCO

5 (Cadastro do Suporte Técnico)

Registro de Suporte Técnico (CMDCA)	NÃO INICIADO	01/ago/23	31/ago/23	CSEL	SECAD
Configuração do Parametrizador (Versão: Onça Pintada)	NÃO INICIADO	03/jul/23	07/jul/23	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD
Teste dos Sistemas Parametrizador, GEDAI e Sistemas de Urna (Versão: Onça Pintada)	NÃO INICIADO	05/jun/23	14/jul/23	CSEL	SESEL, SEVIN
Teste da Parametrização (Versão: Onça Pintada) com urna	NÃO INICIADO	12/jun/23	16/jun/23	CSEL	SEVIN
Adaptação do Sistemas de Geração de Etiquetas	NÃO INICIADO	31/jul/23	11/ago/23	CSEL	CSEL
Parametrização Oficial (Versão: Onça Pintada)	NÃO INICIADO	31/jul/23	11/ago/23	CSEL	SESEL
Validação dos Candidatos (Número, Nome, Foto) (CMDCA)	NÃO INICIADO	14/ago/23	18/ago/23	CSEL	SESEL
Preparação Material - Técnico Urna	NÃO INICIADO	01/ago/23	18/ago/23	CSEL	SEVIN
Preparação Material - Mesário	NÃO INICIADO	01/ago/23	18/ago/23	CSEL	SEVIN
Validação Final da Eleição (Parâmetros, Locais, Agregações, Candidatos e Eleitores) (CMDCA)	NÃO INICIADO	21/ago/23	01/set/23	CSEL	SESEL
Gerar etiquetas	NÃO INICIADO	31/ago/23	06/set/23	CSEL	SESEL
Geração de Mídias	NÃO INICIADO	04/set/23	26/set/23	CSEL	SESEL
Carga e Lacre das Urnas	NÃO INICIADO	11/set/23	26/set/23	CSEL	SEVIN
Transporte das Urnas para as Zonas Eleitorais	NÃO INICIADO	13/set/23	27/set/23	CSEL	SEVIN
Treinamento Mesário	NÃO INICIADO	18/set/23	26/set/23	CSEL	SEVIN

Treinamento Técnico de Urna	NÃO INICIADO	25/set/23	28/set/23	CSEL	SEVIN
Entrega das Urnas pelas Zonas Eleitorais para os CMDCA's	NÃO INICIADO	28/set/23	29/set/23	CSEL	SEVIN
Suporte às Eleições dos Conselhos Tutelares	NÃO INICIADO	30/set/23	01/out/23	CSEL	SEAID, SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD
Observações					
Cadastradas as solicitações de 228 municípios sendo 211 com urna eletrônica e 17 com urna de lona.					

PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede cabeada e sem fio

Descrição

SEI n° 23.0.000003147-0

Aquisição de Solução de rede cabeada (LAN e TOR) e sem fio (Wi-fi) com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral.

Portaria DG N° 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	28/fev/23	28/fev/23	30/set/23		CINF	30

ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Elaboração do DOD.	CONCLUÍDO	20/fev/23	20/fev/23	28/fev/23	28/fev/23	CINF	100
Elaboração do ETP.	CONCLUÍDO	20/mar/23	20/mar/23	19/mai/23	18/mai/23	CINF	100
Elaboração do TR.	EM ANDAMENTO						10
Processo de licitação.	NÃO INICIADO						
Execução da ARP.	NÃO INICIADO						
Implementação da solução.	NÃO INICIADO						

Observações

Estudos técnicos preliminares assinados pela equipe de planejamento da contratação.

PDI-22-R1-N-34 - Reaparelhamento dos serviços de impressão

Descrição						
SEI nº 23.0.000002396-5						

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	13/fev/23	13/fev/23	18/dez/23		CINF	50

 ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Processo de licitação.	EM ANDAMENTO						
Implantação da solução.	NÃO INICIADO						
Execução da ARP.	NÃO INICIADO						
Elaboração do TR.	CONCLUÍDO						100
Elaboração do ETP.	CONCLUÍDO						100
Elaboração do DOD.	CONCLUÍDO						100

Observações

Impedimento: aguardando aprovação do TR desde 19/06.
--

PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (ELECONS)

Descrição

As Eleições da Comunidade utilizam os sistemas eleitorais oficiais nas urnas eletrônicas, porém para que os dados esteja disponíveis no sistema GEDAI, responsável pela geração das mídias, o TSE disponibiliza o sistema PARAMETRIZADOR.

O processo de preparação das Eleições da Comunidade, até então realizado no sistema PARAMETRIZADOR de maneira manual, demandava um esforço enorme da equipe, composta de 03 servidores.

No sistema são cadastrados desde de dados como dia da eleição, horário de início da impressão da zerésima, horário de início e término da votação, os cargos, quantidade de votos por eleitor, dados dos partidos, locais de votação, dados dos candidatos, etc.

Com a criação do Sistema ELECONS, foi possível gerar os dados para serem importados automaticamente no sistema, o que trás maior segurança e agilidade aos processo de preparação das eleições.

Através do Sistema ELECONS a própria entidade solicitante fica responsável por preencher os dados necessários no sistemas web, tais como a quantidade de votos por eleitor, os locais de votação, a quantidade de urnas por local, agregação de seções, o cadastramento dos dados dos candidatos, inclusive com o upload da foto dos candidatos. O sistema também gera o caderno de votação.

Este sistema permitiu uma automatização do processo de coleta de dados, anteriormente enviados por email, o que dificultava muito o controle das atividades.

- Link para o ambiente de teste do sistema: <https://elecons.tre-go.jus.br>

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	03/abr/23	03/abr/23	31/jul/23		CESCO, CSEL	70

i ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Desenvolvimento da funcionalidade de registro de candidaturas	CONCLUÍDO						
Primeira etapa de cadastro dos Conselhos, informações para configuração dos sistemas e definição dos locais de votação concluída.	CONCLUÍDO						
Desenvolvimento da funcionalidade de agregação	CONCLUÍDO						
Desenvolvimento da funcionalidade de geração de caderno de votação	EM ANDAMENTO						

PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante

Descrição

Projeto de instalação de links internet dedicados redundantes nos Cartórios Eleitorais.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO			30/jun/23		CINF	90

ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Equipe	Execução%
Processo de contratação.	CONCLUÍDO							
Preparação da infraestrutura de rede.	CONCLUÍDO							
Reunião de planejamento da implantação.	CONCLUÍDO							
Implantação dos links nos cartórios eleitorais.	EM ANDAMENTO							

Observações

- Foram instalados 75 links de 78. (96%)
- O término previsto foi reprogramado para **04/08** em razão da reformas dos cartórios de Cidade Ocidental e Nerópolis.

Suporte ao Sorteio do Horário Eleitoral	CONCLUÍDO	29/jun/23	29/jun/23	03/jul/23	03/jul/23	CSEL	SESEL	100
Suporte à TTE (Ex: Mesário)	CONCLUÍDO	03/jul/23	03/jul/23	10/jul/23		CSEL	SECAD	
Sistema - Alimentação de mesários: Recibos	NÃO INICIADO	31/jul/23		04/ago/23		CSEL	SEDIS	
Geração de Mídias	NÃO INICIADO	02/ago/23		02/ago/23		CSEL	SEVIN	
Auditoria dos Sistemas - Evento de Geração de Mídias (GEDAI, HotSwap, SIS)	NÃO INICIADO	03/ago/23		04/ago/23		CSEL	SESEL, SEVIN	
Evento de Carga e Lacre das Urnas	NÃO INICIADO	03/ago/23		04/ago/23		CSEL	SESEL, SEVIN	
Auditoria das Urnas - Evento de Carga e Lacre	NÃO INICIADO	03/ago/23		04/ago/23		CSEL	SESEL, SEVIN	
Suporte à Montagem de Seção	NÃO INICIADO	05/ago/23		05/ago/23		CSEL	SEVIN	
Auditoria das Urna - Evento Dia da Eleição	NÃO INICIADO	06/ago/23		06/ago/23		CSEL	SEVIN	
Suporte à Urna no dia Eleição	NÃO INICIADO	06/ago/23		06/ago/23		CSEL	SEVIN	
Suporte à Transmissão, Apuração e Totalização dos Resultados	NÃO INICIADO	06/ago/23		06/ago/23		CSEL	SESRE, SESEL, SEVIN	
Plantão de Suporte aos Sistemas Eleitorais	EM ANDAMENTO	27/jun/23	27/jun/23	09/ago/23		CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD	
Suporte à Convocação de Mesários	EM ANDAMENTO	03/jul/23	03/jul/23	10/jul/23		CSEL	SECAD	
Preparação das Urnas Eletrônicas	EM ANDAMENTO	31/jul/23		01/ago/23		CSEL	SEVIN	
Suporte ao Fechamento do Registro de Candidaturas	EM ANDAMENTO	02/ago/23		02/ago/23		CSEL	SESEL	

PDI-22-R1-N-43 - 12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH)

Situação	Start Date (Baseline)	Target Start	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe	Execução%	
EM ANDAMENTO	12/jun/23		02/ago/23		CSEL		20	
ATIVIDADES								
Resumo	Situação	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe	Execução%
Planejamento do Simulado de Hardware	CONCLUÍDO	12/jun/23	12/jun/23	14/jun/23	12/jun/23	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD	100
Configuração da Eleição - CFE	CONCLUÍDO	19/jun/23		21/jun/23		CSEL	CSEL	
Concessão de Autorizações nos sistemas SISTOT, SIMON, MSSB e SOS	CONCLUÍDO	22/jun/23		23/jun/23		STI	CSEL	
Definição da ZE/Seções, Preparação e Replicação dos eleitores com biometria (ELO/MSSB)	CONCLUÍDO	24/jul/23		04/ago/23		CSEL	SECAD	
Geração e Validação dos pacotes no Intercad (município/zona, eleitores, seção e complemento município)	NÃO INICIADO	10/jul/23		11/jul/23		CSEL	SECAD	
Importação dos Dados no SISTOT (Candidatos e Seções)	NÃO INICIADO	13/jul/23		14/jul/23		CSEL	SESEL	
Instalação dos Softwares necessários à realização do evento	NÃO INICIADO	17/jul/23		18/jul/23		CSEL	SEVIN	
Geração de mídias	NÃO INICIADO	19/jul/23		20/jul/23		CSEL	SEVIN	
Carga das Urnas (183 Urnas Eletrônicas por dia)	NÃO INICIADO	21/jul/23		27/jul/23		CSEL	SEVIN	
Transmissão das Correspondências	NÃO INICIADO	21/jul/23		27/jul/23		CSEL	SEVIN	
Validação da Transmissão das Correspondências	NÃO INICIADO	21/jul/23		27/jul/23		CSEL	SESEL	

Votação de 120 MRV por dia - Qtde: 600 (140 UE10, 27 UE11, 43 UE13, 107 UE15 e 283 UE20)	NÃO INICIADO	24/jul/23	28/jul/23	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD
Impressão do Ambiente de Votação	NÃO INICIADO	31/jul/23	31/jul/23	CSEL	SESEL
Impressão da Zerésima	NÃO INICIADO	31/jul/23	31/jul/23	CSEL	SESEL
Transmissão do BU	NÃO INICIADO	31/jul/23	01/ago/23	CSEL	SESEL
Validação dos Resultados no SISTOT	NÃO INICIADO	01/ago/23	02/ago/23	CSEL	SESEL
Solicitação de geração dos pacotes no Intercad	EM ANDAMENTO	06/jul/23	07/jul/23	CSEL	SECAD
Preparação/Separação das urnas	EM ANDAMENTO	17/jul/23	18/jul/23	CSEL	SEVIN

PDI-22-R1-N-44 - Eleição Suplementar de Turvelândia

Descrição								
- SEI: 23.0.000009641-5 - Data da eleição: 06 de agosto								
Situação	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe	Execução%	
SUSPENSO	12/jun/23	12/jun/23	09/ago/23		CSEL	SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD		
<i>i</i> ATIVIDADES								
Resumo	Situação	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe	Execução%
Configuração da Eleição - CFE	CONCLUÍDO	26/jun/23	26/jun/23	26/jun/23	26/jun/23	CSEL	CSEL	100
Solicitação Publicação do Processo e Sistemas Eleitorais	CONCLUÍDO	26/jun/23	26/jun/23	26/jun/23	26/jun/23	CSEL	CSEL	100
Solicitação das Senhas Oficiais	CONCLUÍDO	26/jun/23	26/jun/23	26/jun/23	26/jun/23	CSEL	CSEL	100
Liberação de Acesso aos Sistemas	CONCLUÍDO	27/jun/23	27/jun/23	27/jun/23	27/jun/23	CSEL	SESEL	100
Planejamento - Logística de Suporte à Eleição	CONCLUÍDO	27/jun/23	27/jun/23	28/jun/23	28/jun/23	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD	100
Suporte à Entrega do Registro de Candidaturas	CONCLUÍDO	27/jun/23	27/jun/23	29/jun/23	29/jun/23	CSEL	SESEL	100
Suporte à Agregações de Seção	CONCLUÍDO	27/jun/23	27/jun/23	03/jul/23	03/jul/23	CSEL	SECAD	100
Suporte ao Sorteio do Horário Eleitoral	CONCLUÍDO	29/jun/23	29/jun/23	03/jul/23	03/jul/23	CSEL	SESEL	100
Preparação das Urnas Eletrônicas	NÃO INICIADO	31/jul/23		01/ago/23		CSEL	SEVIN	
Sistema - Alimentação de mesários: Recibos	NÃO INICIADO	31/jul/23		04/ago/23		CSEL	SEDIS	
Suporte ao Fechamento do Registro de Candidaturas	NÃO INICIADO	02/ago/23		02/ago/23		CSEL	SESEL	
Geração de Mídias	NÃO INICIADO	02/ago/23		02/ago/23		CSEL	SEVIN	

Auditoria dos Sistemas - Evento de Geração de Mídias (GEDAI, HotSwap, SIS)	NÃO INICIADO	03/ago/23		04/ago/23	CSEL	SESEL, SEVIN	
Evento de Carga e Lacre das Urnas	NÃO INICIADO	03/ago/23		04/ago/23	CSEL	SESEL, SEVIN	
Auditoria das Urnas - Evento de Carga e Lacre	NÃO INICIADO	03/ago/23		04/ago/23	CSEL	SESEL, SEVIN	
Suporte à Montagem de Seção	NÃO INICIADO	05/ago/23		05/ago/23	CSEL	SEVIN	
Auditoria das Urna - Evento Dia da Eleição	NÃO INICIADO	06/ago/23		06/ago/23	CSEL	SEVIN	
Suporte à Urna no dia Eleição	NÃO INICIADO	06/ago/23		06/ago/23	CSEL	SEVIN	
Suporte à Transmissão, Apuração e Totalização dos Resultados	NÃO INICIADO	06/ago/23		06/ago/23	CSEL	SESRE, SESEL, SEVIN	
Ofício DG - enviar para o TSE - Confirmação da Eleição Suplementar	EM ANDAMENTO	22/jun/23		23/jun/23	DG	CSEL	100
Solicitação da Impressão dos Cadernos de Votação	EM ANDAMENTO	04/jul/23		04/jul/23	CSEL	SECAD	
Plantão de Suporte aos Sistemas Eleitorais	EM ANDAMENTO	27/jun/23	27/jun/23	09/ago/23	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD	
Suporte à Convocação de Mesários	EM ANDAMENTO	03/jul/23	03/jul/23	10/jul/23	CSEL	SECAD	
Suporte à TTE (Ex: Mesário)	EM ANDAMENTO	03/jul/23	03/jul/23	10/jul/23	CSEL	SECAD	

Observações

- Aguardando o Calendário Eleitoral
- O projeto teve a sua situação alterada para suspenso, para aguardar o julgamento do agravo interposto (SEI nº 23.0.000010456-6)

PDI-22-R1-N-45 - Eleição Suplementar de São Simão

Descrição							
• SEI: 23.0.000009641-5 • SEI: 23.0.000009670-9 • Data da eleição: 06 de agosto							
Situação	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe	Execução%
EM ANDAMENTO					CSEL	SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD	

 ATIVIDADES

Resumo	Situação	Start Date (Baseline)	Start Date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade Responsável	Equipe	Execução%
Configuração da Eleição - CFE	NÃO INICIADO							
Solicitação Publicação do Processo e Sistemas Eleitorais	NÃO INICIADO							
Solicitação das Senhas Oficiais	NÃO INICIADO							
Liberação de Acesso aos Sistemas	NÃO INICIADO							
Planejamento - Logística de Suporte à Eleição	NÃO INICIADO							
Suporte à Entrega do Registro de Candidaturas	NÃO INICIADO							
Plantão de Suporte aos Sistemas Eleitorais	NÃO INICIADO							
Suporte ao Sorteio do Horário Eleitoral	NÃO INICIADO							
Suporte à Convocação de Mesários	NÃO INICIADO							
Suporte à Agregações de Seção	NÃO INICIADO							
Suporte à TTE (Ex: Mesário)	NÃO INICIADO							
Solicitação da Impressão dos Cadernos de Votação	NÃO INICIADO							
Suporte ao Fechamento do	NÃO INICIADO							

Registro de
Candidaturas

Preparação das Urnas
Eletrônicas

NÃO INICIADO

Geração de Mídias

NÃO INICIADO

Auditoria dos Sistemas
- Evento de Geração
de Mídias (GEDAI,
HotSwap, SIS)

NÃO INICIADO

Evento de Carga e
Lacre das Urnas

NÃO INICIADO

Auditoria das Urnas -
Evento de Carga e
Lacre

NÃO INICIADO

Sistema - Alimentação
de mesários: Recibos

NÃO INICIADO

Suporte à Montagem
de Seção

NÃO INICIADO

Auditoria das Urna -
Evento Dia da Eleição

NÃO INICIADO

Suporte à Urna no dia
Eleição

NÃO INICIADO

Suporte à Transmissão,
Apuração e Totalização
dos Resultados

NÃO INICIADO

Ofício DG - enviar para
o TSE - Confirmação
da Eleição
Suplementar

EM ANDAMENTO

ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software

Descrição							
Possui o intuito de estabelecer padrões de segurança no desenvolvimento de software.							
Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%	
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CESCO	60	
ETAPAS							
Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						100
Elaboração da minuta do documento normativo	EM ANDAMENTO						

ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação

Descrição
Dispõe sobre as regras e os procedimentos para gestão de incidentes de segurança da informação do TRE-GO.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI, CESCO, CINF	60

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Mapeamento do processo de trabalho	CONCLUÍDO						
Análise da minuta do normativo pela Assessoria da Diretoria Geral	EM ANDAMENTO						
Publicação do normativo	NÃO INICIADO						

Observações

Será marcada reunião com o CTGTI para validar os protocolos de investigação e prevenção de incidentes e ilícitos cibernéticos e a norma de gestão de incidentes.
--

ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas

Descrição

SEI 1975-9

Possui o objetivo de proteger, controlar, gerenciar, auditar e monitorar contas privilegiadas a ativos críticos do TRE-GO.

São considerados ativos críticos:

- Equipamentos servidores físicos e virtuais que hospedam todos os sistemas eleitorais, administrativos e judiciais;
- Servidores de Banco de Dados;
- Servidores de Arquivos Corporativos;
- Servidores de Correio Eletrônico;
- Equipamentos Firewalls, Balanceadores de Carga, Switches de Rede, Proxy, Contas de Serviços, dentre outros.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	80

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Aquisição	CONCLUÍDO						
Instalação e configuração	CONCLUÍDO						
Transferência de conhecimento	CONCLUÍDO						
Disponibilizar em produção - ambiente Microsoft.	EM ANDAMENTO						
Disponibilizar em produção - ambiente Linux.	EM ANDAMENTO						

ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)

Descrição
SEI 6237-9
Ferramenta que possui a finalidade de prover uma autenticação mais segura dos usuários de sistemas informatizados, por meio da confirmação da identidade do usuário, em dois ou mais momentos, antes de liberar o seu acesso a um determinado sistema.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	90

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Aquisição	CONCLUÍDO						
Instalação e configuração	CONCLUÍDO						
Transferência de conhecimento	CONCLUÍDO						
Máquinas dos postos avançados - Prefeitura/TJ - uso da VPN.	CONCLUÍDO						
Máquinas da JE - Home Office - uso de VPN.	CONCLUÍDO						
Disponibilizar em produção - Portal internet.	CONCLUÍDO						
Disponibilizar em produção - Sistema SEI 3.5/4.0	EM ANDAMENTO						
Disponibilizar em produção - E-mail.	EM ANDAMENTO						

ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização

Descrição

SEI 3619-0

As pessoas são o elo mais fraco quando falamos em segurança cibernética. Costumam ser a porta de entrada para criminosos cibernéticos invadirem a rede, roubarem informações valiosas e causarem grandes prejuízos financeiros e de imagem às instituições. Treinar e conscientizar pessoas é primordial para o fortalecimento da segurança da infraestrutura tecnológica e dos dados pessoais.

A contratação de solução para conscientização em segurança da informação está prevista na Estratégia Nacional de Cibersegurança da Justiça Eleitoral . A estratégia prevê que os servidores e colaboradores devem ser capacitados a fim de reduzir os riscos na área de segurança cibernética. É importante que os funcionários entendam os objetivos da segurança da informação e o impacto potencial, positivo e negativo d seu próprio comportamento na organização.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	80

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Aquisição	CONCLUÍDO						
Instalação e configuração	CONCLUÍDO						
Transferência de conhecimento	CONCLUÍDO						
Implantação	EM ANDAMENTO						

ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos

Descrição

O uso de recursos criptográficos visa proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos pelas redes de computadores, assim como dos dados em repouso, armazenados em servidores, microcomputadores, dispositivos móveis e bancos de dados.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CESCO, CINF	50

ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.	EM ANDAMENTO						
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS - Bitlocker.	EM ANDAMENTO						
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS - Bitlocker.	EM ANDAMENTO						
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores e Bancos de dados.	NÃO INICIADO						
Implantação de criptografia em notebooks standalone - Bitlocker.	NÃO INICIADO						
Planejamento	CONCLUÍDO						
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.	CONCLUÍDO						
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Linux.	CONCLUÍDO						
Implantação de criptografia em conexões VPN.	CONCLUÍDO						
Implantação de criptografia do Portal de acesso externo - escritório remoto.	CONCLUÍDO						

PTE-22-R1-06 - Compôr o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC

Descrição

Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estabelecido no Guia

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		STI	80

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, alinhado ao número de usuários internos e externos de recursos de TIC conforme referencial mínimo estabelecido no Guia	CONCLUÍDO					STI	100
Propor a adequação dos recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos da atividade anterior	EM ANDAMENTO					STI	

Observações

Está sendo elaborada a proposta de adequação dos recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos para encaminhamento à Alta Administração.

PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26

Descrição ▾
Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD e encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica.
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	28/jul/23		AGSTI	70

i ATIVIDADES							
Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Elaborar e acompanhar o Plano de Trabalho, conforme critérios da ENTIC	CONCLUÍDO					AGSTI	
Enviar o Plano de Trabalho ao CNJ	CONCLUÍDO					AGSTI	
Mapear e/ou validar processo de publicação e divulgação periódica de planos junto aos repositórios nacional e regional, designando responsáveis	EM ANDAMENTO					AGSTI	

PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC

Descrição

Definir processos de continuidade de serviços de TI, em caso de eventos de causas naturais, acidentais, tecnológicas ou humanas.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	50

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Estabelecer Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papeis e responsabilidades	EM ANDAMENTO						
Estabelecer o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC	EM ANDAMENTO						
Transferência de conhecimento	NÃO INICIADO						
Testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC	NÃO INICIADO						

Impedimentos

Foram priorizados a implementação e manuais da Portaria CNJ 162/2021, o levantamento do atendimento do SLA, a publicação dos artefatos da contratação (ETP, DOD, TR.), elaboração do Plano de Transformação Digital.

PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC

Descrição

Os projetos de Tecnologia da Informação, deverão passar por análise de riscos de segurança da informação antes de sua implementação.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	50

 ETAPAS

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Mapeamento do processo de trabalho	EM ANDAMENTO						
Elaborar, revisar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado com o plano institucional de gestão de riscos	EM ANDAMENTO						
Transferência de conhecimento	NÃO INICIADO						
Implantação	NÃO INICIADO						

Impedimentos

Foram priorizados a implementação e manuais da Portaria CNJ 162/2021, o levantamento do atendimento do SLA, a publicação dos artefatos da contratação (ETP, DOD, TR.), elaboração do Plano de Transformação Digital.

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

Descrição

SEI nº:

Objetivo da demanda:

Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.

Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

A falta catalogação dos ativos de TI, tanto *hardware* quanto *software*, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataques cibernéticos de qualquer natureza.

Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Gestão de TI e apoio à Governança

Desenvolvimento e administração de soluções de TIC

Gestão de infraestrutura de TIC

Suporte técnico das soluções de TIC

Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

1. Visibilidade de todo o parque de *hardware* do Tribunal.
2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional.
3. Visibilidade de todos os *softwares* em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.

Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados

Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados.

Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026

Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):

Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?

Não

Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:

Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):

Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em *Software* Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		AGSTI	60

ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Planejamento	CONCLUÍDO						
Mapeamento do processo de trabalho	CONCLUÍDO						
Elaboração da minuta do documento normativo	CONCLUÍDO						
Aquisição da solução	CONCLUÍDO						
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	EM ANDAMENTO					CESCO, CINF, CSEL	
Instalação e configuração da solução	EM ANDAMENTO						
Transferência de conhecimento	NÃO INICIADO						
Implantação	NÃO INICIADO						
Estabelecer rotina de, regularmente, avaliar o parque, inventariar ativos, auditar e tratar não conformidades relativas aos registros dos ativos no CMDB, abrangendo hardwares, softwares, links etc.	NÃO INICIADO						

Impedimento

Aguardando o término do projeto PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante

PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente

Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
EM ANDAMENTO	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		AGSTI	10

 ATIVIDADES

Resumo	Situação	Início Previsto	Início Real	Término Previsto	Término Real	Unidade Responsável	Execução%
Análise dos modelos de governança de serviços de TIC existentes	CONCLUÍDO						
Implementar/Avaliar processos de gerenciamento de serviços que impactem a satisfação dos usuários	EM ANDAMENTO					AGSTI	
Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções	ADIADO						
Implementar as soluções priorizadas	ADIADO						
