



ATA

REUNIÃO CTGTI - 17/2023

1. Identificação

Data da reunião: 20 de set. de 2023	Início: 14:27h Término: 16:51h	Local: Sala de reunião da STI
Objetivo da reunião: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados.


5. Participantes da reunião

Nome	Unidade	E-mail
Frank Wendell Ribeiro	STI	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	AGSTI	paulo.taira@tre-go.jus.br
Brayton Marques Santana	CESCO	brayton.santana@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	CSEL	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Marcilio Zaccarelli Bersaneti	CINF	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br


6. Anotações

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas.
- Os projetos: ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados e ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação tiveram o seu andamento retomado.

7. Portfólio de projetos

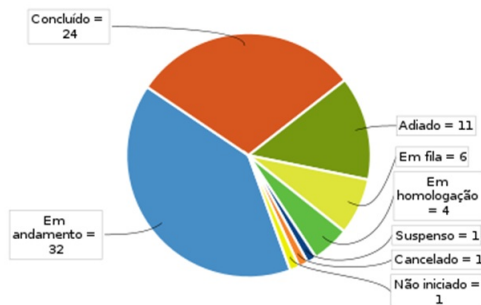

Total: 80 . Gráfico por: Status

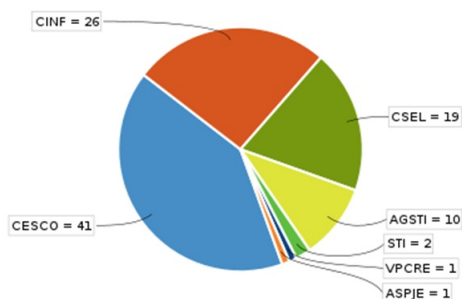

Total: 80 . Gráfico por: Unidade responsável

7.1. Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos em Andamento/Homologação

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
PDI-21-R1-20 - SIS11 - Finalização do Sistema GESCOMP (Gestão por Competências)	Em homologação	90	CESCO
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação	90	CESCO
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Em andamento	10	CESCO
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPA	Em andamento	50	CESCO
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	10	CESCO, VPCRE
PDI-22-R1-14 - Eleições da Comunidade	Em andamento	20	CSEL
PDI-22-R1-15 - Eleições Suplementares	Em andamento		CSEL
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	30	CESCO
PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI	Em andamento	80	CESCO
PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (Acordo de colaboração TJ)	Em andamento	60	CINF
PDI-22-R1-30 - Manutenção evolutiva do Sistema de Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (SIAPEXO)	Em homologação	90	CESCO
PDI-22-R1-31 - Suporte às Eleições 2024	Em andamento	10	AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL
PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023	Em andamento	70	CSEL
PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede cabeada e sem fio	Em andamento	30	CINF
PDI-22-R1-N-34 - Reaparelhamento dos serviços de impressão	Em andamento	50	CINF
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	10	CESCO
PDI-22-R1-N-37 - Manutenção preventiva de urnas	Em andamento	90	CSEL
PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante	Em andamento	90	CINF
PDI-22-R1-N-46 - Eleição do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA	Em andamento		CSEL
PDI-22-R1-N-49 - Eleitor do Futuro - Nova Veneza	Em andamento	10	CSEL
PDI-22-R1-N-50 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas	Em andamento	30	CSEL

7.2. Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Em andamento	60	CESCO
ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados	Em andamento	90	CINF
ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Em andamento	70	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Em andamento	80	CINF
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90	CINF
ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização	Em andamento	80	AGSTI
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Em andamento	60	CESCO, CINF

7.3. Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
PTE-22-R1-06 - Compôr o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC	Em andamento	80	STI
PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26	Em andamento	70	AGSTI
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Em andamento	50	AGSTI
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Em andamento	50	AGSTI
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	70	AGSTI
PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente	Em andamento	10	AGSTI

7.4. Projetos adiados, não iniciados e suspensos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40	CESCO, CINF
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40	CINF
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Adiado	40	CINF
ENS-22-R1-13 - Solução de Segurança do AD	Adiado	90	CINF
ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF	Adiado	20	CINF
PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Adiado	10	CESCO
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Adiado	20	CESCO, CINF
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Adiado	10	CESCO
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Adiado	10	CESCO
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Adiado	50	CESCO
PDI-22-R1-N-44 - Eleição Suplementar de Turvelândia	Suspensão		CSEL
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Não iniciado		CESCO, CINF

7.5. Projetos/macro atividades com término previsto em até 60 dias

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Término previsto
PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante	Em andamento	90	CINF	30/jun/23
PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI	Em andamento	80	CESCO	30/jun/23
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	30	CESCO	30/jun/23
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação	90	CESCO	30/jun/23
PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26	Em andamento	70	AGSTI	28/jul/23
PDI-22-R1-N-49 - Eleitor do Futuro - Nova Veneza	Em andamento	10	CSEL	20/set/23
PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede cabeada e sem fio	Em andamento	30	CINF	30/set/23
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Em andamento	10	CESCO	30/set/23
PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023	Em andamento	70	CSEL	06/out/23
PDI-22-R1-N-46 - Eleição do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA	Em andamento		CSEL	10/nov/23

7.6. Projetos concluídos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ENS-22-R1-08 - Solução de Antivirus	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches	Concluído	100	CINF
PDI-21-R1-16 - INF06 - JUS - Eleições 2022 e Atualização da Plataforma Microsoft	Concluído	100	CINF
PDI-21-R1-18 - SIS21 - Auditse	Concluído	100	CESCO
PDI-21-R1-19 - SIS20 - Adaptação do Sistema - SGRH	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-01 - Suporte às Eleições 2022	Concluído	100	AGSTI, CESCO, CINF, CSEL
PDI-22-R1-02 - Implantação do RDC ARQ	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-03 - Atualização do Sistema de Diárias	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-04 - Atualização do Sistema de Gestão de Serviços Extraordinários (GSE)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-06 - Implantar o Sistema de Gerenciamento de Propaganda Partidária Gratuita (SisAntena)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-12 - Implantação de ferramenta automatizada de comunicação externa e prestação de serviços aos clientes cidadãos da Justiça Eleitoral em Goiás.	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-17 - eSocial - 4ª fase	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015	Concluído	100	CINF, CSEL
PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (ELECONS)	Concluído	100	CESCO, CSEL
PDI-22-R1-N-38 - Adequação da rede para o serviço VOIP	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-N-40 - Eleição da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás - CIPA	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-41 - Eleição Suplementar de Iaciara	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-42 - Eleição Suplementar de Cachoeira Alta	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-43 - 12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH)	Concluído	10	CSEL
PDI-22-R1-N-45 - Eleição Suplementar de São Simão	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-47 - Eleitor do Futuro - Colégio Espaço Pedagógico Educacional - Grêmio Estudantil	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-48 - Eleição da Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás - COOTEGO	Concluído	100	CSEL
PTE-22-R1-02 - Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral	Concluído	100	CESCO
PTE-22-R1-22 - Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente	Concluído	100	CESCO

8. Detalhamento dos projetos

PDI-21-R1-20 - SIS11 - Finalização do Sistema GESCOMP (Gestão por Competências)

Descrição							
SEI 23.0.000011040-0							
Permite o gerenciamento das competências necessárias ao desenvolvimento dos produtos entregues pelas unidades administrativas, mapeamento das competências existentes e "gap" de competências, que visa orientar as necessidades de capacitação das pessoas.							
Finalidade: Concluir o desenvolvimento e implantação do Sistema de Gestão por Competências (Gescomp).							
Meta: Automação do processo de Gestão por Competências do Tribunal.							
Implementar novas funcionalidades no sistema GESCOMP, conforme os requisitos e regras de negócio definidos pela Secretaria de Gestão de Pessoas.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Responsável	Execução%	
Em homologação	05/ago/22	05/ago/22			Augusto Cesar	90	

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Planejamento	Concluído						
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Em andamento						
Realização de testes pela unidade demandante	Em andamento						
Homologação do produto	Em andamento						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						
Observações							

- Será enviado SEI com termo de homologação para a unidade demandante

PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições

Descrição

SEI 3441-7

Desenvolvimento (Finalização) de Sistema de Substituição de Servidores, que envolve o processo indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança (FC) e Cargos Comissionados (CJ), por prazo determinado ou indeterminado.

Visa automatizar o processo de indicação e deferimento de substituições de cargos de direção, chefia e assessoramento no Tribunal

Meta: Automação do processo de indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança e Cargos Comissionados até setembro/2022.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em homologação	27/abr/22	27/abr/22	30/jun/23		CESCO	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						100
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído						100
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído						100
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído						100
Homologação do produto	Em andamento						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						

Observações

- A SGP continua realizando testes no sistema visando a homologação e a elaboração do manual do usuário.
- Será enviado SEI para a SGP.

PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE

Descrição

Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online dos servidores ao seu próprio dossiê funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação	07/jan/21	07/jan/21			CESCO	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Planejamento	Concluído						
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído						
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído						
Homologação do produto	Em andamento						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						

Observações

- A SGP continua realizando testes no sistema visando a homologação e a elaboração do manual do usuário.
- Será enviado SEI para a SGP.

PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores

Descrição

SEI: 22.0.000008626-0

Objetivo da demanda:

Desenvolver formulário pré preenchido de cadastramento de servidores, visando agilizar e otimizar o processo de revisão do cadastro de servidores.

Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

Facilitar o processo de solicitação de alteração de dados cadastrais pelos servidores, com a permissão de alteração de dados livres e possibilidade de solicitação de alteração de dados que exigem comprovação, com a anexação de documentos.

Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Macroprocesso de apoio: Gestão de Pessoas / Processo: Gestão do quadro de pessoal

Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

Facilidade e celeridade da execução do processo de cadastramento de servidores, tanto para o servidor quanto para a unidade responsável.

Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

8 - Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas.

Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):

Disponibilização de formulário eletrônico pré-preenchido com os dados dos servidores, com opção de solicitação de alteração, anexação de documentos e possibilidade de deferimento pela unidade responsável, com gravação automática no SGRH.

Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?

Não

Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:

Não se aplica

Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):

Não se aplica

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	27/fev/23	27/fev/23	30/set/23		CESCO	10

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Em andamento						
Criação e configuração do ambiente de testes	Não iniciado						
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado						
Homologação do produto	Não iniciado						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						

Observações

- Aguardando SGP enviar a relação de informações que serão cadastradas
- O SEI foi encaminhado para SGP.

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC

Descrição

- Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal.
- Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO.

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	29/abr/22	29/abr/22	19/dez/23		CESCO	50

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						
Análise de requisitos	Em andamento						
Desenvolvimento funcionalidades	Em andamento						
Testes de funcionalidades	Em andamento						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						

Observações

Impedimento

- Aguardando os testes de credencias obtidas pela ADAAC para conexão ao PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas do executivo federal)

PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória

Descrição

SEI 2275-6

Finalidade: desenvolvimento de uma solução informatizada para o controle de informações judiciais relacionadas a medidas que envolvem gestão e destinação de valores oriundos de fianças e penas pecuniárias. Ao final, haverá a conversão do controle dos registros manuais em livros de guarda obrigatória pelos cartórios eleitorais para meio eletrônico.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
----------	-----------------	-------------	------------------	--------------	---------------------	-----------

Em andamento		30/ago/23	29/mar/24		CESCO, VPCRE	10
--------------	--	-----------	-----------	--	--------------	----

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Levantamento de requisitos	Em andamento						
Desenvolvimento da etapa I do sistema	Não iniciado						
Disponibilização do módulo I do sistema em ambiente de produção	Não iniciado						

Observações

Impedimento

Aguardando a conclusão do Sistema de Substituições para alocar a equipe ao projeto.

PDI-22-R1-14 - Eleições da Comunidade

Situação	Início previsto	Início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	29/abr/22	29/abr/22	15/abr/24		CSEL	20

Atividades	Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe	Execução%
Sindicato dos Trabalhadores dos Correios - SINTECT/GO	Cancelado	11/nov/22	14/nov/22	17/fev/23	13/dez/22			10
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás - COSEMS/GO	Cancelado	16/jan/23	16/jan/23	13/mar/23	09/fev/23			10
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC	Cancelado	16/jan/23	16/jan/23	01/mai/23	28/fev/23			10
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES	Cancelado	18/jan/23	18/jan/23	12/mai/23	09/mar/23			10
Eleitor do Futuro - Colégio Espaço Pedagógico Educacional - Grêmio Estudantil	Concluído	01/fev/23	01/fev/23	27/fev/23	27/fev/23			100
Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás - COOTEGO	Concluído	10/fev/23	10/fev/23	14/mar/23	10/mar/23			100
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás - CIPA	Concluído	10/mai/23	10/mai/23	31/mai/23	31/mai/23			100
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023 - CMDCA 2023	Em andamento	06/fev/23	06/fev/23	06/out/23		CSEL		70
Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA	Em andamento	15/ago/23	15/ago/23	10/nov/23		CSEL	SESEL, SEVIN	10
Eleitor do Futuro: CEPI José Peixoto, Col. Est. Francisco Alves, Col.Razão e Esc. Mun. Fraim Faquim)	Concluído	23/ago/23	23/ago/23	22/set/23	22/set/23	CSEL		100

PDI-22-R1-15 - Eleições Suplementares

Situação	Início previsto	Início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento					CSEL	

Atividades	Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe	Execução%
Eleição Suplementar de Iaciara	Concluído	09/jan/23	09/jan/23	15/mar/23	13/mar/23	CSEL	SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD	100
Eleição Suplementar de Cachoeira Alta	Concluído	12/jun/23	12/jun/23	09/ago/23	09/ago/23	CSEL	SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD	100
Eleição Suplementar de Turvelândia	Suspenso	12/jun/23	12/jun/23	09/ago/23	14/jul/23	CSEL	SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD	20
Eleição Suplementar de São Simão	Concluído	24/jul/23	24/jul/23	06/set/23	06/set/23	CSEL	SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD	100

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Situação	Início previsto	Início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento			30/jun/23		CESCO	30

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído						
Realização de testes pela equipe de desenvolvimento	Em andamento						

Homologação do produto	Não iniciado						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						
Observações							
Impedimento Contratação do novo colaborador no dia 19/09/2023. Aguardando nivelamento do conhecimento no projeto.							

PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI

Descrição							
SEI nº: 21.0.000005057-9 (principal) e 21.0.000005046-3							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%	
Em andamento			30/jun/23		CESCO	80	

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído						
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído						
Validação do MFA (CISCO-DUO) no sistema	Concluído						
Homologação do produto	Em andamento						
Elaboração do manual de instalação e configuração do DUO	Em andamento						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						
Observações							
Após reunião do grupo gestor do sistema SEI, foi definido que a nova versão (4.1) será definida os marcos de implantação até o final de 2023.							

PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (17 postos do TJ)

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%	
Em andamento			31/mar/24		CINF	60	

Etapas	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Execução%
São Luis de Montes Belos - Ivrolândia	Concluído					100
Luziânia - Jardim Ingá	Concluído	31/jul/23				100
Carmo do Rio Verde	Concluído	31/mai/23	31/mai/23	09/jun/23		100
Faina	Concluído	17/mai/23	17/mai/23	23/mai/23		100
Perolândia	Concluído					100
Caldazinha	Concluído					100
Distrito Jardim ABC	Concluído					100
Portelândia	Concluído					100
Preparação de ambiente seguro e desenvolvimento de template	Concluído					100
Rio Quente	Concluído					100
Goiatuba - Panamá	Em andamento					50
Fazenda Nova - Novo Brasil	Em andamento					
Fazenda Nova - Jaupaci	Em andamento					
Fazenda Nova - Israelândia	Em andamento					
Aporé	Em andamento	17/mai/23	17/mai/23			
São Miguel do Passa Quatro	Em andamento					
Observações						
Computador do Jardim Ingá foi preparado e será enviado na semana dos dias 11 a 15/09.						

PDI-22-R1-30 - Manutenção evolutiva do Sistema de Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (SIAPEXo)

Descrição						
SEI 13785-9						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação					CESCO	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Execução%
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído					100
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído					100
Planejamento	Concluído					100

Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado					
Homologação do produto	Em andamento					
Observações						
Foi recomendado pela Diretoria-Geral a formalização da homologação do sistema.						

PDI-22-R1-31 - Suporte às Eleições 2024

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	09/jan/23	09/jan/23	19/dez/24		AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL	10

Macroatividades	Situação	Execução%	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe
12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH)	Concluído	100	12/jun/23	12/jun/23	02/ago/23	07/ago/23	CSEL	SEVIN, SECAD
Voto Eletrônico	Em andamento	30	12/dez/22	12/dez/22	20/dez/24		CSEL	
Cadastro Eleitoral	Em andamento	30	23/jan/23	23/jan/23	20/dez/24		CSEL	

Atividades Cadastro Eleitoral	Situação
Retorno Atendimento Biométrico - Nerópolis - ZE 054	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Santo Antônio do Descoberto - ZE 024	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Mineiros - ZE 021	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Planaltina - ZE 044	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Caçu - ZE 106	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Formosa - ZE 011	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Itajá - ZE 096	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Alvorada do Norte - ZE 123	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Cachoeira Alta - ZE 097	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Posse - ZE 029	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Quirinópolis - ZE 046	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - São Domingos - ZE 047	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Santa Helena de Goiás - ZE 066	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Campos Belos - ZE 105	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Paraúna - ZE 043	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Cavalcante - ZE 099	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Palmeiras de Goiás - ZE 020	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Alto Paraíso - ZE 143	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Jaraguá - ZE 017	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Padre Bernardo - ZE 131	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Goianésia - ZE 074	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Águas Lindas de Goiás - ZE 028	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Niquelândia - ZE 041	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Pirenópolis - ZE 026	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Uruaçu - ZE 050	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Piracanjuba - ZE 025	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Mara Rosa - ZE 088	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Caldas Novas - ZE 007	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Formoso - ZE 125	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Morrinhos - ZE 022	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Minaçu - ZE 130	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Goiatuba - ZE 038	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Porangatu - ZE 055	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Buriti Alegre - ZE 005	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Itumbiara - ZE 016	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Bom Jesus - ZE 124	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Crixás - ZE 085	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Pontalina - ZE 045	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Itapaci - ZE 039	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Ceres - ZE 072	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Itauçu - ZE 057	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Rubiataba - ZE 076	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Itaberaí - ZE 015	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Mozarlândia - ZE 110	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Itapuranga - ZE 077	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - São Miguel do Araguaia - ZE 094	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Goiás - ZE 012	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Silvânia - ZE 031	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Pires do Rio - ZE 027	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Ipameri - ZE 014	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Catalão - ZE 008	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Cristalina - ZE 036	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Luziânia - ZE 019	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Cidade Ocidental - ZE 042	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Valparaíso - ZE 033	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Novo Gama - ZE004	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Alexânia - ZE 087	Concluído

Retorno Atendimento Biométrico - Jataí - ZE 018	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Rio Verde - ZE 030 e 140	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Acreúna - ZE 128	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Edeia - ZE 068	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Anicuns - ZE 034	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Fazenda Nova - ZE 079	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Jussara - ZE 095	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Aragarças - ZE 035	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Piranhas - ZE 102	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Caiapônia - ZE 006	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Iporá - ZE 053	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - São Luis de Montes Belos - ZE 080	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Firminópolis - ZE 063	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Formoso - ZE 125	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Guapó - ZE 056	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Inhumas - ZE 013	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Bela Vista de Goiás - ZE 032	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Goianira - ZE 101	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Trindade - ZE 049	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Senador Canedo - ZE 040	Concluído
Atendimento Biométrico - Elaboração do Treinamento	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Aparecida de Goiânia - ZE 119, 132 e 145	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Anápolis - ZE 003, 141 e 144	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Goiânia - ZE 001, 002, 127, 133, 134, 135, 136, 146 e 147	Concluído
Implantação - Software Griaule BCC - Coleta Biométrica	Em andamento

Atividades Voto Eletrônico	Situação	Execução%	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe
Patrimônio e Almoxarifado	Em andamento	70	14/jun/23	14/jun/23	30/set/23	23/jun/23	CSEL	SEVIN
Manutenção das Urnas	Em andamento		13/fev/23	02/mar/23	30/ago/24		CSEL	CSEL
Distribuição das urnas - Eleições 2024	Não iniciado							
Preparação de Materiais	Não iniciado							
Aquisição de Suprimentos de Urna	Não iniciado							
Recolhimento das urnas - Eleições 2022	Concluído	100	12/dez/22	12/dez/22	15/mar/23	12/mar/23	CSEL	CSEL

PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023

Descrição						
https://www.tre-go.jus.br/eleicoes/eleicoes-da-comunidade/conselhos-tutelares-2023 - Data da eleição: 01/10/2023						
Situação	Execução%	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável
Em andamento	70	06/fev/23	06/fev/23	06/out/23		CSEL

Atividades	Situação	Execução%	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe
Reunião Inicial com os representantes dos Conselhos Tutelares	Concluído	100	09/fev/23	09/fev/23	09/fev/23	09/fev/23	CSEL	CSEL, SESEL, SEVIN
Elaboração do Questionário para os Conselhos Tutelares	Concluído	100	09/fev/23	09/fev/23	17/fev/23	14/fev/23	CSEL	SESEL
Elaboração da Resolução com calendário das principais Etapas	Concluído	100	09/fev/23	09/fev/23	28/fev/23	24/fev/23	CSEL	CSEL
Tramitação e Publicação da Resolução com calendário das principais Etapas	Concluído	100	24/fev/23	24/fev/23	14/mar/23	27/abr/23	CSEL	CSEL
Reunião com os Conselhos Tutelares - Orientações Gerais	Concluído	100	15/mar/23	15/mar/23	15/mar/23	15/mar/23	CSEL	CSEL, SESEL, SEVIN
Elaboração da página das Eleições dos Conselhos Tutelares na Internet	Concluído	100	16/mar/23	16/mar/23	24/mar/23	18/mar/23	CSEL	CSEL
Elaboração do Fluxo do Processo (Recebimento do Pedido até a Totalização dos Resultados)	Concluído	100	20/mar/23	20/mar/23	31/mar/23	30/mar/23	CSEL	CSEL
Reunião para elaboração do Sistema de ComuniCANDEX	Concluído	100	03/abr/23	03/abr/23	03/abr/23	03/abr/23	CSEL	CESCO, SESCO
Desenv. Sist. EleCons - Etapa 1 (Cadastro dos dados, Conselhos, Representantes e Locais de Votação)	Concluído	100	10/abr/23	10/abr/23	30/mar/23	02/jun/23	CSEL	CESCO, SESCO
Reunião de Alinhamento e fechamento do Planejamento	Concluído	100	05/jun/23	05/jun/23	05/jun/23	05/jun/23	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD

Desenv. Sist. EleCons - Etapa 2 (Definição de Locais e Urnas)	Concluído	100	05/jun/23	05/jun/23	23/jun/23	29/jun/23	CSEL	CESCO, SESCO
Desenv. Sist. EleCons - Etapa 3 (Cadastro dos Candidatos)	Concluído	100	05/jun/23	05/jun/23	23/jun/23	19/jun/23	CSEL	CESCO, SESCO
Cadastro dos usuários do Elecons (Oficial)	Concluído	100	05/jun/23	08/jun/23	03/jul/23	31/jul/23	CSEL	SESEL
Disponibilizar, na internet, os municípios que serão atendidos (urnas eletrônicas ou de lona)	Concluído	100	12/jun/23	12/jun/23	12/jun/23	31/jul/23	CSEL	CSEL
Locais de Votação e Agregação de Seções (CMDCA)	Concluído	100	19/jun/23	19/jun/23	14/jul/23	14/jul/23	CSEL	SESEL
Desenv. Sist. EleCons - Etapa 4 (Caderno de Votação)	Concluído	100	26/jun/23	26/jun/23	07/jul/23	04/ago/23	CSEL	CESCO, SESCO, SECAD
Desenv. Sist. EleCons - Etapa 5 (Cadastro do Suporte Técnico)	Concluído	100	17/jul/23	07/ago/23	31/jul/23	11/ago/23	CSEL	CESCO, SESCO
Registro de Candidatos (CMDCA)	Concluído	100	17/jul/23	17/jul/23	14/ago/23	18/ago/23	CSEL	SESEL
Disponibilização da Versão dos Sistemas Parametrizador, GEDAI e Urna	Concluído	100	21/jul/23	21/jul/23	21/jul/23	21/jul/23	CSEL	SESEL, SEVIN
Teste dos Sistemas Parametrizador, GEDAI e Sistemas de Urna (Versão: 23.8.198 - Jaguaréte)	Concluído	100	24/jul/23	24/jul/23	28/jul/23	28/jul/23	CSEL	SESEL, SEVIN
Preparação do Treinamento (Material - Mesário)	Em andamento	50	01/ago/23	09/ago/23	06/set/23		CSEL	SEVIN
Preparação do Treinamento (Material - Técnico Urna)	Em andamento	50	01/ago/23	07/ago/23	06/set/23		CSEL	SEVIN
Disponibilizar a lista de eleitores ou caderno de votação	Concluído	100	14/ago/23	14/ago/23	22/ago/23	24/ago/23	CSEL	SECAD
Registro de Suporte Técnico (CMDCA)	Em andamento	80	14/ago/23	14/ago/23	14/set/23		CSEL	SECAD
Desenvolver - Lista de Candidatos e os arquivos .CSV de exportação dos dados	Concluído	100	21/ago/23	21/ago/23	22/ago/23	23/ago/23	CSEL	CESCO, SESCO
Configuração do Parametrizador Oficial (Versão: 23.8.198 - Jaguaréte)	Concluído	100	21/ago/23	21/ago/23	29/ago/23	01/set/23	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD
Desenvolver - Consulta Local de Votação - Público - Internet	Concluído	100	25/ago/23	23/ago/23	25/ago/23	25/ago/23	CSEL	CESCO, SESCO
Adaptação do Sistemas de Geração de Etiquetas	Concluído	100	28/ago/23	24/ago/23	01/set/23	29/ago/23	CSEL	CSEL
Desenvolver - Relatório Final - Validação dos Dados	Concluído	100	29/ago/23	29/ago/23	31/ago/23	01/set/23	CSEL	CESCO, SESCO
Impressão e corte das Etiquetas de Urna (Caixa e TE)	Concluído	100	29/ago/23	29/ago/23	31/ago/23	06/set/23	CSEL	AGSTI
Validação dos Candidatos (Número, Nome, Foto) (CMDCA e Candidatos)	Concluído	100	01/set/23	01/set/23	06/set/23	06/set/23	CSEL	SESEL
Validação Final da Eleição (ELECONS x Parametrizador X GEDAI) nas Urnas	Concluído	100	30/ago/23	30/ago/23	05/set/23	06/set/23	CSEL	SESEL
Parametrização Oficial (Versão: 23.8.198 - Jaguaréte) FINALIZADA	Concluído	100	06/set/23	06/set/23	06/set/23	06/set/23	CSEL	SESEL
Sistema de Transmissão e Totalização - Adaptação e Teste	Em andamento	80	18/set/23	18/set/23	25/set/23		CSEL	CSEL, SESEL
Sistema de Transmissão e Totalização - Configuração e Cadastro de Usuários	Em andamento	80	18/set/23	18/set/23	25/set/23		CSEL	SESEL
Geração de Mídias	Em andamento	80	04/set/23	04/set/23	22/set/23		CSEL	SESEL
Carga e Lacre das Urnas	Em andamento	80	05/set/23	05/set/23	26/set/23		CSEL	SEVIN
Transporte das Urnas para as Zonas Eleitorais	Em andamento	80	13/set/23	13/set/23	22/set/23		CSEL	SEVIN
Treinamento Mesário	Não iniciado		25/set/23		29/set/23		CSEL	SEVIN
Treinamento Técnico de Urna	Não iniciado		25/set/23		29/set/23		CSEL	SEVIN
Entrega das Urnas pelas Zonas Eleitorais para os CMDCA's	Não iniciado		25/set/23		29/set/23		CSEL	SEVIN
Suporte às Eleições dos Conselhos Tutelares	Não iniciado		30/set/23		01/out/23		CSEL	SEAI, SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD
Observações								
Cadastradas as solicitações de 244 municípios sendo 213 com urna eletrônica e 31 com urna de lona.								

PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede cabeada e sem fio

Descrição SEI nº 23.0.000003147-0 Aquisição de Solução de rede cabeada (LAN e TOR) e sem fio (Wi-fi) com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral. Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%	

Em andamento	28/fev/23	28/fev/23	30/set/23		CINF	30
--------------	-----------	-----------	-----------	--	------	----

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Elaboração do DOD.	Concluído	20/fev/23	20/fev/23	28/fev/23	28/fev/23	CINF	100
Elaboração do ETP.	Concluído	20/mar/23	20/mar/23	19/mai/23	18/mai/23	CINF	100
Elaboração do TR.	Em andamento						10
Processo de licitação.	Não iniciado						
Execução da ARP.	Não iniciado						
Implementação da solução.	Não iniciado						

Observações
- Termo de referência em fase de elaboração. - O término previsto será adiado para 19/12 devido a priorização de outros projetos na unidade.

PDI-22-R1-N-34 - Reparelhamento dos serviços de impressão

Descrição							
SEI nº 23.0.000002396-5							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%	
Em andamento	13/fev/23	13/fev/23	18/dez/23		CINF	50	

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Processo de licitação.	Em andamento						
Implantação da solução.	Não iniciado						
Execução da ARP.	Não iniciado						
Elaboração do TR.	Concluído						100
Elaboração do ETP.	Concluído						100
Elaboração do DOD.	Concluído						100

Observações
Data da licitação: 28/09/2023.

PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%	
Em andamento		01/jun/23	30/nov/23		CESCO	10	

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Instalação/ativação da feature	Concluído						100
Implementação das primeiras funcionalidades	Não iniciado						
Testes em ambiente real	Não iniciado						
Aplicação em ambiente virtual	Em andamento						
Estudos sobre as funcionalidades	Em andamento						

PDI-22-R1-N-37 - Manutenção preventiva de urnas

Descrição							
Painel de acompanhamento							
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiNDc5MTk3OTctNGRIYS00MDYxLWJjOWQtYTU5NjJhOGRkOTA3IiwidCI6IjI2ZjA4NzlyLTJjOWUtNGVhZS1iN2VkLTlhMmI3N2ZmM2Q5YyJ9							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%	
Em andamento	13/fev/23	02/mai/23	30/ago/24		CSEL		

Atividades	Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Equipe	Execução%
Realização do 1º Run In 2023	Cancelado	13/fev/23		28/abr/23		SEVIN	
Realização do 2º Run In 2023	Concluído	01/mai/23	03/mai/23	31/ago/23	29/ago/23	SEVIN	100
Realização do 3º Run In 2023	Em andamento	01/set/23	01/set/23	19/dez/23		SEVIN	20
Realização do 1º Run In 2024	Não iniciado	08/jan/24		30/abr/24		SEVIN	
Realização do 2º Run In 2024	Não iniciado	01/mai/24		30/ago/24		SEVIN	

PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante**Descrição**

Projeto de instalação de links internet dedicados redundantes nos Cartórios Eleitorais.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento			30/jun/23		CINF	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Equipe	Execução%
Processo de contratação.	Concluído							100
Preparação da infraestrutura de rede.	Concluído							100
Reunião de planejamento da implantação.	Concluído							100
Implantação dos links nos cartórios eleitorais.	Em andamento					CINF		90

Observações

- O término previsto foi reprogramado para **22/09** em razão de problemas de passagem de cabos nos prédios do TJ em 1 ZE (Novo Gama) - falta atuação do TJ para limpeza da tubulação e espaço no rack.
- Cidade Ocidental está em reforma.

PDI-22-R1-N-45 - Eleição Suplementar de São Simão**Descrição**

- SEI: 23.0.000009670-9
- Data da eleição: 06 de setembro

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe	Execução%
Concluído	24/jul/23	24/jul/23	06/set/23	06/set/23	CSEL	SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD	100

Atividades	Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe	Execução%
Sistema - Alimentação de mesários: Recibos	Cancelado	21/ago/23		25/ago/23		CESCO, CSEL	SEDIS	
Ofício DG - enviar para o TSE - Confirmação da Eleição Suplementar	Concluído	24/jul/23	24/jul/23	24/jul/23	24/jul/23	DG	CSEL	100
Configuração da Eleição - CFE	Concluído	25/jul/23	25/jul/23	25/jul/23	25/jul/23	CSEL	CSEL	100
Solicitação Publicação do Processo e Sistemas Eleitorais	Concluído	25/jul/23	25/jul/23	25/ago/23	25/ago/23	CSEL	CSEL	100
Solicitação das Senhas Oficiais	Concluído	26/jul/23	26/jul/23	26/jul/23	26/jul/23	CSEL	CSEL	100
Liberação de Acesso aos Sistemas	Concluído	26/jul/23	26/jul/23	26/jul/23	26/jul/23	CSEL	SESEL	100
Planejamento - Logística de Suporte à Eleição	Concluído	26/jul/23	26/jul/23	26/jul/23	26/jul/23	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD	100
Suporte à Entrega do Registro de Candidaturas	Concluído	26/jul/23	26/jul/23	27/jul/23	27/jul/23	CSEL	SESEL	100
Suporte ao Sorteio do Horário Eleitoral	Concluído	31/jul/23	31/jul/23	31/jul/23	31/jul/23	CSEL	SESEL	100
Suporte à Agregações de Seção	Concluído	31/jul/23	31/jul/23	08/ago/23	08/ago/23	CSEL	SECAD	100
Suporte à Convocação de Mesários	Concluído	31/jul/23	31/jul/23	08/ago/23	08/ago/23	CSEL	SECAD	100
Suporte à TTE (Ex: Mesário)	Concluído	31/jul/23	31/jul/23	08/ago/23	08/ago/23	CSEL	SECAD	100
Solicitação da Impressão dos Cadernos de Votação	Concluído	07/ago/23	07/ago/23	08/ago/23	08/ago/23	CSEL	SECAD	100
Preparação das Urnas Eletrônicas	Concluído	21/ago/23	14/ago/23	25/ago/23	29/ago/23	CSEL	SEVIN	100
Suporte ao Fechamento do Registro de Candidaturas	Concluído	28/ago/23	25/ago/23	28/ago/23	25/ago/23	CSEL	SESEL	100
Preparação do SISTOT (Importação de Candidatos e Seções)	Concluído	29/ago/23	25/ago/23	29/ago/23	25/ago/23	CSEL	SESEL	100
Geração de Mídias	Concluído	31/ago/23	31/ago/23	01/set/23	31/ago/23	CSEL	SESEL, SEVIN	100
Auditoria dos Sistemas - Evento de Geração de Mídias (GEDAI, HotSwap, SIS)	Concluído	31/ago/23	31/ago/23	01/set/23	31/ago/23	CSEL	SESEL, SEVIN	100
Evento de Carga e Lacre das Urnas	Concluído	31/ago/23	31/ago/23	01/set/23	31/ago/23	CSEL	SEVIN	100
Auditoria das Urnas - Evento de Carga e Lacre	Concluído	31/ago/23	31/ago/23	01/set/23	31/ago/23	CSEL	SEVIN	100
Transmissão da Tabela de correspondência	Concluído	31/ago/23	31/ago/23	01/set/23	31/ago/23	CSEL	SESEL, SEVIN	100
Suporte à Montagem de Seção	Concluído	02/set/23	02/set/23	02/set/23	02/set/23	CSEL	SESEL, SEVIN	100
Auditoria das Urna - Evento Dia da Eleição	Concluído	03/set/23	03/set/23	03/set/23	03/set/23	CSEL	SEVIN	100
Suporte à Urna no dia Eleição	Concluído	03/set/23	03/set/23	03/set/23	03/set/23	CSEL	SEVIN	100

Suporte à Transmissão, Apuração e Totalização dos Resultados	Concluído	03/set/23	03/set/23	03/set/23	03/set/23	CSEL	SESEL	100
Plantão de Suporte aos Sistemas Eleitorais (CANDex, CAND, HE, SISTOT, GEDAI, TRANSP e SPCE)	Concluído	24/jul/23	24/jul/23	06/set/23	06/set/23	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD	100

PDI-22-R1-N-46 - Eleição do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA

Descrição								
SEI: 23.0.0000.11678-5								
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe	Execução%	
Em andamento	15/ago/23	15/ago/23	10/nov/23		CSEL	SESEL, SEVIN	10	

Atividades	Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe	Execução%
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade	Concluído	17/ago/23	17/ago/23	31/ago/23	31/ago/23	CSEL	SESEL	100
Configuração da Eleição	Não iniciado	23/out/23		30/out/23		CSEL	SESEL	
Entrega da Base de Candidatos	Não iniciado	27/out/23		27/out/23		CSEL	SESEL	
Entrega da Base de Eleitores	Não iniciado	27/out/23		27/out/23		CSEL	SESEL	
Entrega das Listas de Eleitores	Não iniciado	27/out/23		27/out/23		CSEL	SESEL	
Preparação - VVfoto	Não iniciado	30/out/23		30/out/23		CSEL	SESEL, SEVIN	
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Não iniciado	31/out/23		31/out/23		CSEL	SESEL, SEVIN	
Geração de Mídias	Não iniciado	31/out/23		31/out/23		CSEL	SESEL	
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Não iniciado	06/nov/23		06/nov/23		CSEL	SEVIN	
Retirada das Urnas Eletrônicas	Não iniciado	06/nov/23		06/nov/23		CSEL	SEVIN	
Suporte às Eleições	Não iniciado	08/nov/23		08/nov/23		CSEL	SEVIN	
Devolução das Urnas Eletrônicas	Não iniciado	10/nov/23		10/nov/23		CSEL	SEVIN	
Elaboração do Acordo de Colaboração	Em andamento	21/set/23	21/set/23	25/set/23		CSEL	SESEL	10

PDI-22-R1-N-49 - Eleitor do Futuro Nova Veneza

Descrição								
SEI 23.0.000012165-7								
Projeto Eleitor do Futuro								
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe	Execução%	
Concluído	23/ago/23	23/ago/23	22/set/23	22/set/23	CSEL		100	

Atividades	Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe	Execução%
Entrega da Base de Candidatos	Concluído	01/set/23	01/set/23	01/set/23	15/set/23	CSEL	SESEL	100
Entrega da Base de Eleitores	Concluído	01/set/23	01/set/23	01/set/23	08/set/23	CSEL	SESEL	100
Configuração da Eleição	Concluído	11/set/23	13/set/23	12/set/23	15/set/23	CSEL	SESEL	100
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído	13/set/23	20/set/23	13/set/23	20/set/23	CSEL	SESEL, SEVIN	100
Geração de Mídias	Concluído	15/set/23	20/set/23	15/set/23	20/set/23	CSEL	SESEL	100
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Concluído	15/set/23	20/set/23	15/set/23	20/set/23	CSEL	SEVIN	100
Entrega das Listas de Eleitores	Concluído	15/set/23	20/set/23	15/set/23	20/set/23	CSEL	SESEL	100
Retirada das Urnas Eletrônicas	Concluído	20/set/23	20/set/23	20/set/23	20/set/23	CSEL	SEVIN	100
Suporte às Eleições	Concluído	21/set/23	21/set/23	21/set/23	21/set/23	CSEL		100
Devolução das Urnas Eletrônicas	Concluído	22/set/23	22/set/23	22/set/23	22/set/23	CSEL		100

PDI-22-R1-N-50 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas

Descrição						
SEI: 23.0.000006767-9						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento					CSEL	30
Observações						
A SAO concluiu o termo de referência e coleta de orçamento.						

ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software

Descrição						
Possui o intuito de estabelecer padrões de segurança no desenvolvimento de software.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%

Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CESCO	60
--------------	-----------	-----------	-----------	--	-------	----

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Planejamento	Concluído						100
Elaboração da minuta do documento normativo	Em andamento						

Observações

- Foi encaminhado para os chefes de seções da CESCO a minuta do normativo de desenvolvimento seguro, que está em análise por parte dos titulares das unidades.

ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados

Descrição						
O gerenciamento de backup e restauração de dados objetiva instituir diretrizes, responsabilidades e competências que visam garantir a segurança, integridade e disponibilidade dos dados custodiados pelo TRE-GO.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Planejamento	Concluído						100
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						100
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído						100
Implantação	Concluído						100
Revisão do normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE	Concluído						100
Apresentação de minuta de Portaria sobre cópia e restauração de dados.	Em andamento						

Observações

- Aguardando validação do CTGTI.

ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação

Descrição						
Dispõe sobre as regras e os procedimentos para gestão de incidentes de segurança da informação do TRE-GO.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI, CESCO, CINF	70

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Planejamento	Concluído						100
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						100
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído						100
Análise da minuta do normativo pela Assessoria da Diretoria Geral	Concluído						100
Publicação do normativo	Não iniciado						

Observações

Aguardando aprovação pela Diretoria Geral.

ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas

Descrição						
SEI 1975-9 Possui o objetivo de proteger, controlar, gerenciar, auditar e monitorar contas privilegiadas a ativos críticos do TRE-GO. São considerados ativos críticos: - Equipamentos servidores físicos e virtuais que hospedam todos os sistemas eleitorais, administrativos e judiciais; - Servidores de Banco de Dados; - Servidores de Arquivos Corporativos; - Servidores de Correio Eletrônico; - Equipamentos Firewalls, Balance adores de Carga, Switches de Rede, Proxy, Contas de Serviços, dentre outros.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	80

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						100
Aquisição	Concluído						100
Instalação e configuração	Concluído						100
Transferência de conhecimento	Concluído						100
Disponibilizar em produção - ambiente Microsoft.	Em andamento						
Disponibilizar em produção - ambiente Linux.	Em andamento						
Observações							
O Hands-on com a empresa será reagendado.							

ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)

Descrição							
SEI 6237-9							
Ferramenta que possui a finalidade de prover uma autenticação mais segura dos usuários de sistemas informatizados, por meio da confirmação da identidade do usuário, em dois ou mais momentos, antes de liberar o seu acesso a um determinado sistema.							
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%	
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	90	

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						100
Aquisição	Concluído						100
Instalação e configuração	Concluído						100
Transferência de conhecimento	Concluído						100
Máquinas dos postos avançados - Prefeitura/TJ - uso da VPN.	Concluído						100
Máquinas da JE - Home Office - uso de VPN.	Concluído						100
Disponibilizar em produção - Portal internet.	Concluído						100
Disponibilizar em produção - E-mail.	Concluído						100
Disponibilizar em produção - Sistema SEI 3.5/4.0	Em andamento						
Migrar os usuários de e-mail para o CISCO-DUO	Em andamento						
Observações							
O projeto está dependendo da implantação da versão 4.1 do SEI para finalização.							

ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização

Descrição							
SEI 3619-0							
As pessoas são o elo mais fraco quando falamos em segurança cibernética. Costumam ser a porta de entrada para criminosos cibernéticos invadirem a rede, roubarem informações valiosas e causarem grandes prejuízos financeiros e de imagem às instituições. Treinar e conscientizar pessoas é primordial para o fortalecimento da segurança da infraestrutura tecnológica e dos dados pessoais. A contratação de solução para conscientização em segurança da informação está prevista na Estratégia Nacional de Cibersegurança da Justiça Eleitoral . A estratégia prevê que os servidores e colaboradores devem ser capacitados a fim de reduzir os riscos na área de segurança cibernética. É importante que os funcionários entendam os objetivos da segurança da informação e o impacto potencial, positivo e negativo d seu próprio comportamento na organização.							
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%	
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	80	

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						100
Aquisição	Concluído						100
Instalação e configuração	Concluído						100
Transferência de conhecimento	Concluído						100
Implantação	Em andamento						
Observações							
Será disponibilizada a primeira trilha de segurança cibernética para todo o Tribunal no início de outubro.							

ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação

Descrição

Possui a finalidade de estabelecer as diretrizes para o controle de acesso e uso aceitável dos recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal, bem como os direitos e as responsabilidades dos usuários desses recursos.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF, STI	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Planejamento	Concluído						100
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						100
Norma finalizada	Concluído						100
Revisão do normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE	Em andamento						

ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos

Descrição						
O uso de recursos criptográficos visa proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos pelas redes de computadores, assim como dos dados em repouso, armazenados em servidores, microcomputadores, dispositivos móveis e bancos de dados.						
Situação	Início previsto	Início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CESCO, CINF	60

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Linux.	Concluído						100
Implantação de criptografia do Portal de acesso externo - escritório remoto.	Concluído						100
Implantação de criptografia em conexões VPN.	Concluído						100
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.	Concluído						100
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						100
Planejamento	Concluído						100
Implantação de criptografia em notebooks standalone - Bitlocker.	Não iniciado						
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS - Bitlocker.	Em andamento						
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS - Bitlocker.	Em andamento						
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.	Em andamento						
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores e Bancos de dados.	Em andamento						
Observações							
Impedimento:							
Será feita a atualização da solução de backup para andamento sobre o uso dos recursos criptográficos. dia 11/09/2023.							

PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC

Descrição						
Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estabelecido no Guia						
Situação	Início previsto	Início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		STI	80

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, alinhado ao número de usuários internos e externos de recursos de TIC conforme referencial mínimo estabelecido no Guia	Concluído					STI	100
Propor a adequação dos recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos da atividade anterior	Em andamento					STI	
Observações							
Está sendo elaborada a proposta de adequação dos recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos para encaminhamento à Alta Administração.							

PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26

Descrição

Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD e encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica.

<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706>

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	28/jul/23		AGSTI	70

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Elaborar e acompanhar o Plano de Trabalho, conforme critérios da ENTIC	Em andamento					AGSTI	
Enviar o Plano de Trabalho ao CNJ	Concluído					AGSTI	100
Mapear e/ou validar processo de publicação e divulgação periódica de planos junto aos repositórios nacional e regional, designando responsáveis	Concluído					AGSTI	100

PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC

Descrição						
Definir processos de continuidade de serviços de TI, em caso de eventos de causas naturais, acidentais, tecnológicas ou humanas.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	50

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						100
Estabelecer Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papéis e responsabilidades	Em andamento						
Estabelecer o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC	Em andamento						
Transferência de conhecimento	Não iniciado						
Testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC	Não iniciado						

PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC

Descrição						
Os projetos de Tecnologia da Informação, deverão passar por análise de riscos de segurança da informação antes de sua implementação.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	50

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						100
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						100
Mapeamento do processo de trabalho	Em andamento						
Elaborar, revisar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado com o plano institucional de gestão de riscos	Em andamento						
Transferência de conhecimento	Não iniciado						
Implantação	Não iniciado						

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

Descrição						

SEI nº:

Objetivo da demanda:

Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.

Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

A falta catalogação dos ativos de TI, tanto *hardware* quanto *software*, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataques cibernéticos de qualquer natureza.

Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Gestão de TI e apoio à Governança

Desenvolvimento e administração de soluções de TIC

Gestão de infraestrutura de TIC

Suporte técnico das soluções de TIC

Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

1. Visibilidade de todo o parque de *hardware* do Tribunal.

2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional.

3. Visibilidade de todos os *softwares* em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.

Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados

Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados.

Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026

Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):

Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?

Não

Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:

Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):

Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em *Software Livre*, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		AGSTI	70

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						100
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído						100
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						100
Aquisição da solução	Concluído						100
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	Em andamento					CESCO, CINF, CSEL	
Instalação e configuração da solução	Em andamento						
Transferência de conhecimento	Não iniciado						
Implantação	Não iniciado						
Estabelecer rotina de, regularmente, avaliar o parque, inventariar ativos, auditar e tratar não conformidades relativas aos registros dos ativos no CMDB, abrangendo hardwares, softwares, links etc.	Não iniciado						

Observações

Impedimento:

Aguardando a criação de solução para uso de dois computadores em ambiente do posto avançado pela SESRE.

PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e

melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		AGSTI	10

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Análise dos modelos de governança de serviços de TIC existentes	Concluído						100
Implementar/Avaliar processos de gerenciamento de serviços que impactem a satisfação dos usuários	Em andamento					AGSTI	
Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções	Adiado						
Implementar as soluções priorizadas	Adiado						



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 02/10/2023, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 03/10/2023, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRAYTON MARQUES SANTANA, COORDENADOR(A)**, em 04/10/2023, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 16/10/2023, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 16/10/2023, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0630579** e o código CRC **1BFE131E**.
