



ATA

REUNIÃO CTGTI - 18/2023

1. Identificação

Data da reunião: 5 de out. de 2023	Início: 14:10 Término: 15:56	Local: Sala de reunião da STI
Objetivo da reunião: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados.


5. Participantes da reunião

Nome	Unidade	E-mail
Frank Wendell Ribeiro	STI	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	AGSTI	paulo.taira@tre-go.jus.br
Brayton Marques Santana	CESCO	brayton.santana@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	CSEL	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Marcílio Zaccarelli Bersaneti	CINF	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br


6. Anotações

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas.
- O projeto PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020, teve o seu andamento retomado.
- Criar projeto de mapeamento de processos críticos (ex: certificação de sites e sistemas de informação).
- Marcílio atualizará as informações do projeto: PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (Acordo de colaboração TJ).
- Foi incluído no portfólio o projeto: PDI-22-R1-N-51 - Eleitor do Futuro: Goiânia.
- O projeto: PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023 foi concluído.

7. Portfólio de projetos

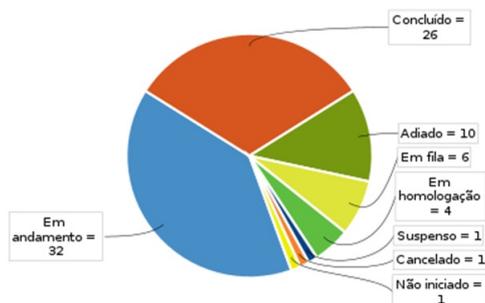

Total: 81 . Gráfico por: Status



Total: 81 . Gráfico por: Unidade responsável

7.1. Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos em Andamento/Homologação

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
PDI-21-R1-20 - SIS11 - Finalização do Sistema GESCOMP (Gestão por Competências)	Em homologação	90	CESCO
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação	90	CESCO
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Em andamento	10	CESCO
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC	Em andamento	50	CESCO
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	10	CESCO, VPCRE
PDI-22-R1-14 - Eleições da Comunidade	Em andamento	20	CSEL
PDI-22-R1-15 - Eleições Suplementares	Em andamento		CSEL
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	30	CESCO
PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI	Em andamento	80	CESCO
PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (Acordo de colaboração TJ)	Em andamento	60	CINF
PDI-22-R1-30 - Manutenção evolutiva do Sistema de Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (SIAPEXo)	Em homologação	90	CESCO
PDI-22-R1-31 - Suporte às Eleições 2024	Em andamento	10	AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL
PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede cabeada e sem fio	Em andamento	30	CINF
PDI-22-R1-N-34 - Reparelhamento dos serviços de impressão	Em andamento	50	CINF
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	10	CESCO
PDI-22-R1-N-37 - Manutenção preventiva de urnas	Em andamento	90	CSEL
PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante	Em andamento	90	CINF
PDI-22-R1-N-46 - Eleição do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA	Em andamento		CSEL
PDI-22-R1-N-50 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas	Em andamento	30	CSEL
PDI-22-R1-N-51 - Eleitor do Futuro: Goiânia	Em andamento	20	CSEL

7.2. Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Em andamento	60	CESCO
ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados	Em andamento	90	CINF
ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Em andamento	70	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Em andamento	80	CINF
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90	CINF
ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização	Em andamento	80	AGSTI
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Em andamento	60	CESCO, CINF

7.3. Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC	Em andamento	80	STI
PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26	Em andamento	70	AGSTI
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Em andamento	50	AGSTI
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Em andamento	50	AGSTI
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	20	CESCO, CINF
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	70	AGSTI
PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente	Em andamento	10	AGSTI

7.4. Projetos adiados, não iniciados e suspensos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
--------	----------	-----------	---------------------

ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40	CESCO, CINF
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40	CINF
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Adiado	40	CINF
ENS-22-R1-13 - Solução de Segurança do AD	Adiado	90	CINF
ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF	Adiado	20	CINF
PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Adiado	10	CESCO
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Adiado	10	CESCO
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Adiado	10	CESCO
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Adiado	50	CESCO
PDI-22-R1-N-44 - Eleição Suplementar de Turvelândia	Suspensão		CSEL
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Não iniciado		CESCO, CINF

7.5. Projetos/macro atividades com término previsto em até 60 dias

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Término previsto
PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante	Em andamento	90	CINF	30/jun/23
PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI	Em andamento	80	CESCO	30/jun/23
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	30	CESCO	30/jun/23
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação	90	CESCO	30/jun/23
PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26	Em andamento	70	AGSTI	28/jul/23
PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede cabeada e sem fio	Em andamento	30	CINF	30/set/23
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Em andamento	10	CESCO	30/set/23
PDI-22-R1-N-51 - Eleitor do Futuro: Goiânia	Em andamento	20	CSEL	30/out/23
PDI-22-R1-N-46 - Eleição do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA	Em andamento		CSEL	10/nov/23
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	10	CESCO	30/nov/23

7.6. Projetos concluídos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ENS-22-R1-08 - Solução de Antivirus	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches	Concluído	100	CINF
PDI-21-R1-16 - INF06 - JUS - Eleições 2022 e Atualização da Plataforma Microsoft	Concluído	100	CINF
PDI-21-R1-18 - SIS21 - Auditse	Concluído	100	CESCO
PDI-21-R1-19 - SIS20 - Adaptação do Sistema - SGRH	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-01 - Suporte às Eleições 2022	Concluído	100	AGSTI, CESCO, CINF, CSEL
PDI-22-R1-02 - Implantação do RDC ARQ	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-03 - Atualização do Sistema de Diárias	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-04 - Atualização do Sistema de Gestão de Serviços Extraordinários (GSE)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-06 - Implantar o Sistema de Gerenciamento de Propaganda Partidária Gratuita (SisAntena)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-12 - Implantação de ferramenta automatizada de comunicação externa e prestação de serviços aos clientes cidadãos da Justiça Eleitoral em Goiás.	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-17 - eSocial - 4ª fase	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015	Concluído	100	CINF, CSEL
PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (ELECONS)	Concluído	100	CESCO, CSEL
PDI-22-R1-N-38 - Adequação da rede para o serviço VOIP	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-N-40 - Eleição da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás - CIPA	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-41 - Eleição Suplementar de Iaciara	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-42 - Eleição Suplementar de Cachoeira Alta	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-43 - 12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH)	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-45 - Eleição Suplementar de São Simão	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-47 - Eleitor do Futuro - Colégio Espaço Pedagógico Educacional - Grêmio Estudantil	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-48 - Eleição da Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás - COOTEGO	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-49 - Eleitor do Futuro - Nova Veneza	Concluído	100	CSEL
PTE-22-R1-02 - Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral	Concluído	100	CESCO
PTE-22-R1-22 - Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente	Concluído	100	CESCO

8. Detalhamento dos projetos

PDI-21-R1-20 - SIS11 - Finalização do Sistema GESCOMP (Gestão por Competências)

Descrição

SEI 23.0.000011040-0

Permite o gerenciamento das competências necessárias ao desenvolvimento dos produtos entregues pelas unidades administrativas, mapeamento das competências existentes e "gap" de competências, que visa orientar as necessidades de capacitação das pessoas.

Finalidade: Concluir o desenvolvimento e implantação do Sistema de Gestão por Competências (Gescomp).

Meta: Automação do processo de Gestão por Competências do Tribunal.

Implementar novas funcionalidades no sistema GESCOMP, conforme os requisitos e regras de negócio definidos pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Responsável	Execução%
Em homologação	05/ago/22	05/ago/22			Augusto Cesar	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Planejamento	Concluído						
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Em andamento						
Realização de testes pela unidade demandante	Em andamento						
Homologação do produto	Em andamento						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						

Observações

- O Termo de Homologação foi encaminhado à SGP.

PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições**Descrição****SEI 21.0.000003441-7**

Desenvolvimento (Finalização) de Sistema de Substituição de Servidores, que envolve o processo indicação e designação de servidores para ocupação

de Funções de Confiança (FC) e Cargos Comissionados (C), por prazo determinado ou indeterminado.

Visa automatizar o processo de indicação e deferimento de substituições de cargos de direção, chefia e assessoramento no Tribunal

Meta: Automação do processo de indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança e Cargos Comissionados até setembro/2022.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em homologação	27/abr/22	27/abr/22	30/jun/23		CESCO	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						100
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído						100
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído						100
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído						100
Homologação do produto	Em andamento						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						

Observações

- A SGP continua realizando testes no sistema visando a homologação e a elaboração do manual do usuário.
- Será enviado SEI para a SGP.

PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE**Descrição**

Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online dos servidores ao seu próprio dossiê funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação	07/jan/21	07/jan/21			CESCO	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Planejamento	Concluído						
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído						
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído						
Homologação do produto	Em andamento						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						

Observações

- A SGP continua realizando testes no sistema visando a homologação e a elaboração do manual do usuário.
- Será enviado SEI para a SGP.

PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores

Descrição						
SEI: 22.0.000008626-0						
Objetivo da demanda: Desenvolver formulário pré preenchido de recadastramento de servidores, visando agilizar e otimizar o processo de revisão do cadastro de servidores.						
Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta): Facilitar o processo de solicitação de alteração de dados cadastrais pelos servidores, com a permissão de alteração de dados livres e possibilidade de solicitação de alteração de dados que exigem comprovação, com a anexação de documentos.						
Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)? Macroprocesso de apoio: Gestão de Pessoas / Processo: Gestão do quadro de pessoal						
Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução): Facilidade e celeridade da execução do processo de recadastramento de servidores, tanto para o servidor quanto para a unidade responsável.						
Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada): 8 - Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas.						
Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico): Disponibilização de formulário eletrônico pré-preenchido com os dados dos servidores, com opção de solicitação de alteração, anexação de documentos e possibilidade de deferimento pela unidade responsável, com gravação automática no SGRH.						
Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante? Não						
Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda: Não se aplica						
Custo (Informe a estimativa de custo do projeto): Não se aplica						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	27/fev/23	27/fev/23	30/set/23		CESCO	10

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Em andamento						
Criação e configuração do ambiente de testes	Não iniciado						
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado						
Homologação do produto	Não iniciado						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						
Observações							
<ul style="list-style-type: none"> Aguardando SGP enviar a relação de informações que serão recadastradas O SEI foi encaminhado para SGP. O término previsto necessita ser reprogramado. 							

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAAC

Descrição						
<ul style="list-style-type: none"> Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal. Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO. 						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	29/abr/22	29/abr/22	19/dez/23		CESCO	50

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						
Análise de requisitos	Em andamento						
Desenvolvimento funcionalidades	Em andamento						
Testes de funcionalidades	Em andamento						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						
Observações							
Impedimento							
<ul style="list-style-type: none"> Aguardando os testes de credencias obtidas pela ADAAC para conexão ao PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas do executivo federal) 							

PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória

Descrição

SEI 2275-6

Finalidade: desenvolvimento de uma solução informatizada para o controle de informações judiciais relacionadas a medidas que envolvem gestão e destinação de valores oriundos de fianças e penas pecuniárias. Ao final, haverá a conversão do controle dos registros manuais em livros de guarda obrigatória pelos cartórios eleitorais para meio eletrônico.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento		30/ago/23	29/mar/24		CESCO, VPCRE	10

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Levantamento de requisitos	Em andamento						
Desenvolvimento da etapa I do sistema	Não iniciado						
Disponibilização do módulo I do sistema em ambiente de produção	Não iniciado						

Observações**Impedimento**

Aguardando a conclusão do Sistema de Substituições para alocar a equipe ao projeto.

PDI-22-R1-14 - Eleições da Comunidade

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	29/abr/22	29/abr/22	15/abr/24		CSEL	20

Atividades	Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe	Execução%
Sindicato dos Trabalhadores dos Correios - SINTECT/GO	Cancelado	11/nov/22	14/nov/22	17/fev/23	13/dez/22	CSEL	SESEL, SEVIN	10
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás - COSEMS/GO	Cancelado	16/jan/23	16/jan/23	13/mar/23	09/fev/23	CSEL	SESEL, SEVIN	10
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC	Cancelado	16/jan/23	16/jan/23	01/mai/23	28/fev/23	CSEL	SESEL, SEVIN	10
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES	Cancelado	18/jan/23	18/jan/23	12/mai/23	09/mar/23	CSEL	SESEL, SEVIN	10
Eleitor do Futuro - Colégio Espaço Pedagógico Educacional - Grêmio Estudantil	Concluído	01/fev/23	01/fev/23	27/fev/23	27/fev/23	CSEL	SESEL, SEVIN	100
Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás - COOTEGO	Concluído	10/fev/23	10/fev/23	14/mar/23	10/mar/23	CSEL	SESEL	100
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás - CIPA	Concluído	10/mai/23	10/mai/23	31/mai/23	31/mai/23	CSEL	SESEL, SEVIN	100
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023 - CMDCA 2023	Concluído	06/fev/23	06/fev/23	02/out/23	02/out/23	CSEL	SESCO, SESEL, SEVIN, SECAD	100
Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA	Em andamento	15/ago/23	15/ago/23	10/nov/23		CSEL	SESEL, SEVIN	20
Eleitor do Futuro: Nova Veneza	Concluído	23/ago/23	23/ago/23	22/set/23	22/set/23	CSEL	SESEL, SEVIN	100
Eleitor do Futuro: Goiânia	Em andamento	05/out/23	06/out/23	30/out/23		CSEL	SESEL, SEVIN	20

PDI-22-R1-15 - Eleições Suplementares

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em andamento					CSEL	

Atividades	Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe	Execução%
Eleição Suplementar de Iaciara	Concluído	09/jan/23	09/jan/23	15/mar/23	13/mar/23	CSEL	SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD	100
Eleição Suplementar de Cachoeira Alta	Concluído	12/jun/23	12/jun/23	09/ago/23	09/ago/23	CSEL	SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD	100
Eleição Suplementar de Turvelândia	Suspensão	12/jun/23	12/jun/23	09/ago/23	14/jul/23	CSEL	SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD	20
Eleição Suplementar de São Simão	Concluído	24/jul/23	24/jul/23	06/set/23	06/set/23	CSEL	SESRE, SESEL, SEVIN, SECAD	100
Eleição Suplementar de Bom Jardim	Não iniciado							

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em andamento			30/jun/23		CESCO	30

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído						
Realização de testes pela equipe de desenvolvimento	Em andamento						
Homologação do produto	Não iniciado						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						

Observações

- **Impedimento**
Aguardando contratação do novo colaborador. O colaborador contratado no dia 19/09/2023 foi dispensado.

PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI

Descrição

SEI nº: 21.0.000005057-9 (principal) e 21.0.000005046-3

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento			30/jun/23		CESCO	80

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído						
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído						
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído						
Validação do MFA (CISCO-DUO) no sistema	Concluído						
Homologação do produto	Em andamento						
Elaboração do manual de instalação e configuração do DUO	Em andamento						
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado						

Observações

- Foi definido juntamente com a unidade gestora (SJD) o prazo de 06/11 para disponibilização da versão 4.1 em ambiente de produção.

PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (17 postos do TJ)

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento			31/mar/24		CINF	60

Etapas	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Execução%
São Luis de Montes Belos - Ivollândia	Concluído					
Goiatuba - Panamá	Concluído					50
Fazenda Nova - Novo Brasil	Concluído					
Fazenda Nova - Jaupaci	Concluído					
Fazenda Nova - Israelândia	Concluído					
Luziânia - Jardim Ingá	Concluído	31/jul/23				
Carmo do Rio Verde	Concluído	31/mai/23	31/mai/23	09/jun/23		10
Faina	Concluído	17/mai/23	17/mai/23	23/mai/23		100
Perolândia	Concluído					100
Caldazinha	Concluído					100
Distrito Jardim ABC	Concluído					100
Portelândia	Concluído					100
Preparação de ambiente seguro e desenvolvimento de template	Concluído					100
Rio Quente	Concluído					100
Aporé	Em andamento	17/mai/23	17/mai/23			
São Miguel do Passa Quatro	Em andamento					

Observações

Computador do Jardim Ingá foi preparado e será enviado na semana dos dias 11 a 15/09.

PDI-22-R1-30 - Manutenção evolutiva do Sistema de Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (SIAPEXo)

Descrição

SEI 22.0.000013785-9

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação					CESCO	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Execução%
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído					
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído					
Planejamento	Concluído					
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado					
Homologação do produto	Em andamento					
Observações						
Foi recomendado pela Diretoria-Geral a formalização da homologação do sistema.						

PDI-22-R1-31 - Suporte às Eleições 2024

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	09/jan/23	09/jan/23	19/dez/24		AGSTI, ASPJE, CESCO, CINF, CSEL	10

Macroatividades	Situação	Execução%	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe
12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH)	Concluído	100	12/jun/23	12/jun/23	02/ago/23	07/ago/23	CSEL	SEVIN, SECAD
Voto Eletrônico	Em andamento	30	12/dez/22	12/dez/22	20/dez/24		CSEL	
Cadastro Eleitoral	Em andamento	30	23/jan/23	23/jan/23	20/dez/24		CSEL	

Atividades Cadastro Eleitoral	Situação
Retorno Atendimento Biométrico - Nerópolis - ZE 054	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Santo Antônio do Descoberto - ZE 024	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Mineiros - ZE 021	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Planaltina - ZE 044	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Caçu - ZE 106	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Formosa - ZE 011	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Itajá - ZE 096	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Alvorada do Norte - ZE 123	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Cachoeira Alta - ZE 097	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Posse - ZE 029	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Quirinópolis - ZE 046	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - São Domingos - ZE 047	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Santa Helena de Goiás - ZE 066	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Campos Belos - ZE 105	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Paraúna - ZE 043	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Cavalcante - ZE 099	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Palmeiras de Goiás - ZE 020	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Alto Paraíso - ZE 143	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Jaraguá - ZE 017	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Padre Bernardo - ZE 131	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Goianésia - ZE 074	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Águas Lindas de Goiás - ZE 028	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Niquelândia - ZE 041	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Pirenópolis - ZE 026	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Uruaçu - ZE 050	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Piracanjuba - ZE 025	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Mara Rosa - ZE 088	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Caldas Novas - ZE 007	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Formoso - ZE 125	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Morrinhos - ZE 022	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Minaçu - ZE 130	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Goiatuba - ZE 038	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Porangatu - ZE 055	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Buriti Alegre - ZE 005	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Itumbiara - ZE 016	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Bom Jesus - ZE 124	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Crixás - ZE 085	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Pontalina - ZE 045	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Itapaci - ZE 039	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Ceres - ZE 072	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Itauçu - ZE 057	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Rubiataba - ZE 076	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Itaberaí - ZE 015	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Mozarlândia - ZE 110	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Itapuranga - ZE 077	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - São Miguel do Araguaia - ZE 094	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Goiás - ZE 012	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Silvânia - ZE 031	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Pires do Rio - ZE 027	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Ipameri - ZE 014	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Catalão - ZE 008	Concluído

Retorno Atendimento Biométrico - Cristalina - ZE 036	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Luziânia - ZE 019	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Cidade Ocidental - ZE 042	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Valparaíso - ZE 033	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Novo Gama - ZE004	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Alexânia - ZE 087	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Jataí - ZE 018	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Rio Verde - ZE 030 e 140	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Acreúna - ZE 128	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Edeia - ZE 068	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Anicuns - ZE 034	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Fazenda Nova - ZE 079	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Jussara - ZE 095	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Aragarças - ZE 035	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Piranhas - ZE 102	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Caiapônia - ZE 006	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Iporá - ZE 053	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - São Luis de Montes Belos - ZE 080	Concluído
Retorno Atendimento Biométrico - Firminópolis - ZE 063	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Formoso - ZE 125	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Guapó - ZE 056	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Inhumas - ZE 013	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Bela Vista de Goiás - ZE 032	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Goianira - ZE 101	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Trindade - ZE 049	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Senador Canedo - ZE 040	Concluído
Atendimento Biométrico - Elaboração do Treinamento	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Aparecida de Goiânia - ZE 119, 132 e 145	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Anápolis - ZE 003, 141 e 144	Concluído
Retorno do Atendimento Biométrico - Goiânia - ZE 001, 002, 127, 133, 134, 135, 136, 146 e 147	Concluído
Implantação - Software Griaule BCC - Coleta Biométrica	Em andamento

Atividades Voto Eletrônico	Situação	Execução%	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe
Ampliação do Depósito de Urna	Em andamento	30	01/mar/23	01/mar/23	29/fev/24		CSEL	SEVIN
Recolhimento das urnas - Eleições dos Conselhos Tutelares 2023	Em andamento		09/out/23	09/out/23			CSEL	
Patrimônio das Urnas	Em andamento	70	14/jun/23	14/jun/23	30/set/23	23/jun/23	CSEL	SEVIN
Manutenção das Urnas	Em andamento	20	13/fev/23	02/mar/23	30/ago/24		CSEL	SEVIN
Recolhimento das urnas - Eleições 2024	Não iniciado						CSEL	SEVIN
Envio das urnas - Eleições 2024	Não iniciado						CSEL	SEVIN
Preparação de Materiais - Eleições 2024	Não iniciado						CSEL	SEVIN
Suprimentos das Urnas	Não iniciado						CSEL	SEVIN
Envio das urnas - Eleições dos Conselhos Tutelares 2023	Concluído	100	18/set/23	18/set/23	22/set/23	22/set/23	CSEL	SEVIN
Recolhimento das urnas - Eleições 2022	Concluído	100	12/dez/22	12/dez/22	15/mar/23	12/mar/23	CSEL	SEVIN

PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede cabeada e sem fio

Descrição						
SEI nº 23.0.00003147-0						
Aquisição de Solução de rede cabeada (LAN e TOR) e sem fio (Wi-fi) com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral.						
Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	28/fev/23	28/fev/23	30/set/23		CINF	30

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Elaboração do DOD.	Concluído	20/fev/23	20/fev/23	28/fev/23	28/fev/23	CINF	100
Elaboração do ETP.	Concluído	20/mar/23	20/mar/23	19/mar/23	18/mar/23	CINF	100
Elaboração do TR.	Em andamento						10
Processo de licitação.	Não iniciado						
Execução da ARP.	Não iniciado						
Implementação da solução.	Não iniciado						

Observações

- Termo de referência em fase de elaboração.
- O término previsto da licitação está previsto para 19/12 devido a priorização de outros projetos na unidade.

PDI-22-R1-N-34 - Reaparelhamento dos serviços de impressão

Descrição						
SEI nº 23.0.000002396-5						
Objetivo:						
Melhorar a infraestrutura de microinformática das Zonas Eleitorais e seus postos de atendimento e da Sede do TRE-GO, a fim de oferecer recursos de TI que promovam maior eficiência dos usuários no desempenho de suas atividades laborais.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	13/fev/23	13/fev/23	18/dez/23		CINF	50

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Processo de licitação.	Em andamento						
Implantação da solução.	Não iniciado						
Execução da ARP.	Não iniciado						
Elaboração do TR.	Concluído						100
Elaboração do ETP.	Concluído						100
Elaboração do DOD.	Concluído						100

Observações						
<ul style="list-style-type: none"> O pregão eletrônico ocorreu no dia 02/10 e está na fase de análise de propostas, com reabertura agendada para o dia 06/10 às 09:00. 						

PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle

Descrição						
A implantação de ferramentas de segurança e proteção em um SGDB Oracle é fundamental para proteger os dados críticos de uma organização. Tem como objetivo principal garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados armazenados no banco de dados.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento		01/jun/23	30/nov/23		CESCO	10

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Instalação/ativação da feature	Concluído						10
Implementação das primeiras funcionalidades	Não iniciado						
Testes em ambiente real	Não iniciado						
Aplicação em ambiente virtual	Em andamento						
Estudos sobre as funcionalidades	Em andamento						

PDI-22-R1-N-37 - Manutenção preventiva de urnas

Descrição						
A manutenção preventiva envolve a verificação regular de hardware e software das urnas eletrônicas para identificar e corrigir problemas antes que eles causem falhas durante uma eleição. Isso ajuda a garantir que as eleições ocorram sem interrupções significativas.						
Painel de acompanhamento						
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojMGYxNWE0ODUtZTc2ZS00N2JhLTkxOGUtZGFyYz1NmFmMjU5liwidCI6IjZzjA4NzlyLTJOWUtNGVhZS1iN2VklThMmI3N2ZmM2Q5YyJ						
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	13/fev/23	02/mai/23	30/ago/24		CSEL	20

Atividades	Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Equipe	Execução%
Realização do 1º Run In 2023	Cancelado	13/fev/23		28/abr/23		SEVIN	
Realização do 2º Run In 2023	Concluído	01/mai/23	03/mai/23	31/ago/23	29/ago/23	SEVIN	100
Realização do 3º Run In 2023	Em andamento	01/set/23	01/set/23	19/dez/23		SEVIN	20
Realização do 1º Run In 2024	Não iniciado	08/jan/24		30/abr/24		SEVIN	
Realização do 2º Run In 2024	Não iniciado	01/mai/24		30/ago/24		SEVIN	
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 1º Lote (Qtde: 1.000)	Concluído	26/set/23	26/set/23	29/set/23	29/set/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 2º Lote (Qtde: 1.000)	Não iniciado					SEVIN	
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 3º Lote (Qtde: 4.076)	Não iniciado					SEVIN	

PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante

Descrição						

A implantação de um backbone secundário redundante é uma estratégia utilizada para garantir a disponibilidade contínua dos serviços de rede e minimizar o tempo de inatividade em caso de falhas. É uma solução recomendada para empresas que buscam alta disponibilidade e confiabilidade em suas redes de comunicação.

- Projeto de instalação de links internet dedicados redundantes nos Cartórios Eleitorais.
- SEI n 22.0.000018741-4
- Contrato 05/2023
- Ata de registro de preços nº 68/2022

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	08/fev/23	08/fev/23	30/jun/23		CINF	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Equipe	Execução%
Processo de contratação.	Concluído							
Preparação da infraestrutura de rede.	Concluído							
Reunião de planejamento da implantação.	Concluído							
Implantação dos links nos cartórios eleitorais.	Em andamento					CINF		90

Observações

- O término previsto foi programado para **06/10**, em razão de problemas de passagem de cabos nos prédios do TJ em 1 ZE (Novo Gama) - falta atuação do TJ para limpeza da tubulação e espaço no rack.

PDI-22-R1-N-46 - Eleição do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA

Descrição

SEI: 23.0.0000.11678-5

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe	Execução%
Em andamento	15/ago/23	15/ago/23	10/nov/23		CSEL	SESEL, SEVIN	20

Atividades	Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Equipe	Execução%
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade	Concluído	17/ago/23	17/ago/23	31/ago/23	31/ago/23	CSEL	SESEL	100
Elaboração do Acordo de Colaboração	Concluído	21/set/23	21/set/23	25/set/23	06/out/23	CSEL	SESEL	100
Configuração da Eleição	Não iniciado	23/out/23		30/out/23		CSEL	SESEL	
Entrega da Base de Candidatos	Não iniciado	27/out/23		27/out/23		CSEL	SESEL	
Entrega da Base de Eleitores	Não iniciado	27/out/23		27/out/23		CSEL	SESEL	
Entrega das Listas de Eleitores	Não iniciado	27/out/23		27/out/23		CSEL	SESEL	
Preparação - VVfoto	Não iniciado	30/out/23		30/out/23		CSEL	SESEL, SEVIN	
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Não iniciado	31/out/23		31/out/23		CSEL	SESEL, SEVIN	
Geração de Mídias	Não iniciado	31/out/23		31/out/23		CSEL	SESEL	
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Não iniciado	06/nov/23		06/nov/23		CSEL	SEVIN	
Retirada das Urnas Eletrônicas	Não iniciado	06/nov/23		06/nov/23		CSEL	SEVIN	
Suporte às Eleições	Não iniciado	08/nov/23		08/nov/23		CSEL	SEVIN	
Devolução das Urnas Eletrônicas	Não iniciado	10/nov/23		10/nov/23		CSEL	SEVIN	

PDI-22-R1-N-50 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas

Descrição

SEI n. 23.0.000006767-9

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/mar/23	01/mar/23	29/fev/24		CSEL	30

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Equipe	Execução%
Reuniões com a CEIN - Definição dos Requisitos	Concluído					CSEL		100
Elaboração do Projeto pela CEIN	Concluído							100
Reunião entre a CEIN, CSEL e SEVIN	Concluído					CSEL	SEVIN	100
Adaptação do Projeto	Concluído							100
Apresentação do Projeto - STI, CSEL e CEIN	Concluído					STI	CSEL, SEVIN	100
Elaboração do ETP, TR, Selo Verde etc pela CEIN	Concluído							100
Contratação do Serviço	Não iniciado							

Execução da Reforma	Não iniciado						
Entrega e Conclusão do Projeto	Não iniciado						
Licitação	Em andamento						

PDI-22-R1-N-51 - Eleitor do Futuro: Goiânia

Descrição							
SEI 23.0.00004772-4							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%	
Em andamento	05/out/23	06/out/23	30/out/23		CSEL	20	

Atividades	Situação
Locais: Presidente Vargas, Dom Tomás Balduino, Virginia Gomes Pereira, Marcos Antônio Dias Batista, Joé Viana, São José, Vicente Rodrigues Prado, Professor Nadal Sfredo e CEPAE UFG;	Concluído
Entrega da Base de Eleitores	Em andamento
Entrega da Base de Candidatos	Em andamento
Configuração da Eleição	Em andamento
Geração de Mídias	Não iniciado
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Não iniciado
Entrega da Listas de Eleitores	Não iniciado
Retirada das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Suporte às Eleições	Não iniciado
Devolução das Urnas Eletrônicas	Não iniciado

ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software

Descrição						
Possui o intuito de estabelecer padrões de segurança no desenvolvimento de software.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CESCO	60

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						100
Elaboração da minuta do documento normativo	Em andamento						

Observações
<ul style="list-style-type: none"> Foi encaminhado para os chefes de seções da CESCO a minuta do normativo de desenvolvimento seguro, que está em análise por parte dos titulares das unidades.

ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados

Descrição						
O gerenciamento de backup e restauração de dados objetiva instituir diretrizes, responsabilidades e competências que visam garantir a segurança, integridade e disponibilidade dos dados custodiados pelo TRE-GO.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Planejamento	Concluído						
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído						
Implantação	Concluído						
Revisão do normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE	Concluído						
Apresentação de minuta de Portaria sobre cópia e restauração de dados.	Em andamento						

Observações
<ul style="list-style-type: none"> Agendada reunião do CTGTI para apreciação da minuta do normativo para o dia 23/10/2023 às 14:00.

ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação

Descrição						
Dispõe sobre as regras e os procedimentos para gestão de incidentes de segurança da informação do TRE-GO.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI, CESCO, CINF	70

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído						
Análise da minuta do normativo pela Assessoria da Diretoria Geral	Concluído						
Publicação do normativo	Não iniciado						
Observações							
Aguardando aprovação pela Diretoria Geral.							

ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas

Descrição							
SEI 1975-9							
Possui o objetivo de proteger, controlar, gerenciar, auditar e monitorar contas privilegiadas a ativos críticos do TRE-GO. São considerados ativos críticos:							
<ul style="list-style-type: none"> Equipamentos servidores físicos e virtuais que hospedam todos os sistemas eleitorais, administrativos e judiciais; Servidores de Banco de Dados; Servidores de Arquivos Corporativos; Servidores de Correio Eletrônico; Equipamentos Firewalls, Balance adores de Carga, Switches de Rede, Proxy, Contas de Serviços, dentre outros. 							
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%	
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	80	

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						
Aquisição	Concluído						
Instalação e configuração	Concluído						
Transferência de conhecimento	Concluído						
Disponibilizar em produção - ambiente Microsoft.	Em andamento						
Disponibilizar em produção - ambiente Linux.	Em andamento						
Observações							
O Hands-on com a empresa foi agendado para o período de 09 à 11/10.							

ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)

Descrição							
SEI 6237-9							
Ferramenta que possui a finalidade de prover uma autenticação mais segura dos usuários de sistemas informatizados, por meio da confirmação da identidade do usuário, em dois ou mais momentos, antes de liberar o seu acesso a um determinado sistema.							
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%	
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	90	

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						
Aquisição	Concluído						
Instalação e configuração	Concluído						
Transferência de conhecimento	Concluído						
Máquinas dos postos avançados - Prefeitura/TJ - uso da VPN.	Concluído						
Máquinas da JE - Home Office - uso de VPN.	Concluído						
Disponibilizar em produção - Portal internet.	Concluído						
Disponibilizar em produção - E-mail.	Concluído						
Disponibilizar em produção - Sistema SEI 3.5/4.0	Em andamento						
Migrar os usuários de e-mail para o CISCO-DUO	Em andamento						
Observações							
<ul style="list-style-type: none"> Em fase de migração dos usuários em teletrabalho do portal vpn para o CISCO-DUO. 							

ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização

Descrição							

SEI 3619-0

As pessoas são o elo mais fraco quando falamos em segurança cibernética. Costumam ser a porta de entrada para criminosos cibernéticos invadirem a rede, roubarem informações valiosas e causarem grandes prejuízos financeiros e de imagem às instituições. Treinar e conscientizar pessoas é primordial para o fortalecimento da segurança da infraestrutura tecnológica e dos dados pessoais. A contratação de solução para conscientização em segurança da informação está prevista na Estratégia Nacional de Cibersegurança da Justiça Eleitoral. A estratégia prevê que os servidores e colaboradores devem ser capacitados a fim de reduzir os riscos na área de segurança cibernética. É importante que os funcionários entendam os objetivos da segurança da informação e o impacto potencial, positivo e negativo d seu próprio comportamento na organização.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	80

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						
Aquisição	Concluído						
Instalação e configuração	Concluído						
Transferência de conhecimento	Concluído						
Implantação	Em andamento						

Observações

- A primeira trilha de segurança cibernética está agendada para ser disponibilizada no dia 16/10/2023.

ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação**Descrição**

Possui a finalidade de estabelecer as diretrizes para o controle de acesso e uso aceitável dos recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal, bem como os direitos e as responsabilidades dos usuários desses recursos.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF, STI	90

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Planejamento	Concluído						
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						
Norma finalizada	Concluído						
Revisão do normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE	Em andamento						

ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos**Descrição**

O uso de recursos criptográficos visa proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos pelas redes de computadores, assim como dos dados em repouso, armazenados em servidores, microcomputadores, dispositivos móveis e bancos de dados.

Situação	Início previsto	Início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CESCO, CINF	60

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Linux.	Concluído						
Implantação de criptografia do Portal de acesso externo - escritório remoto.	Concluído						
Implantação de criptografia em conexões VPN.	Concluído						
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.	Concluído						
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						
Planejamento	Concluído						
Mapeamento do processo de certificação de sites e sistemas de informação	Não iniciado						
Implantação de criptografia em notebooks standalone - Bitlocker.	Não iniciado						
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores de aplicação e de Bancos de dados.	Em andamento						
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS - Bitlocker.	Em andamento						
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS - Bitlocker.	Em andamento						
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.	Em andamento						
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores	Em andamento						

Observações

Impedimento:

Será feita a atualização da solução de backup para andamento sobre o uso dos recursos criptográficos. dia 11/09/2023.

PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC

Descrição

Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estabelecido no Guia

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		STI	80

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, alinhado ao número de usuários internos e externos de recursos de TIC conforme referencial mínimo estabelecido no Guia	Concluído					STI	100
Propor a adequação dos recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos da atividade anterior	Em andamento					STI	

Observações

Está sendo elaborada a proposta de adequação dos recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos para encaminhamento à Alta Administração.

PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26

Descrição

Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD e encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica.

<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706>

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	28/jul/23		AGSTI	70

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Elaborar e acompanhar o Plano de Trabalho, conforme critérios da ENTIC	Em andamento					AGSTI	
Enviar o Plano de Trabalho ao CNJ	Concluído					AGSTI	
Mapear e/ou validar processo de publicação e divulgação periódica de planos junto aos repositórios nacional e regional, designando responsáveis	Concluído					AGSTI	

PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC

Descrição

Definir processos de continuidade de serviços de TI, em caso de eventos de causas naturais, acidentais, tecnológicas ou humanas.

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	50

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						
Estabelecer Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papeis e responsabilidades	Em andamento						
Estabelecer o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC	Em andamento						
Transferência de conhecimento	Não iniciado						
Testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC	Não iniciado						

PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC

Descrição

Os projetos de Tecnologia da Informação, deverão passar por análise de riscos de segurança da informação antes de sua implementação.

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		AGSTI	50

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						
Mapeamento do processo de trabalho	Em andamento						
Elaborar, revisar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado com o plano institucional de gestão de riscos	Em andamento						
Transferência de conhecimento	Não iniciado						
Implantação	Não iniciado						

PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.

Descrição							
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%	
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		CESCO, CINF	20	

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	Em andamento					CESCO	

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

Descrição							
SEI nº:							
Objetivo da demanda:							
Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.							
Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):							
A falta catalogação dos ativos de TI, tanto <i>hardware</i> quanto <i>software</i> , dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataque cibernéticos de qualquer natureza.							
Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?							
Gestão de TI e apoio à Governança Desenvolvimento e administração de soluções de TIC Gestão de infraestrutura de TIC Suporte técnico das soluções de TIC							
Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):							
1. Visibilidade de todo o parque de <i>hardware</i> do Tribunal. 2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional. 3. Visibilidade de todos os <i>softwares</i> em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.							
Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):							
Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados. Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026							
Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):							
Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?							
Não							
Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:							
Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):							
Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em <i>Software Livre</i> , sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.							
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%	
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		AGSTI	70	

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Planejamento	Concluído						
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído						
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído						
Aquisição da solução	Concluído						
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	Em andamento					CESCO, CINF, CSEL	
Instalação e configuração da solução	Em andamento						
Transferência de conhecimento	Não iniciado						
Implantação	Não iniciado						

Estabelecer rotina de, regularmente, avaliar o parque, inventariar ativos, auditar e tratar não conformidades relativas aos registros dos ativos no CMDB, abrangendo hardwares, softwares, links etc.	Não iniciado						
---	--------------	--	--	--	--	--	--

Observações

Em fase de configuração do OCS para identificação de impressoras e ativos de rede.

PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/23		AGSTI	10

Atividades	Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Análise dos modelos de governança de serviços de TIC existentes	Concluído						
Implementar/Avaliar processos de gerenciamento de serviços que impactem a satisfação dos usuários	Em andamento					AGSTI	
Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções	Adiado						
Implementar as soluções priorizadas	Adiado						



Documento assinado eletronicamente por **BRAYTON MARQUES SANTANA, COORDENADOR(A)**, em 16/10/2023, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 16/10/2023, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 16/10/2023, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 16/10/2023, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 16/10/2023, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0642424** e o código CRC **AE303A01**.
