



ATA

REUNIÃO CTGTI - 24/2023

1. Identificação

Data: 7 de dez. de 2023	Início: 14:45 Término: 16:00	Local: Sala de reunião da STI
Finalidade: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados.


5. Participantes da reunião

Nome	Unidade	E-mail
Frank Wendell Ribeiro	STI	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Marcilio Zaccarelli Bersaneti	CINF	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	AGSTI	paulo.taira@tre-go.jus.br
Augusto César de Castro Ovelar	CESCO	augusto.ovelar@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	CSEL	dory.gonzaga@tre-go.jus.br


6. Anotações

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas;
- Projetos concluídos:
- PDI-22-R1-N-46 - Eleição do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA;
- PDI-22-R1-N-52 - Eleição Suplementar de Bom Jardim de Goiás.

7. Portfólio de projetos

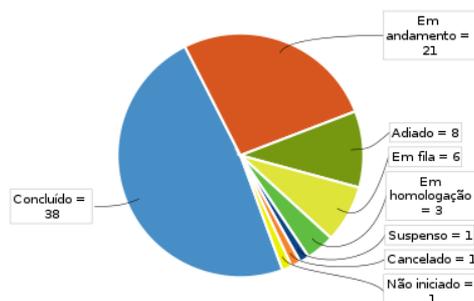

Total: 79 . Gráfico por: Status

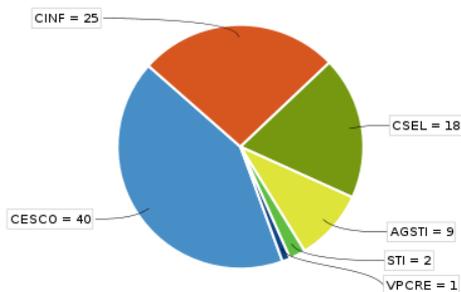

Total: 79 . Gráfico por: Unidade responsável

7.1. Programa: Suporte às Eleições 2024 (ELE) - Projetos em Andamento/Homologação

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas	Em andamento	90	CSEL
ELE24-22-R1-03 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas	Em andamento	30	CSEL

7.2. Programa: Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos em Andamento/Homologação

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação	90	CESCO
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Em andamento	10	CESCO
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em andamento	70	CESCO
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	10	CESCO, VPCRE
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	30	CESCO
PDI-22-R1-30 - Manutenção evolutiva do Sistema de Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (SIAPEXo)	Em homologação	90	CESCO
PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede cabeada e sem fio	Em andamento	50	CINF
PDI-22-R1-N-34 - Reaparelhamento dos serviços de impressão	Em andamento	90	CINF
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	30	CESCO

7.3. Programa: Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Em andamento	80	CESCO
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Em andamento	90	CINF
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90	CINF
ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF	Em andamento	90	CINF
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Em andamento	60	CESCO, CINF

7.4. Programa: Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC	Em andamento	80	STI
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Em andamento	50	AGSTI
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Em andamento	50	AGSTI
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	20	CESCO, CINF
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	70	AGSTI

PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente	Em andamento	10	AGSTI
---	--------------	----	-------

7.5. Projetos adiados, não iniciados e suspensos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40	CESCO, CINF
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40	CINF
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Adiado	40	CINF
PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Adiado	10	CESCO
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Adiado	10	CESCO
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Adiado	10	CESCO
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Adiado	50	CESCO
PDI-22-R1-N-44 - Eleição Suplementar de Turvelândia	Suspensão		CSEL
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Não iniciado		CESCO, CINF

7.6. Projetos/macro atividades com término previsto em até 60 dias

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Término previsto
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	30	CESCO	30/jun/23
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação	90	CESCO	30/jun/23
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Em andamento	10	CESCO	30/set/23
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Em andamento	80	CESCO	19/dez/23
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI	19/dez/23
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Em andamento	90	CINF	19/dez/23
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90	CINF	19/dez/23
ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF	Em andamento	90	CINF	19/dez/23
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em andamento	70	CESCO	19/dez/23
PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC	Em andamento	80	STI	19/dez/23
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Não iniciado		CESCO, CINF	19/dez/23
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Adiado	40	CINF	19/dez/23
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40	CINF	19/dez/23
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Adiado	50	CESCO	19/dez/23
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Adiado	10	CESCO	19/dez/23
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Adiado	10	CESCO	19/dez/23
PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Adiado	10	CESCO	19/dez/23
PDI-22-R1-N-34 - Reaparelhamento dos serviços de impressão	Em andamento	90	CINF	29/dez/23

7.7. Projetos concluídos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ELE24-22-R1-02 - 12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH)	Concluído	100	CSEL
ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados	Concluído	90	CINF
ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Concluído	100	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-08 - Solução de Antivirus	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização	Concluído	100	AGSTI
ENS-22-R1-13 - Solução de Segurança do AD	Concluído	100	CINF

PDI-21-R1-16 - INF06 - JUS - Eleições 2022 e Atualização da Plataforma Microsoft	Concluído	100	CINF
PDI-21-R1-18 - SIS21 - Auditse	Concluído	100	CESCO
PDI-21-R1-19 - SIS20 - Adaptação do Sistema - SGRH	Concluído	100	CESCO
PDI-21-R1-20 - SIS11 - Finalização do Sistema GESCOMP (Gestão por Competências)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-01 - Suporte às Eleições 2022	Concluído	100	AGSTI, CESCO, CINF, CSEL
PDI-22-R1-02 - Implantação do RDC ARQ	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-03 - Atualização do Sistema de Diárias	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-04 - Atualização do Sistema de Gestão de Serviços Extraordinários (GSE)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-06 - Implantar o Sistema de Gerenciamento de Propaganda Partidária Gratuita (SisAntena)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-12 - Implantação de ferramenta automatizada de comunicação externa e prestação de serviços aos clientes cidadãos da Justiça Eleitoral em Goiás.	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-17 - eSocial - 4ª fase	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015	Concluído	100	CINF, CSEL
PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (Acordo de colaboração TJ)	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (ELECONS)	Concluído	100	CESCO, CSEL
PDI-22-R1-N-38 - Adequação da rede para o serviço VOIP	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-N-40 - Eleição da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás - CIPA	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-41 - Eleição Suplementar de Iaciara	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-42 - Eleição Suplementar de Cachoeira Alta	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-45 - Eleição Suplementar de São Simão	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-46 - Eleição do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-47 - Eleitor do Futuro - Colégio Espaço Pedagógico Educacional - Grêmios Estudantil	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-48 - Eleição da Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás - COOTEGO	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-49 - Eleitor do Futuro - Nova Veneza	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-51 - Eleitor do Futuro: Goiânia	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-52 - Eleição Suplementar de Bom Jardim de Goiás	Concluído	100	CSEL
PTE-22-R1-02 - Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral	Concluído	100	CESCO
PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26	Concluído	100	AGSTI
PTE-22-R1-22 - Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente	Concluído	100	CESCO

8. Detalhamento dos projetos

ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas

Descrição					
A manutenção preventiva envolve a verificação regular de hardware e software das urnas eletrônicas para identificar e corrigir problemas antes da eleição. Isso ajuda a garantir que as eleições ocorram sem interrupções significativas.					
Painel de acompanhamento					
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiMGYxNWE0ODUtZTc2ZS00N2JhLTkxOGUtZGFYzc1NmFmMjU5IiwidCI6IjZjaA4NzlyLTFjOWUtNGVkdzI1					
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade
Em andamento	13/fev/23	02/mai/23	30/ago/24		

Atividades	Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Equipe	Execução%
Realização do 1º Run In 2023	Cancelado	13/fev/23		28/abr/23		SEVIN	
Realização do 2º Run In 2023	Concluído	01/mai/23	03/mai/23	31/ago/23	29/ago/23	SEVIN	100
Realização do 3º Run In 2023	Em andamento	01/set/23	01/set/23	19/dez/23		SEVIN	90
Realização do 1º Run In 2024	Não iniciado	08/jan/24		30/abr/24		SEVIN	
Realização do 2º Run In 2024	Não iniciado	01/mai/24		30/ago/24		SEVIN	
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 1º Lote (Qtde: 1.000)	Concluído	26/set/23	26/set/23	29/set/23	29/set/23	SEVIN	100

Realização do Aceite das Urnas 2022 - 2º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	07/nov/23	07/nov/23	07/nov/23	07/nov/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 3º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	20/nov/23	17/nov/23	20/nov/23	17/nov/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 4º Lote (Qtde: 1.200)	Em andamento	28/nov/23	01/dez/23	30/nov/23	05/dez/23	SEVIN	80
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 5º Lote (Qtde: 1.200)	Não iniciado	04/dez/23	05/dez/23	06/dez/23		SEVIN	
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 6º Lote (Qtde: 276)	Não iniciado	07/dez/23	05/dez/23	19/dez/23		SEVIN	
Certificação das Urnas 2022 - Todos os Lotes (Qtde: 6.076)	Não iniciado	11/dez/23		19/dez/23		SEVIN	

ELE24-22-R1-03 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas

Descrição						
SEI n. 23.0.000006767-9 As urnas eletrônicas requerem manutenção regular e armazenamento adequado para garantir que funcionem corretamente durante as eleições. Ter um depósito central maior e com equipamentos mais modernos facilita o processo de manutenção, armazenamento e garantia de que todas as urnas estejam em boas condições.						
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/mar/23	01/mar/23	29/fev/24		CSEL	60

Atividades	Situação
Reuniões com a CEIN - Definição dos Requisitos	Concluído
Elaboração do Projeto pela CEIN	Concluído
Reunião entre a CEIN, CSEL e SEVIN	Concluído
Adaptação do Projeto	Concluído
Apresentação do Projeto - STI, CSEL e CEIN	Concluído
Elaboração do ETP, TR, Selo Verde etc pela CEIN	Concluído
Licitação	Concluído
Execução da Reforma	Não iniciado
Entrega e Conclusão do Projeto	Não iniciado
Contratação do Serviço	Em andamento
Observações	
O processo está na Diretoria Geral para homologação do certame.	

PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições

Descrição						
SEI 21.0.000003441-7 Desenvolvimento (Finalização) de Sistema de Substituição de Servidores, que envolve o processo indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança (FC) e Cargos Comissionados (CJ), por prazo determinado ou indeterminado. Visa automatizar o processo de indicação e deferimento de substituições de cargos de direção, chefia e assessoramento no Tribunal Meta: Automação do processo de indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança e Cargos Comissionados até setembro/2022.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em homologação	27/abr/22	27/abr/22	30/jun/23		CESCO	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
Os ajustes solicitados pela SGP foram concluídos. Os testes visando a homologação do sistema foram retomados. A previsão para homologação foi alterada para janeiro de 2024.	

PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE

Descrição						
Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online do funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação	07/jan/21	07/jan/21	29/mar/24		CESCO	90
Atividades						Situação
Planejamento						Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes						Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica						Concluído
Realização de testes pela unidade demandante						Concluído
Homologação do produto						Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção						Não iniciado
Observações						
Os ajustes solicitados pela SGP foram concluídos. Os testes visando a homologação do sistema foram retomados. A previsão para homologação foi alterada para janeiro de 2024.						

PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores

Descrição						
SEI: 22.0.000008626-0						
Objetivo da demanda: Desenvolver formulário pré preenchido de recadastramento de servidores, visando agilizar e otimizar o processo de revisão do cadastro de servidores.						
Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta): Facilitar o processo de solicitação de alteração de dados cadastrais pelos servidores, com a permissão de alteração de dados livres e possibilidade de solicitação de alteração de dados que exigem comprovação, com a anexação de documentos.						
Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)? Macroprocesso de apoio: Gestão de Pessoas / Processo: Gestão do quadro de pessoal						
Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução): Facilidade e celeridade da execução do processo de recadastramento de servidores, tanto para o servidor quanto para a unidade responsável.						
Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada): 8 - Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas.						
Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico): Disponibilização de formulário eletrônico pré-preenchido com os dados dos servidores, com opção de solicitação de alteração, anexação de documentos e possibilidade de deferimento pela unidade responsável, com gravação automática no SGRH.						
Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante? Não						
Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda: Não se aplica						
Custo (Informe a estimativa de custo do projeto): Não se aplica						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	27/fev/23	27/fev/23	30/set/23		CESCO	10
Atividades						Situação
Planejamento						Em andamento
Criação e configuração do ambiente de testes						Não iniciado
Realização de testes pela unidade demandante						Não iniciado
Homologação do produto						Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção						Não iniciado
Observações						
Aguardando SGP enviar a relação de informações que serão recadastradas O SEI foi encaminhado para SGP. O término previsto necessita ser reprogramado.						

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC

Descrição
Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo Anual de Contratações do Tribunal. Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO.

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	29/abr/22	29/abr/22	19/dez/23		CESCO	70

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Análise de requisitos	Concluído
Desenvolvimento funcionalidades	Em andamento
Testes de funcionalidades	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
O projeto foi retomado após a conclusão do concurso de remoção.	

PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória

Descrição						
SEI 2275-6 Finalidade: desenvolvimento de uma solução informatizada para o controle de informações judiciais relacionadas a medidas que envolvem g fianças e penas pecuniárias. Ao final, haverá a conversão do controle dos registros manuais em livros de guarda obrigatória pelos cartórios e						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	30/ago/23	30/ago/23	29/mar/24		CESCO, VPCRE	10

Atividades	Situação
Levantamento de requisitos	Em andamento
Desenvolvimento da etapa I do sistema	Não iniciado
Disponibilização do módulo I do sistema em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
Impedimento Aguardando a conclusão do Sistema de Substituições para alocar a equipe ao projeto. O projeto será reiniciado em janeiro.	

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento		07/nov/22	30/jun/23		CESCO	30

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela equipe de desenvolvimento	Em andamento
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
A data de término previsto será redefinida após a ambientação do novo colaborador.	

PDI-22-R1-30 - Manutenção evolutiva do Sistema de Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (SIAPEXo)

Descrição						
SEI 22.0.000013785-9						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação					CESCO	90

Atividades	Situação
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Planejamento	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Homologação do produto	Em andamento
Observações	
O SEI 22.0.000013785-9 com o Termo de Homologação será enviado para a COFI.	

PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede cabeada e sem fio

Descrição						
SEI nº 23.0.000003147-0 Aquisição de Solução de rede cabeada (LAN e TOR) e sem fio (Wi-fi) com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral. Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	28/fev/23	28/fev/23	29/mar/24		CINF	50

Atividades	Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Elaboração do DOD.	Concluído	20/fev/23	20/fev/23	28/fev/23	28/fev/23	CINF	100
Elaboração do ETP.	Concluído	20/mar/23	20/mar/23	19/mai/23	18/mai/23	CINF	100
Elaboração do TR.	Concluído						10
Adequação das especificações e coleta de preços estimativos.	Em andamento						
Processo de licitação.	Não iniciado						
Execução da ARP.	Não iniciado						
Implementação da solução.	Não iniciado						
Observações							
A data de término previsto foi alterado para 29/03/2024. Termo de referência em fase de elaboração.							

PDI-22-R1-N-34 - Reparelhamento dos serviços de impressão

Descrição						
SEI nº 23.0.000002396-5 Objetivo: Melhorar a infraestrutura de microinformática das Zonas Eleitorais e seus postos de atendimento e da Sede do TRE-GO, a fim de oferecer recursos de TI que promovam maior eficiência dos usuários no desempenho de suas atividades laborais.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	13/fev/23	13/fev/23	29/dez/23		CINF	90

Atividades	Situação
Execução da ARP.	Em andamento
Implantação da solução.	Não iniciado
Processo de licitação.	Concluído
Elaboração do TR.	Concluído
Elaboração do ETP.	Concluído
Elaboração do DOD.	Concluído
Observações	
Faltando a emissão da nota de empenho e assinatura do contrato.	

PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle

Descrição						
A implantação de ferramentas de segurança e proteção em um SGDB Oracle é fundamental para proteger os dados críticos de uma organização. Tem como objetivo principal garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados armazenados no banco de dados.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento		01/jun/23	29/mar/24		CESCO	30

Atividades	Situação
Instalação/ativação da feature	Concluído

Implementação das primeiras funcionalidades	Não iniciado
Testes em ambiente real	Em andamento
Aplicação em ambiente virtual	Em andamento
Estudos sobre as funcionalidades	Em andamento

PDI-22-R1-N-52 - Eleição Suplementar de Bom Jardim de Goiás

Descrição						
Eleição Suplementar - Bom Jardim de Goiás\ SEI n. 23.0.000014272-7						
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Concluído	11/out/23	11/out/23	06/dez/23	06/dez/23	CSEL	100

Atividades	Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Planejamento - Logística de Suporte à Eleição	Concluído	11/out/23	11/out/23	11/out/23	11/out/23	CSEL	100
Ofício DG - enviar para o TSE - Confirmação da Eleição Suplementar	Concluído	17/out/23	20/out/23	17/out/23	20/out/23	CSEL	100
Configuração da Eleição - CFE	Concluído	17/out/23	20/out/23	17/out/23	20/out/23	CSEL	100
Solicitação Publicação do Processo e Sistemas Eleitorais	Concluído	18/out/23	20/out/23	18/out/23	20/out/23	CSEL	100
Solicitação das Senhas Oficiais	Concluído	19/out/23	20/out/23	20/out/23	20/out/23	CSEL	100
Liberação de Acesso aos Sistemas	Concluído	23/out/23	24/out/23	24/out/23	25/out/23	CSEL	100
Suporte à Agregações de Seção	Concluído	23/out/23	26/out/23	27/out/23	31/out/23	CSEL	100
Suporte à Convocação de Mesários	Concluído	23/out/23	26/out/23	10/nov/23	10/nov/23	CSEL	100
Suporte à TTE (Ex: Mesário)	Concluído	23/out/23	26/out/23	10/nov/23	10/nov/23	CSEL	80
Suporte à Entrega do Registro de Candidaturas	Concluído	24/out/23	24/out/23	28/nov/23	24/nov/23	CSEL	100
Suporte ao Sorteio do Horário Eleitoral	Concluído	26/out/23	26/out/23	30/out/23	31/out/23	CSEL	100
Solicitação da Impressão dos Cadernos de Votação	Concluído	13/nov/23	06/nov/23	14/nov/23	06/nov/23	CSEL	100
Preparação das Urnas Eletrônicas	Concluído	20/nov/23	20/nov/23	24/nov/23	24/nov/23	CSEL	100
Suporte ao Fechamento do Registro de Candidaturas	Concluído	30/nov/23	23/nov/23	01/dez/23	23/nov/23	CSEL	100
Preparação do SISTOT (Importação de Candidatos e Seções)	Concluído	30/nov/23	29/nov/23	01/dez/23	29/nov/23	CSEL	100
Sistema - Alimentação de mesários: Recibos	Cancelado	20/nov/23		24/nov/23		CSEL	
Geração de Mídias	Concluído	01/dez/23	01/dez/23	01/dez/23	01/dez/23	CSEL	100
Auditoria dos Sistemas - Evento de Geração de Mídias (GEDAI, HotSwap, SIS)	Concluído	01/dez/23	01/dez/23	01/dez/23	01/dez/23	CSEL	100
Evento de Carga e Lacre das Urnas	Concluído	02/dez/23	02/dez/23	02/dez/23	02/dez/23	CSEL	100
Auditoria das Urnas - Evento de Carga e Lacre	Concluído	02/dez/23	02/dez/23	02/dez/23	02/dez/23	CSEL	100
Transmissão da Tabela de correspondência	Concluído	02/dez/23	02/dez/23	02/dez/23	02/dez/23	CSEL	100
Suporte à Montagem de Seção	Concluído	02/dez/23	02/dez/23	02/dez/23	02/dez/23	CSEL	100
Auditoria das Urna - Evento Dia da Eleição	Concluído	03/dez/23	03/dez/23	03/dez/23	03/dez/23	CSEL	100
Suporte à Urna no dia Eleição	Concluído	03/dez/23	03/dez/23	03/dez/23	03/dez/23	CSEL	100
Suporte à Transmissão, Apuração e Totalização dos Resultados	Concluído	03/dez/23	03/dez/23	03/dez/23	03/dez/23	CSEL	100
Plantão de Suporte aos Sistemas Eleitorais (CANDex, CAND, HE, SISTOT, GEDAI, TRANSP e SPCE)	Concluído	04/dez/23	04/dez/23	06/dez/23	06/dez/23	CSEL	100

ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software

Descrição						
Possui o intuito de estabelecer padrões de segurança no desenvolvimento de software.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%

Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CESCO	80
--------------	-----------	-----------	-----------	--	-------	----

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Em andamento
Observações	
Re-agendada reunião para apreciação da minuta do normativo para o dia 13/12/2024.	

ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas

Descrição						
SEI 1975-9						
Possui o objetivo de proteger, controlar, gerenciar, auditar e monitorar contas privilegiadas a ativos críticos do TRE-GO. São considerados ativos críticos: Equipamentos servidores físicos e virtuais que hospedam todos os sistemas eleitorais, administrativos e judiciais; Servidores de Banco de Dados; Servidores de Arquivos Corporativos; Servidores de Correio Eletrônico; Equipamentos Firewalls, Balance adores de Carga, Switches de Rede, Proxy, Contas de Serviços, dentre outros.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Aquisição	Concluído
Instalação e configuração	Concluído
Transferência de conhecimento	Concluído
Disponibilizar em produção - ambiente Microsoft.	Concluído
Disponibilizar em produção - ambiente Linux.	Em andamento
Observações	
O cofre de senhas já está pronto pra uso no ambiente Windows. No ambiente Linux ainda faltam configurações. Todo o ambiente foi atualizado.	

ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)

Descrição						
SEI 6237-9						
Ferramenta que possui a finalidade de prover uma autenticação mais segura dos usuários de sistemas informatizados, por meio da confirmação da identidade do usuário, em dois ou mais momentos, antes de liberar o seu acesso a um determinado sistema.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Aquisição	Concluído
Instalação e configuração	Concluído
Transferência de conhecimento	Concluído
Máquinas dos postos avançados - Prefeitura/TJ - uso da VPN.	Concluído
Máquinas da JE - Home Office - uso de VPN.	Concluído
Disponibilizar em produção - Portal internet.	Concluído
Disponibilizar em produção - E-mail.	Concluído
Migrar os usuários de e-mail para o CISCO-DUO	Em andamento
Observações	
Em fase de migração dos usuários em teletrabalho do portal vpn para o CISCO-DUO.	

ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF

Descrição						
SEI 5197-0 A motivação da aquisição de uma solução de WAF, se dá com base nas seguintes necessidades: No quesito segurança, pelo oferecimento de uma camada adicional de defesa, protegendo os servidores que hospedam aplicações Web, e executando funções de segurança de proteção dos servidores internos contra ataques por usuários da internet; No quesito performance, pela melhoria de acesso às aplicações dos sistemas administrativos e judiciais, através do balanceamento de carga; Ampliar o controle de perímetro, por meio da inspeção e análise contínua de tráfego das aplicações; Aprimorar os mecanismos de monitoramento e detecção de ataques; Proporcionar a prevenção e mitigação de Ameaças Cibernéticas; Contribuir para a redução da superfície de ataques cibernéticos da justiça eleitoral.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Aquisição	Concluído
Transferência de conhecimento	Concluído
Instalação e configuração	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Em andamento
Configuração do portal de aplicações.	Não iniciado
Disponibilizar em produção - Sistema SEI 3.5/4.0	Não iniciado
Observações	
Estão sendo testados os acessos através do WAF dos sistemas SEI4, SIGEF e Portal do servidor. SEI4 está com Alexandre/Yoshi e os demais com Braiton/Chainer/Mamede/Yoshi.	

ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação

Descrição						
Possui a finalidade de estabelecer as diretrizes para o controle de acesso e uso aceitável dos recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal, bem como os direitos e as responsabilidades dos usuários desses recursos.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		CINF, STI	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Norma finalizada	Concluído
Revisão do normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE	Em andamento

ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos

Descrição						
O uso de recursos criptográficos visa proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos pelas redes de computadores, assim como dos dados em repouso, armazenados em servidores, microcomputadores, dispositivos móveis e bancos de dados.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	29/mar/24		CESCO, CINF	60

Atividades	Situação
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Linux.	Concluído
Implantação de criptografia do Portal de acesso externo - escritório remoto.	Concluído
Implantação de criptografia em conexões VPN.	Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de certificação de sites e sistemas de informação	Não iniciado
Implantação de criptografia em notebooks standalone - Bitlocker.	Não iniciado

Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores de aplicação e de Bancos de dados.	Em andamento
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS - Bitlocker.	Em andamento
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS - Bitlocker.	Em andamento
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.	Em andamento
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores	Em andamento
Observações	
O término previsto foi adiado para 29/03/2024.	

PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC

Descrição						
Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estabelecido no Guia						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/23		STI	80

Atividades	Situação
Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, alinhado ao número de usuários internos e externos de recursos de TIC conforme referencial mínimo estabelecido no Guia	Concluído
Propor a adequação dos recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos da atividade anterior	Em andamento
Observações	
Está sendo elaborada a proposta de adequação dos recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos para encaminhamento à Alta Administração.	

PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC

Descrição						
Definir processos de continuidade de serviços de TI, em caso de eventos de causas naturais, acidentais, tecnológicas ou humanas.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	29/mar/24		AGSTI	50

Atividades	Situação
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Estabelecer Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papéis e responsabilidades	Em andamento
Estabelecer o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC	Em andamento
Transferência de conhecimento	Não iniciado
Testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC	Não iniciado
Observações	
Data de término previsto alterado para 29/03/2024	

PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC

Descrição						
Os projetos de Tecnologia da Informação, deverão passar por análise de riscos de segurança da informação antes de sua implementação.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	29/mar/24		AGSTI	50

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Em andamento
Elaborar, revisar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado com o plano institucional de gestão de riscos	Em andamento
Transferência de conhecimento	Não iniciado
Implantação	Não iniciado
Observações	

Data de término previsto alterado para 29/03/2024

PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.

Descrição						
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	29/mar/24		CESCO, CINF	20

Atividades	Situação
Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	Em andamento
Observações	
Será agendada reunião entre as equipes da CESCO e CINF para alinhar o conhecimento. A data de término previsto foi alterada para 29/03/2024	

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

Descrição						
SEI nº: Objetivo da demanda: Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados. Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta): A falta catalogação dos ativos de TI, tanto <i>hardware</i> quanto <i>software</i> , dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataques cibernéticos de qualquer natureza. Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)? Gestão de TI e apoio à Governança Desenvolvimento e administração de soluções de TIC Gestão de infraestrutura de TIC Suporte técnico das soluções de TIC Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução): 1. Visibilidade de todo o parque de <i>hardware</i> do Tribunal. 2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional. 3. Visibilidade de todos os <i>softwares</i> em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades. Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada): Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados. Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026 Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico): Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante? Não Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda: Custo (Informe a estimativa de custo do projeto): Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em <i>Software</i> Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	29/mar/24		AGSTI	70

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Aquisição da solução	Concluído
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	Em andamento
Instalação e configuração da solução	Em andamento
Transferência de conhecimento	Não iniciado
Implantação	Não iniciado
Estabelecer rotina de, regularmente, avaliar o parque, inventariar ativos, auditar e tratar não conformidades relativas aos registros dos ativos no CMDB, abrangendo hardwares, softwares, links etc.	Não iniciado
Observações	
Data de término previsto alterado para 29/03/2024 Em fase de configuração do OCS para identificação de impressoras e ativos de rede.	

PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente

Descrição						
Res370, Art. 18, §1 - O Órgão implantou processos de gestão baseados em modelos e boas práticas de mercado, e definiu parâmetros de pesquisa com o objetivo de uniformizar e gerar indicadores mais precisos e equiparados entre os órgãos do Poder Judiciário.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	29/mar/24		AGSTI	10

Atividades	Situação
Análise dos modelos de governança de serviços de TIC existentes	Concluído
Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções	Concluído
Implementar/Avaliar processos de gerenciamento de serviços que impactem a satisfação dos usuários	Em andamento
Implementar as soluções priorizadas	Adiado

Observações
Data de término previsto alterado para 29/03/2024 Analisar na AGSTI as evidências solicitados pelo CNJ no SCMN.



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 12/12/2023, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO LIMA MANOEL DA COSTA, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 13/12/2023, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 14/12/2023, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **AUGUSTO CÉSAR DE CASTRO OVELAR, COORDENADOR(A)**, em 19/12/2023, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 15/01/2024, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0687485** e o código CRC **028F0FAD**.
