



ATA

Reunião CTGTI - 07/2024

1. Identificação

Data: 4 de abr. de 2024	Início: 15:26 Término: 16:17 Reinício: 16:28 Término: 17:01	Local: Sala de
Finalidade: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados.


5. Participantes

Nome	Unidade	
Frank Wendell Ribeiro	STI	frank.rit
Marcilio Zaccarelli Bersaneti	CINF	marcilio.be
Paulo Sérgio Taira	AGSTI	roberto.
Brayton Marques Santana	CESCO	brayton.se
Dory Gonzaga Rodrigues	CSEL	dory.gon


6. Anotações

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas;
- Incluir o número do SEI do projeto PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI e lançar as datas de início e término previsto;
- O projeto PDI-22-R1-N-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS) foi priorizado pelo CGTIC na reunião ocorrida no dia 26/03/2024 e teve a situação alterada de "Em fila" para "Em andamento".

7. Portfólio de projetos

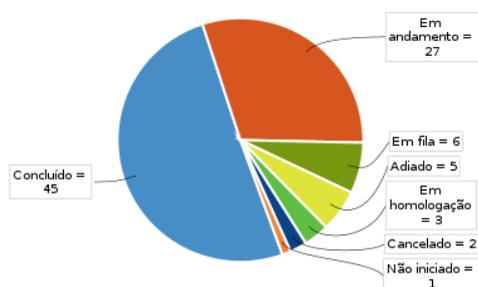

Total: 89 . Gráfico por: Status



Total: 89 . Gráfico por: Unidade responsável

7.1. Programa: Suporte às Eleições 2024 (ELE) - Projetos em Andamento/Homologação

Resumo	Situação	Execução%	
ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas	Em andamento	90	
ELE24-22-R1-03 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas	Em andamento	80	
ELE24-22-R1-04 - 13º Simulado Nacional de Hardware (13SNH)	Em andamento		

7.2. Programa: Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos em Andamento/Homologação

Resumo	Situação
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação
PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO	Em andamento
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em homologação
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento
PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede cabeada e sem fio	Em andamento
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento
PDI-22-R1-N-54 - Ampliação dos locais de atendimento com o Sistema de Gestão de Atendimento (SGA) em 41 zonas do interior	Em andamento
PDI-22-R1-N-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS)	Em andamento
PDI-22-R1-N-57 - Eleição Suplementar de Turvelândia	Em andamento
PDI-22-R1-N-58 - Aquisições e contratações STI 2024	Em andamento
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de petição no sistema SEI	Em andamento
PDI-22-R1-N-61 - Eleição do conselho tutelar de Nova Iguaçu de Goiás	Em andamento

7.3. Programa: Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Em andamento	80
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Em andamento	90
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Em andamento	50

7.4. Programa: Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Em andamento	50
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Em andamento	50

PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Em andamento	10
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	30
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Em andamento	10
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Em andamento	10
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Em andamento	50
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	70

7.5. Projetos adiados, não iniciados e suspensos

Resumo	Situação	Execução%
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Adiado	40
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Adiado	10
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Não iniciado	

7.6. Projetos/macro atividades com término previsto em até 60 dias

Resumo	Situação	Execução%
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Adiado	10
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Não iniciado	
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação	90
ELE24-22-R1-03 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas	Em andamento	80
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Em andamento	50
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Em andamento	10
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Em andamento	10
PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Em andamento	10
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Adiado	40
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40
PDI-22-R1-N-61 - Eleição do conselho tutelar de Nova Iguaçu de Goiás	Em andamento	
ELE24-22-R1-04 - 13º Simulado Nacional de Hardware (13SNH)	Em andamento	
PDI-22-R1-N-54 - Ampliação dos locais de atendimento com o Sistema de Gestão de Atendimento (SGA) em 41 zonas do interior	Em andamento	90
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em homologação	80
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI	Em andamento	
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Em andamento	80
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Em andamento	90
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90
PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO	Em andamento	90
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Em andamento	50
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Em andamento	50
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	70
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	30
PDI-22-R1-N-57 - Eleição Suplementar de Turvelândia	Em andamento	

7.7. Projetos concluídos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
--------	----------	-----------	---------------------

ELE24-22-R1-02 - 12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH)	Concluído	100	CSEL
ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Concluído	100	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-08 - Solução de Antivirus	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização	Concluído	100	AGSTI
ENS-22-R1-13 - Solução de Segurança do AD	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF	Concluído	100	CINF
PDI-21-R1-16 - INF06 - JUS - Eleições 2022 e Atualização da Plataforma Microsoft	Concluído	100	CINF
PDI-21-R1-18 - SIS21 - Auditse	Concluído	100	CESCO
PDI-21-R1-19 - SIS20 - Adaptação do Sistema - SGRH	Concluído	100	CESCO
PDI-21-R1-20 - SIS11 - Finalização do Sistema GESCOMP (Gestão por Competências)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-01 - Suporte às Eleições 2022	Concluído	100	AGSTI, CESCO, CINF, CSEL
PDI-22-R1-02 - Implantação do RDC ARQ	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-03 - Atualização do Sistema de Diárias	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-04 - Atualização do Sistema de Gestão de Serviços Extraordinários (GSE)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-06 - Implantar o Sistema de Gerenciamento de Propaganda Partidária Gratuita (SisAntena)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-12 - Implantação de ferramenta automatizada de comunicação externa e prestação de serviços aos clientes cidadãos da Justiça Eleitoral em Goiás.	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-17 - eSocial - 4ª fase	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015	Concluído	100	CINF, CSEL
PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (Acordo de colaboração TJ)	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-30 - Manutenção evolutiva do Sistema de Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (SIAPEXo)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-34 - Reparelhamento dos serviços de impressão	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (ELECONS)	Concluído	100	CESCO, CSEL
PDI-22-R1-N-38 - Adequação da rede para o serviço VOIP	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-N-40 - Eleição da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás - CIPA	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-41 - Eleição Suplementar de Iaciara	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-42 - Eleição Suplementar de Cachoeira Alta	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-45 - Eleição Suplementar de São Simão	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-46 - Eleição do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-47 - Eleitor do Futuro - Colégio Espaço Pedagógico Educacional - Grêmios Estudantil	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-48 - Eleição da Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás - COOTEGO	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-49 - Eleitor do Futuro - Nova Veneza	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-51 - Eleitor do Futuro: Goiânia	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-52 - Eleição Suplementar de Bom Jardim de Goiás	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-53 - Eleição do Conselho de Administração e Fiscal da Unimed Goiânia	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-56 - Eleitor do Futuro: Escola Canadense	Concluído	100	CSEL
PTE-22-R1-02 - Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral	Concluído	100	CESCO
PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC	Concluído	100	STI

PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26	Concluído	100	AGSTI
PTE-22-R1-22 - Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente	Concluído	100	CESCO
PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente	Concluído	100	AGSTI

8. Detalhamento dos projetos

ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas

Descrição					
A manutenção preventiva envolve a verificação regular de hardware e software das urnas eletrônicas para identificar e corrigir falhas durante uma eleição. Isso ajuda a garantir que as eleições ocorram sem interrupções significativas.					
r=eyJrIjoiYTcxYWM3ZTA0NWJlYy00NjkwLWlyM2MtODgyMDM4MGU2MGI5liwidCI6IjI2ZjA4NzlyLTJfjOWUtNGVkdzS1iN2VklThMmI3					
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade
Em andamento	13/fev/23	02/mar/23	30/ago/24		

Atividades	Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date
Realização do 1º Run In 2023	Cancelado	13/fev/23			28/abr/23
Realização do 2º Run In 2023	Concluído	01/mar/23	03/mar/23		31/ago/23
Realização do 3º Run In 2023	Concluído	01/set/23	01/set/23		19/dez/23
Realização do 1º Run In 2024	Em andamento	08/jan/24	18/jan/24		30/abr/24
Realização do 2º Run In 2024	Não iniciado	01/mar/24			30/ago/24
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 1º Lote (Qtde: 1.000)	Concluído	26/set/23	26/set/23		29/set/23
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 2º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	07/nov/23	07/nov/23		07/nov/23
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 3º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	20/nov/23	17/nov/23		20/nov/23
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 4º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	28/nov/23	01/dez/23		30/nov/23
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 5º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	04/dez/23	05/dez/23		06/dez/23
Certificação das Urnas 2022 - Todos os Lotes (Qtde: 5.800)	Concluído	11/dez/23	05/dez/23		19/dez/23
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 6º Lote (Qtde: 276)	Concluído	11/dez/23	23/fev/24		19/dez/23
Certificação das Urnas 2022 - Último Lote (Qtde: 276)	Concluído	18/dez/23	29/fev/24		19/dez/23

ELE24-22-R1-03 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas

Descrição					
SEI n. 23.0.000006767-9					
As urnas eletrônicas requerem manutenção regular e armazenamento adequado para garantir que funcionem corretamente central maior e com equipamentos mais modernos facilita o processo de manutenção, armazenamento e garantia de que toda					
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade
Em andamento	01/mar/23	01/mar/23	23/fev/24	22/fev/24	

Atividades
Reuniões com a CEIN - Definição dos Requisitos
Elaboração do Projeto pela CEIN
Reunião entre a CEIN, CSEL e SEVIN
Adaptação do Projeto
Apresentação do Projeto - STI, CSEL e CEIN
Elaboração do ETP, TR, Selo Verde etc pela CEIN
Licitação
Contratação do Serviço
Execução da Reforma (Ordem de Serviço)
Montagem e Conclusão do Projeto
Observações
A montagem dos porta pallets iniciou no dia 03/04.

ELE24-22-R1-04 - 13º Simulado Nacional de Hardware (13SNH)

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade
Em andamento	25/mar/24	25/mar/24	18/abr/24		

Atividades

Preparação da Base de Eleitores - MSSB - CADASTRO
Preparação e instalação de 2 (dois) computadores com os sistemas a serem (versão Xavante)
Geração de mídia de STE para preparação das urnas eletrônicas
Montar / Run In / Carga - 144 urnas
Votação - 144 urnas
Votação - 240 urnas
Montar / Run In / Carga - 243 urnas
Votação - 243 urnas
Montar / Run In / Carga / Votação - 45 urnas
Transmissão dos BU - 672 urnas
Totalização dos 672 BU's
Montar / Run In / - 240 urnas

PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições**Descrição**

SEI 21.0.000003441-7

Desenvolvimento (Finalização) de Sistema de Substituição de Servidores, que envolve o processo indicação e designação de servidores para de Funções de Confiança (FC) e Cargos Comissionados (CJ), por prazo determinado ou indeterminado.

Visa automatizar o processo de indicação e deferimento de substituições de cargos de direção, chefia e assessoramento no Tribunal

Meta: Automação do processo de indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança e Cargos Comissionados at

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade
Em homologação	27/abr/22	27/abr/22	31/jan/24		

Atividades

Planejamento
Criação e configuração do ambiente de testes
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica
Realização de testes pela unidade demandante
Homologação do produto
Disponibilização em ambiente de produção

observações

Os ajustes solicitados pela SGP foram concluídos. Os testes visando a homologação do sistema foram retomados.

PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE**Descrição**

SEI: 24.0.000003403-3

Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online do funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade
Em homologação	07/jan/21	07/jan/21	29/mar/24		

Atividades

Planejamento
Criação e configuração do ambiente de testes
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica
Realização de testes pela unidade demandante
Homologação do produto
Disponibilização em ambiente de produção

Observações

Os ajustes solicitados pela SGP foram concluídos. Os testes visando a homologação do sistema foram retomados.

PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade
Em andamento	04/mar/24	04/mar/24	30/abr/24		

Atividades					
Planejamento					
Criação de serviços da SAO					
Configuração do fluxo de atendimento					
Homologação do ambiente					
Disponibilização em ambiente de produção					

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)

Descrição
Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo Anual de Contratações do Tribunal. Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade
Em homologação	29/abr/22	29/abr/22	26/abr/24		

Atividades					
Planejamento					
Análise de requisitos					
Desenvolvimento funcionalidades					
Testes de funcionalidades					
Disponibilização em ambiente de produção					

observações
Em fase de elaboração do termo de homologação para envio à unidade demandante; O término previsto foi alterado para 26/04/2024.

PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória

Descrição
SEI 2275-6 Finalidade: desenvolvimento de uma solução informatizada para o controle de informações judiciais relacionadas a medidas que envolvem fianças e penas pecuniárias. Ao final, haverá a conversão do controle dos registros manuais em livros de guarda obrigatória pelos cartórios.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade
Em andamento	30/ago/23	30/ago/23	28/jun/24		CESE

Atividades					
Levantamento de requisitos					
Desenvolvimento da etapa I do sistema					
Disponibilização do módulo I do sistema em ambiente de produção					

Observações
O término previsto foi alterado para 28/06/2024

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Descrição
http://wp.tre-go.jus.br/

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade
Em andamento		07/nov/22	19/dez/24		

Atividades					
Planejamento					
Criação e configuração do ambiente de testes					
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica					
Realização de testes pela equipe de desenvolvimento					
Homologação do produto					
Disponibilização em ambiente de produção					

Observações
A data de término prevista foi alterada para 19/12/2024; A demanda necessita de uma comissão multidisciplinar com representantes das áreas de negócio para gerir o projeto.

PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede cabeada e sem fio

Descrição					
SEI nº 23.0.000003147-0					
Aquisição de Solução de rede cabeada (LAN) e sem fio (Wi-fi) com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melh monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral.Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equ					
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidad
Em andamento	28/fev/23	28/fev/23	19/dez/24		
Atividades					
Elaboração do DOD.					
Elaboração do ETP.					
Elaboração do TR.					
Adequação das especificações e coleta de preços estimativos.					
Processo de licitação.					
Execução da ARP.					
Implementação da solução.					
Observações					
Incluir previsão de recursos para o orçamento de 2025.					

PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle

Descrição					
SEI nº** 24.0.000003648-6 (para capacitação nas ferramentas de segurança da Oracle)					
A implantação de ferramentas de segurança e proteção em um SGDB Oracle é fundamental para proteger os dados críticos de uma organização. Tem como objetivo principal garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados armazenados no banco de dados.					
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidad
Em andamento		01/jun/23	31/jul/24		
Atividades					
Instalação/ativação da feature					
Implementação das primeiras funcionalidades					
Testes em ambiente real					
Aplicação em ambiente virtual					
Estudos sobre as funcionalidades					

PDI-22-R1-N-54 - Implantação do sistema Sistema de Gestão de Atendimento (SGA) em 41 zonas do interior

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade resp
Em andamento	01/dez/23	01/dez/23	19/abr/24		CINF
Atividades					
Aquisição de impressoras					
Planejamento de distribuição dos equipamentos					
Trindade - piloto da implantação.					
Etapa 1 da implantação.					
Etapa 2 da implantação					
Observações					
Aragarças informou que não quer o SGA. Total de locais: 38. (100%)Executado até 05/04/2024: 65%. Faltam 14 municípios.Executado até 12/04/2024: 92%. Faltam 03 municípios.					

PDI-22-R1-N-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS)

Descrição					
SEI nº 24.0.000000742-7					
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidad
Em andamento	01/abr/24	01/abr/24	31/jul/24		
Atividades			Situação		
Planejamento			Não iniciado		
Levantamento de requisitos			Não iniciado		

Criação e configuração do ambiente de testes	Não iniciado
Realização de testes pela equipe técnica	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

PDI-22-R1-N-57 - Eleição Suplementar de Turvelândia

Descrição
SEI: 23.0.000010456-6Data da eleição: 28/04/2024.

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade re
Em andamento	08/mar/24	08/mar/24	03/mai/24		CSEL

Atividades
Planejamento - Logística de Suporte à Eleição
Ofício DG - enviar para o TSE - Confirmação da Eleição Suplementar
Configuração da Eleição - CFE
Solicitação Publicação do Processo e Sistemas Eleitorais
Solicitação das Senhas Oficiais
Plantão de Suporte aos Sistemas Eleitorais
Liberação de Acesso aos Sistemas
Suporte à Entrega do Registro de Candidaturas
Suporte à Agregações de Seção
Suporte ao Sorteio do Horário Eleitoral
Solicitação da Impressão dos Cadernos de Votação
Suporte à Convocação de Mesários
Suporte à TTE (Ex: Mesário)
Sistema - Alimentação de mesários: Recibos
Preparação das Urnas Eletrônicas
Suporte ao Fechamento do Registro de Candidaturas
Auditoria dos Sistemas - Evento de Geração de Mídias (GEDAI, HotSwap, SIS)
Geração de Mídias
Evento de Carga e Lacre das Urnas
Auditoria das Urnas - Evento de Carga e Lacre
Suporte à Montagem de Seção
Auditoria das Urna - Evento Dia da Eleição
Suporte à Urna no dia Eleição
Suporte à Transmissão, Apuração e Totalização dos Resultados
Suporte à Prestação de Contas
Diplomação dos Candidatos
Fechamento do Cand

PDI-22-R1-N-58 - Aquisições e contratações STI 2024

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	22/mar/24	22/mar/24			CINF	

Atividades	Situação
Licenciamento de softwares	Não iniciado
Aquisição de solução de Firewall.	Não iniciado
Solução para o Data Center	Em andamento
Upgrade da solução de backup	Em andamento
Equipamentos de microinformática	Em andamento
Contratação de serviços de suporte de TI	Em andamento
Solução de wifi	Em andamento
Aquisição de notebooks	Em andamento

PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI

Descrição

SEI: 23.0.000016671-5

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	16/fev/24	16/fev/24	30/abr/24		CESCO	

Atividades	Situação
Planejamento	Não iniciado
Levantamento de requisitos	Não iniciado
Criação e configuração do ambiente de testes	Não iniciado
Realização de testes pela equipe técnica	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

PDI-22-R1-N-61 - Eleição do conselho tutelar de Nova Iguaçu de Goiás**Descrição**

SEI Nº 24.0.000002314-7

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade
Em andamento					

Atividades	Situação
Formalização do Pedido	Concluído
Aprovação da Eleição	Concluído
Geração da Base de Eleitores	Não iniciado
Configuração da Eleição	Não iniciado
Entrega da Base de Candidatos	Não iniciado
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Não iniciado
Geração de Mídias	Não iniciado
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Viagem do Servidor da STI para Suporte à Eleição	Não iniciado
Retirada das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Suporte às Eleições	Não iniciado
Devolução das Urnas Eletrônicas	Não iniciado

ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software**Descrição**

SEI nº: 23.0.000004358-3

Possui o intuito de estabelecer padrões de segurança no desenvolvimento de software.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	30/abr/24		CESCO	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Em andamento

Observações

A STI, com as alterações realizadas pela CESCO na minuta do normativo encaminhou o SEI para apreciação do CGSI.

ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas**Descrição**

SEI 1975-9

Possui o objetivo de proteger, controlar, gerenciar, auditar e monitorar contas privilegiadas a ativos críticos do TRE-GO. São considerados ativos críticos:
 Equipamentos servidores físicos e virtuais que hospedam todos os sistemas eleitorais, administrativos e judiciais;
 Servidores de Banco de Dados;
 Servidores de Arquivos Corporativos;
 Servidores de Correio Eletrônico;
 Equipamentos Firewalls, Balance adores de Carga, Switches de Rede, Proxy, Contas de Serviços, dentre outros.

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	30/abr/24		CINF	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Aquisição	Concluído
Instalação e configuração	Concluído
Transferência de conhecimento	Concluído
Disponibilizar em produção - ambiente Microsoft.	Concluído
Disponibilizar em produção - ambiente Linux.	Em andamento

observações

O término previsto foi alterado para 30/04/2024.

ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)**Descrição****SEI 22.0.00006237-9**

Ferramenta que possui a finalidade de prover uma autenticação mais segura dos usuários de sistemas informatizados, por meio da confirmação da identidade do usuário, em dois ou mais momentos, antes de liberar o seu acesso a um determinado sistema.

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/22	01/jan/22	30/abr/24		CINF	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Aquisição	Concluído
Instalação e configuração	Concluído
Transferência de conhecimento	Concluído
Máquinas dos postos avançados - Prefeitura/TJ - uso da VPN.	Concluído
Máquinas da JE - Home Office - uso de VPN.	Concluído
Disponibilizar em produção - Portal internet.	Concluído
Disponibilizar em produção - E-mail.	Concluído
Migrar os usuários de e-mail para o CISCO-DUO	Em andamento

observações

Foram migrados até o momento, 650 usuários de e-mail para o CISCO-DUO de um total de 1.159.

ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação**Descrição**

Portaria Nº78/2022 (normativo que está vigente)

Possui a finalidade de estabelecer as diretrizes para o controle de acesso e uso aceitável dos recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal, bem como os direitos e as responsabilidades dos usuários desses recursos.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	30/abr/24		CINF, STI	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído

Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Norma finalizada	Concluído
Revisão do normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE	Em andamento

Observações
O término previsto foi alterado para 30/04/2024.

ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos

Descrição
O uso de recursos criptográficos visa proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos pelas redes de computadores, assim como dos dados em repouso, armazenados em servidores, microcomputadores, dispositivos móveis e bancos de dados.

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/24		CESCO, CINF	50

Atividades	Situação
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Linux.	Concluído
Implantação de criptografia do Portal de acesso externo - escritório remoto.	Concluído
Implantação de criptografia em conexões VPN.	Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.	Concluído
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de certificação de sites e sistemas de informação	Não iniciado
Implantação de criptografia em notebooks standalone - Bitlocker.	Não iniciado
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores de aplicação e de Bancos de dados.	Em andamento
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS - Bitlocker.	Em andamento
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS - Bitlocker.	Em andamento
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores	Em andamento

Observações
A SEPRO/Aline implementou o recurso de backup criptografado e iniciou os testes de performance.

PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC

Descrição
Definir processos de continuidade de serviços de TI, em caso de eventos de causas naturais, acidentais, tecnológicas ou humanas.

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	30/abr/24		AGSTI	50

Atividades	Situação
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído

Estabelecer Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papéis e responsabilidades	Em andamento
Estabelecer o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC	Em andamento
Transferência de conhecimento	Não iniciado
Testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC	Não iniciado

Observações
Os impedimentos foram resolvidos e o projeto foi retomado.

PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC

Descrição
Os projetos de Tecnologia da Informação, deverão passar por análise de riscos de segurança da informação antes de sua implementação.

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	30/abr/24		AGSTI	50

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Em andamento
Elaborar, revisar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado com o plano institucional de gestão de riscos	Em andamento
Transferência de conhecimento	Não iniciado
Implantação	Não iniciado

Observações
Os impedimentos foram resolvidos e o projeto foi retomado.

PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento		09/ago/22	29/mar/24		CESCO	10

Atividades	Situação
Análise dos requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Em andamento
Elaborar / Revisar processo de aquisição/desenvolvimento de software, conforme a ENTIC-JUD.	Em andamento

PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.

Descrição
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO, CINF	30

Atividades	Situação
Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	Em andamento

Observações

A reunião para alinhamento de conhecimento entre CESCO e CINF foi realizada no dia 19/03/2024. Será iniciado o projeto com a definição da arquitetura da autenticação única.

PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020

Descrição

<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496>

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	29/mar/24		CESCO	10

Atividades	Situação
Participar de curso oferecido pelo CNJ	Concluído
Adequar os padrões de desenvolvimento e a arquitetura de sistemas do Tribunal aos padrões estabelecidos na Res. 335/2020 (PDPJ), justificando a adoção de arquiteturas alternativas, se for o caso	Em andamento

PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	29/mar/24		CESCO	10

Atividades	Situação
Definir modelos de contrato de aquisição e de desenvolvimento de software em que constem cláusula que determine o depósito da documentação dos sistemas, além dos requisitos de direitos autorais etc	Adiado

Observações

Será elaborado um normativo que oriente a inclusão da cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas.

PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33

Descrição

ENTIC-JUD: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706>

Art. 33. Os sistemas de informação deverão atender a padrões de interoperabilidade e outros que venham a ser recomendados pela Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.

Parágrafo único. Os novos sistemas de informação deverão atender aos seguintes requisitos:

I - ser portáteis e interoperáveis;

II - ser disponíveis para dispositivos móveis e responsivos;

III - possuir documentação atualizada;

IV - oferecer suporte para assinatura baseado em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Lei das Infraestruturas de Serviços de Registro Público Brasileira (ICP Brasil);

V - atender ao Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), do Governo Federal.

VI - recomenda-se o uso de sistemas de informação já desenvolvidos, disseminados e experimentados no âmbito do Poder Judiciário;

VII - recomenda-se o uso do Repositório Nacional para disseminação de boas práticas e compartilhamento de soluções col-

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	29/mar/24		CESCO	50

Atividades	Situação
Reformular ou readequar o processo de desenvolvimento de software	

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

Descrição

Objetivo da demanda:

Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando cone corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e

Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

A falta catalogação dos ativos de TI, tanto *hardware* quanto *software*, dificulta o dimensionamento das ações de atualizaçã ambiente vulnerável a eventuais ataque cibernéticos de qualquer natureza.

Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Gestão de TI e apoio à Governança
Desenvolvimento e administração de soluções de TIC
Gestão de infraestrutura de TIC
Suporte técnico das soluções de TIC

Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

1. Visibilidade de todo o parque de *hardware* do Tribunal.
2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional.
3. Visibilidade de todos os *softwares* em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuaç vulnerabilidades.

Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento I 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados
Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados.
Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026

Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entr histórico):

Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?

Não

Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:

Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):

Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em *Software* Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade re
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CIF

Atividades

Planejamento

Mapeamento do processo de trabalho

Elaboração da minuta do documento normativo

Aquisição da solução

Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)

Implementação de protocolo seguro SNMP com https no OCS.

Instalação e configuração da solução

Implantação

observações

Os problemas no uso do protocolo seguro foram resolvidos e o OCS está sendo testado e homologado.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 18/04/2024, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRAYTON MARQUES SANTANA, COORDENADOR(A)**, em 18/04/2024, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 18/04/2024, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 23/04/2024, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 29/04/2024, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0779487** e o código CRC **D11BBAF8**.
