



ATA

REUNIÃO CTGTI - 16/2024

1. Identificação

Data: 31/07/2024	Início: 15:00 Término: 17:02	Local: Sala de reunião da STI
Finalidade: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados.


5. Participantes

Nome	Cargo	Email
Augusto César de Castro Ovelar	Coordenador de Sistemas Corporativos	augusto.overlar@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	Coordenador de Sistemas Eleitorais	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Frank Wendell Ribeiro	Secretário de Tecnologia da Informação	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Marcilio Zaccarelli Bersaneti	Coordenador de Infraestrutura	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	Assessor de Planejamento, Governança e Gestão	paulo.taira@tre-go.jus.br


6. Encaminhamentos

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas;
- A AGSTI explanou acerca da migração dos projetos da gestão anterior para a nova gestão, a serem apreciadas pelo CGTIC:
 - Foi criado na ferramenta Jira o novo portfólio de projetos denominado: PDTIC 21-26 revisão 2024.
 - Os projetos com situação: Em andamento, Em homologação, Adiados, Em Fila, Suspensos e Não iniciados provenientes da gestão anterior, foram migrados para o novo portfólio.
 - O status: A priorizar, foi criado para representar as novas demandas da atual gestão.
 - Os projetos Concluídos a partir de maio de 2024 foram migrados para o novo portfólio, que totaliza até o momento 51 iniciativas.
- A CESCO revisará a minuta do normativo de gestão de log elaborada pela CINP a partir do dia 01/07/2024, após o término das férias do titular da unidade;
- Os integrantes do CTGTI farão análise da minuta do normativo referente ao projeto: ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs);
- Verificar retorno da ACIBER para CINP a respeito da renovação do Tenable ou nova ARP por parte do TSE (CIBER-JE);
- O projeto PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede sem fio teve o seu andamento retomado.
- O projeto PDI-22-R1-N-67 - Implantação do sistema Atena foi suspenso, em razão do comprometimento da equipe com o projeto: PDI-22-R1-N-62 - Implantação do Sistema SERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social.
- Projetos adiados em razão do comprometimento das unidades da STI com as atividades do período eleitoral:
 - ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs);
 - ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos;
 - ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação.
- Projetos concluídos desde a última reunião de acompanhamento de projetos ocorrida em 13/06/2024 (doc. SEI 0838079):
 - ELE24-22-R1-06 - Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2024;
 - PDI-22-R1-N-64 - Eleitor do Futuro: Escola Municipal - Godofredo Perfeito - Ipameri - GO;
 - PDI-22-R1-N-68 - Eleitor do Futuro: CEPI Maria Rosilda Rodrigues (Eleição Simulada das Personalidades Goianas);
 - ELE24-22-R1-07 - 14º Simulado Nacional de Hardware (14SNH);
 - PDI-22-R1-N-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS);
 - ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas;
 - ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas;
 - PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC;
 - PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC.
- O Coordenador de infraestrutura apresentou a ferramenta GLPI que será utilizada na gestão de ativos e de atendimentos do TRE-GO.

7. Portfólio de projetos

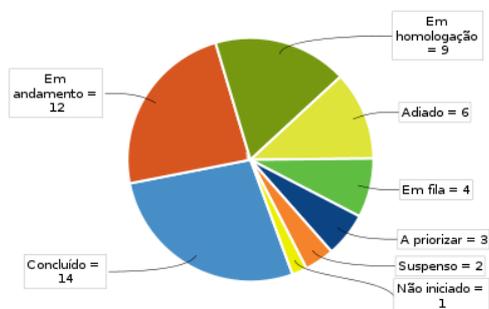

Total: 51 . Gráfico por: Status

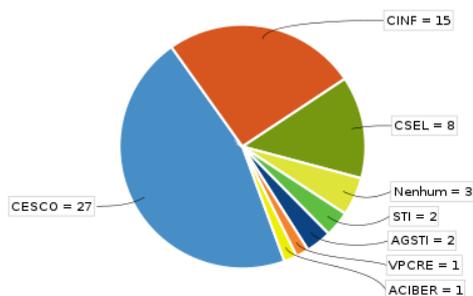

Total: 51 . Gráfico por: Unidade responsável

7.1. Programa: Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos em Andamento/Homologação

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação	90	CESCO	SGP
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO	SGP
PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto	Em andamento	10	CESCO	EJE
PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO	Em homologação	90	STI	SAO
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em homologação	80	CESCO	SAO
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	30	CESCO, VPCRE	CRE
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	50	CESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS
PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede sem fio	Em andamento	60	CINF	STI
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	30	CESCO	STI
PDI-22-R1-N-58 - Aquisições e contratações STI 2024	Em andamento	20	CINF	STI
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de petição no sistema SEI	Em andamento	80	CESCO	DG
PDI-22-R1-N-62 - Implantação do Sistema SERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social	Em andamento	10	CESCO	SJD
PDI-22-R1-N-66 - Desenvolvimento de Sistema de Diplomação	Em andamento	10	CESCO	STI

13 itens

7.2. Programa: Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Em homologação	90	CESCO	STI
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90	CINF	STI

2 itens

7.3. Programa: Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos em Andamento e Homologação

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
--------	----------	-----------	---------------------	--------------------

PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Em homologação	90	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	30	CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Em homologação	90	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Em homologação	90	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Em homologação	90	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	80	CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS

6 itens

7.4. Projetos adiados, não iniciados, a priorizar e suspensos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
PDI-24-R1-01 - Implementação da nova Legislação Compilada, com as melhorias acrescentadas pelo TSE	A priorizar			
PDI-24-R1-02 - Criar a Central de Atendimento Virtual ao Eleitor (CAVE)	A priorizar			
PDI-24-R1-03 - Plenário Virtual	A priorizar			
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40	CESCO, CINF	STI
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70	ACIBER, CESCO, CINF	STI
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40	CINF	STI
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Adiado	40	CINF	STI
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Adiado	90	CINF, STI	STI
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Adiado	80	CESCO, CINF	STI
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Suspensão	10	CESCO	SGP
PDI-22-R1-N-67 - Implantação do sistema Atena	Suspensão	70	CESCO	SJD
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Não iniciado		CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS

12 itens

7.5. Projetos em fila

Resumo	Situação	Unidade responsável	Unidade demandante
PDI-21-R1-22 - SIS07 - Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Licenças Médicas	Em fila	CESCO	SGP
PDI-22-R1-05 - Implantar Banco de Talentos (Portal TSE)	Em fila	CESCO	SGP
PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos	Em fila	CESCO	EJE
PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição	Em fila	CESCO	PRES, SGP

4 itens

7.6. Projetos/macro atividades com término previsto em até 60 dias

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante	Término previsto
PDI-22-R1-N-62 - Implantação do Sistema SERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social	Em andamento	10	CESCO	SJD	14/ago/24
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90	CINF	STI	30/ago/24
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de petição no sistema SEI	Em andamento	80	CESCO	DG	30/ago/24
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	80	CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	30/ago/24
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	30	CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	30/ago/24
PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votant/E-voto	Em andamento	10	CESCO	EJE	02/set/24

6 itens

7.7. Projetos concluídos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas	Concluído	100	CSEL	STI
ELE24-22-R1-05 - Infraestrutura para o fechamento do cadastro 2024	Concluído	100	CINF	DG
ELE24-22-R1-06 - Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2024	Concluído	100	CSEL	DG
ELE24-22-R1-07 - 14º Simulado Nacional de Hardware (14SNH)	Concluído	100	CSEL	DG
ENS-22-R1-08 - Solução de Antivirus	Concluído	100	CINF	STI
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Concluído	100	CINF	STI
PDI-22-R1-N-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS)	Concluído	100	CESCO	DG
PDI-22-R1-N-57 - Eleição Suplementar de Turvelândia	Concluído	100	CSEL	PRES
PDI-22-R1-N-63 - Eleitor do Futuro: Prefeito Estudantil - UNIALFA	Concluído	100	CSEL	DG
PDI-22-R1-N-64 - Eleitor do Futuro: Escola Municipal - Godofredo Perfeito - Ipameri - GO	Concluído	100	CSEL	DG
PDI-22-R1-N-65 - Eleitor do Futuro: 10 Escolas - Vereador Mirim	Concluído	100	CSEL	DG
PDI-22-R1-N-68 - Eleitor do Futuro: CEPI Maria Rosilda Rodrigues (Eleição Simulada das Personalidades Goianas)	Concluído	100	CSEL	DG
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Concluído	100	AGSTI	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Concluído	100	AGSTI	ÓRGÃOS EXTERNOS

14 itens

8. Detalhamento dos projetos

ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas

Descrição							
A manutenção preventiva envolve a verificação regular de hardware e software das urnas eletrônicas para identificar e corrigir problemas antes que eles causem falhas durante uma eleição. Isso ajuda a garantir que as eleições ocorram sem interrupções significativas.							
Painel de acompanhamento							
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojYTcxYWY3ZTAtNWJlYy00NjkwLWlyM2MtODgyMDM4MGMU2MGI5IiwidCI6IjZjA4NzlyLTFjOWUtNGVhZS1iN2VkLThhMmM3N2ZmM2Q5Yr=							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	13/fev/23	02/mai/23	30/ago/24	01/ago/24	CSEL	STI	100

Atividades	Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Equipe	Execução%
Realização do 1º Run In 2023	Cancelado	13/fev/23		28/abr/23		SEVIN	
Realização do 2º Run In 2023	Concluído	01/mai/23	03/mai/23	31/ago/23	29/ago/23	SEVIN	100
Realização do 3º Run In 2023	Concluído	01/set/23	01/set/23	19/dez/23	21/dez/23	SEVIN	100
Realização do 1º Run In 2024	Concluído	08/jan/24	18/jan/24	30/abr/24	30/abr/24	SEVIN	100
Realização do 2º Run In 2024	Concluído	01/mai/24	02/mai/24	01/ago/24	01/ago/24	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 1º Lote (Qtde: 1.000)	Concluído	26/set/23	26/set/23	29/set/23	29/set/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 2º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	07/nov/23	07/nov/23	07/nov/23	07/nov/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 3º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	20/nov/23	17/nov/23	20/nov/23	17/nov/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 4º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	28/nov/23	01/dez/23	30/nov/23	05/dez/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 5º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	04/dez/23	05/dez/23	06/dez/23	06/dez/23	SEVIN	100
Certificação das Urnas 2022 - Todos os Lotes (Qtde: 5.800)	Concluído	11/dez/23	05/dez/23	19/dez/23	19/fev/24	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 6º Lote (Qtde: 276)	Concluído	11/dez/23	23/fev/24	19/dez/23	26/fev/24	SEVIN	100
Certificação das Urnas 2022 - Último Lote (Qtde: 276)	Concluído	18/dez/23	29/fev/24	19/dez/23	01/mar/24	SEVIN	100

13 itens

ELE24-22-R1-06 - Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2024

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	10/jun/24	27/mar/24	14/jun/24	07/jun/24	CSEL	STI	100

ELE24-22-R1-07 - 14º Simulado Nacional de Hardware (14SNH)

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	27/jun/24	27/jun/24	16/ago/24	10/jul/24	CSEL	STI	100

PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições

Descrição							
SEI 21.0.000003441-7 Desenvolvimento (Finalização) de Sistema de Substituição de Servidores, que envolve o processo indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança (FC) e Cargos Comissionados (CJ), por prazo determinado ou indeterminado. Visa automatizar o processo de indicação e deferimento de substituições de cargos de direção, chefia e assessoramento no Tribunal Meta: Automação do processo de indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança e Cargos Comissionados até setembro/2022.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	27/abr/22	27/abr/22	31/jan/24		CESCO	SGP	90

Atividades	Situação
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Planejamento	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Homologação do produto	Em andamento
Observações	
Os ajustes solicitados pela SGP foram concluídos. Os testes visando a homologação do sistema foram retomados.	

PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE

Descrição							
SEI: 24.0.000003403-3 Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online dos servidores ao seu próprio dossiê funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/21	07/jan/21	29/mar/24		CESCO	SGP	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
Aguardando homologação do sistema pela SGP.	

PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votantet/E-voto

Descrição							
SEI nº: 24.0.000007445-0 Adoção de um sistema de votação online E-voto desenvolvido pelo TRE-SC.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/mar/24	01/mar/24	02/set/24		CESCO	EJE	10

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído

Criação e configuração do ambiente de testes	Em andamento
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
Realizaram-se várias intervenções junto ao Coordenador da STI, do TRE-SC, responsável pelo eVoto, após as intervenções foi realizada reunião entre as equipes técnicas. O TRE-SC preparou e disponibilizou os fontes e o projeto do sistema em 26/07/2024, pois a versão disponibilizada anteriormente não estava em condições de ser implantada. O término previsto foi alterado para 02/09/2024.	

PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO

Descrição							
SEI: 22.0.000012173-1							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	04/mar/24	04/mar/24	30/abr/24		STI	SAO	90
Atividades						Situação	
Planejamento						Concluído	
Criação de serviços da SAO						Concluído	
Configuração do fluxo de atendimento						Concluído	
Homologação do ambiente						Em andamento	
Disponibilização em ambiente de produção						Em andamento	
Observações							
O SEI nº 22.0.000012173-1 foi encaminhado à unidade demandante para homologação.							

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)

Descrição							
Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal. Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	29/abr/22	29/abr/22	26/abr/24		CESCO	SAO	80
Atividades						Situação	
Planejamento						Concluído	
Análise de requisitos						Concluído	
Desenvolvimento funcionalidades						Concluído	
Testes de funcionalidades						Concluído	
Disponibilização em ambiente de produção						Em andamento	
Observações							
Em fase de elaboração do termo de homologação para envio à unidade demandante; O término previsto foi alterado para 26/04/2024.							

PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória

Descrição							
SEI 2275-6 Finalidade: desenvolvimento de uma solução informatizada para o controle de informações judiciais relacionadas a medidas que envolvem gestão e destinação de valores oriundos de fianças e penas pecuniárias. Ao final, haverá a conversão do controle dos registros manuais em livros de guarda obrigatória pelos cartórios eleitorais para meio eletrônico.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	30/ago/23	30/ago/23	30/nov/24		CESCO, VPCRE	CRE	30
Atividades						Situação	
Levantamento de requisitos						Concluído	
Desenvolvimento da etapa I do sistema						Em andamento	
Disponibilização do módulo I do sistema em ambiente de produção						Não iniciado	

Observações
Em reunião do Secretário de TI com o Coordenador de Sistemas Corporativos, foi definido que o projeto será adiado no âmbito da STI em razão da priorização de outros projetos. O término previsto foi alterado para 30/11/2024.

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Descrição							
http://wp.tre-go.jus.br/							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento		07/nov/22	19/dez/24		CESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS	50

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela equipe de desenvolvimento	Em andamento
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede sem fio

Descrição							
SEI nº 23.0.000003147-0 Aquisição de Solução de rede cabeada (LAN) e sem fio (Wi-fi) com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral. Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	28/fev/23	28/fev/23	19/dez/24		CINF	STI	60

Atividades	Situação
Elaboração do DOD.	Concluído
Elaboração do ETP.	Concluído
Elaboração do TR.	Em andamento
Adequação das especificações e coleta de preços estimativos.	Em andamento
Processo de licitação.	Não iniciado
Execução da ARP.	Não iniciado
Implementação da solução.	Não iniciado

PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle

Descrição							
SEI nº* 24.0.000003648-6 (para capacitação nas ferramentas de segurança da Oracle) A implantação de ferramentas de segurança e proteção em um SGDB Oracle é fundamental para proteger os dados críticos de uma organização. Tem como objetivo principal garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados armazenados no banco de dados.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jun/23	01/jun/23	19/dez/24		CESCO	STI	30

Atividades	Situação
Instalação/ativação da feature	Concluído
Implementação das primeiras funcionalidades	Não iniciado
Testes em ambiente real	Em andamento
Aplicação em ambiente virtual	Em andamento
Estudos sobre as funcionalidades	Em andamento

Observações
Será agendada uma reunião com a ASPLAN para definição da classificação dos dados a serem protegidos no escopo do projeto. O curso para equipe da SEAID agendado para o período de 24/06 à 05/07 foi concluído.

PDI-22-R1-N-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS)

Descrição							
SEI nº 24.0.000000742-7							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/abr/24	01/abr/24	31/jul/24	05/jul/24	CESCO	DG	100

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Levantamento de requisitos	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Realização de testes pela equipe técnica	Concluído
Homologação do produto	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Concluído

Observações

A reunião para indicação do líder do grupo de trabalho está agendada para o dia 18/06/2024. A SEPRO está preparando as máquinas virtuais.

PDI-22-R1-N-58 - Aquisições e contratações STI 2024

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	22/mar/24	22/mar/24	19/dez/24		CINF	STI	20

Atividades	Situação
Licenciamento de softwares	Em andamento
Aquisição de solução de Firewall.	Em andamento
Solução para o Data Center	Em andamento
Upgrade da solução de backup	Em andamento
Equipamentos de microinformática	Em andamento
Contratação de serviços de suporte de TI	Em andamento
Solução de wifi	Em andamento
Aquisição de notebooks	Concluído

PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI

Descrição							
SEI: 23.0.000016671-5							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	16/fev/24	16/fev/24	30/ago/24		CESCO	DG	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Levantamento de requisitos	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Realização de testes pela equipe técnica	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações

A CESCO encaminhará o SEI para a COAD para definição das classes processuais que deverão constar no módulo de peticionamento externo. O término previsto foi adiado para o dia 30/08/2024. Aguardando o encaminhamento do SEI para manifestação da COAD.

PDI-22-R1-N-62 - Implantação do Sistema SERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social

Descrição							
SEI nº: 24.0.000000946-2							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Órgão demandante	Execução%
Em andamento	10/jun/24	10/jun/24	14/ago/24		CESCO	TRE-GO	10

Atividades	Situação
Planejamento	Em andamento
Levantamento de requisitos	Não iniciado
Criação e configuração do ambiente de testes	Não iniciado
Realização de testes pela equipe técnica	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
Equipe trabalhando na adequação e instalação do sistema no ambiente do TRE-GO. A versão disponibilizada não foi preparada pelo TRE-SP para se disponibilizada para outros TREs. O término previsto foi alterado para 14/08/2024, após esse período não haverá a necessidade do sistema.	

PDI-22-R1-N-64 - Eleitor do Futuro: Escola Municipal - Godofredo Perfeito - Ipameri - GO

Descrição							
SEI nº 24.0.000007428-0							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/mai/24	01/mai/24	17/jun/24	17/jun/24	CSEL	DG	100

Atividades	Situação
Formalização do Pedido	Concluído
Aprovação da Eleição	Concluído
Entrega da Base de Candidatos e Eleitores	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído
Retirada das Urnas Eletrônicas	Concluído
Suporte às Eleições	Concluído
Devolução das Urnas Eletrônicas	Concluído

PDI-22-R1-N-66 - Desenvolvimento de Sistema de Diplomação

Descrição							
Será agendada reunião com a equipe do TSE para verificar a possibilidade de integração do diploma no DivulgaCand.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	10/mai/24	10/mai/24	14/out/24		CESCO	STI	10

Atividades	Situação
Planejamento	Em andamento
Levantamento de requisitos	Em andamento
Criação e configuração dos ambientes de desenvolvimento, teste e homologação	Não iniciado
Implementação das funcionalidades priorizadas	Não iniciado
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
TSE não planeja a disponibilização do diploma diretamente no DivulgaCand. Deverá ser desenvolvida aplicação própria deste TRE.	

PDI-22-R1-N-67 - Implantação do sistema Atena

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Suspensão	06/mai/24	06/mai/24	31/jul/24		CESCO	SJD	70

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente	Em andamento

Realização de testes pela equipe técnica	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
Suspensão, pois equipe está trabalhando no SERT.	

PDI-22-R1-N-68 - Eleitor do Futuro: CEPI Maria Rosilda Rodrigues (Eleição Simulada das Personalidades Goianas)

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	12/jun/24	12/jun/24	25/jun/24	25/jun/24	CSEL	DG	100

Atividades	Situação
Formalização do Pedido	Concluído
Aprovação da Eleição	Concluído
Entrega da Base de Candidatos e Eleitores	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído
Retirada das Urnas Eletrônicas	Concluído
Suporte às Eleições	Concluído
Devolução das Urnas Eletrônicas	Concluído

ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software

Descrição							
SEI nº: 23.0.000004358-3 Possui o intuito de estabelecer padrões de segurança no desenvolvimento de software.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	01/jul/21	01/jul/21	30/abr/24		CESCO	STI	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Aprovação do normativo pela Diretoria Geral	Em andamento
Observações	
Aguardando aprovação pela Diretoria Geral.	

ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)

Descrição							
Dispõe sobre as regras e os procedimentos para a realização da gestão e monitoramento de registro de atividades (logs) no ambiente computacional do TRE-GO.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Adiado	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/24		CINF	STI	40

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração das minutas dos documentos normativos.	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Em andamento
Aprovação da norma e do procedimento.	Não iniciado
Implantação da norma e do procedimento.	Não iniciado
Observações	
O término previsto foi alterado para 19/12/2024 e o projeto foi adiado em razão do período eleitoral.	

ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas

Descrição							
SEI 1975-9 Possui o objetivo de proteger, controlar, gerenciar, auditar e monitorar contas privilegiadas a ativos críticos do TRE-GO. São considerados ativos críticos: Equipamentos servidores físicos e virtuais que hospedam todos os sistemas eleitorais, administrativos e judiciais; Servidores de Banco de Dados; Servidores de Arquivos Corporativos; Servidores de Correio Eletrônico; Equipamentos Firewalls, Balance adores de Carga, Switches de Rede, Proxy, Contas de Serviços, dentre outros.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/jul/21	01/jul/21	28/jun/24	30/jul/24	CINF	STI	100

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Aquisição	Concluído
Instalação e configuração	Concluído
Transferência de conhecimento	Concluído
Disponibilizar em produção - ambiente Microsoft.	Concluído
Disponibilizar em produção - ambiente Linux.	Concluído

ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)

Descrição							
SEI 22.0.000006237-9 (aquisição da ferramenta) SEI 24.0.000007232-6 (determinação do CNJ) Ferramenta que possui a finalidade de prover uma autenticação mais segura dos usuários de sistemas informatizados, por meio da confirmação da identidade do usuário, em dois ou mais momentos, antes de liberar o seu acesso a um determinado sistema.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/22	01/jan/22	30/ago/24		CINF	STI	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Aquisição	Concluído
Instalação e configuração	Concluído
Transferência de conhecimento	Concluído
Máquinas dos postos avançados - Prefeitura/TJ - uso da VPN.	Concluído
Máquinas da JE - Home Office - uso de VPN.	Concluído
Disponibilizar em produção - Portal internet.	Concluído
Disponibilizar em produção - E-mail.	Concluído
Migrar os usuários de e-mail para o CISCO-DUO	Em andamento

Observações

O término previsto foi alterado para 30/08/2024, em razão da necessidade de contatar os usuários que não migraram de aplicativo de duplo fator de autenticação e não se manifestaram.

ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação

Descrição							
Portaria Nº78/2022 (normativo que está vigente) Possui a finalidade de estabelecer as diretrizes para o controle de acesso e uso aceitável dos recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal, bem como os direitos e as responsabilidades dos usuários desses recursos.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Adiado	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/24		CINF, STI	STI	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Norma finalizada	Concluído
Revisão do normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE	Em andamento

Observações

O término previsto foi alterado para 19/12/2024 e o projeto foi adiado em razão do período eleitoral.

ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos

Descrição							
O uso de recursos criptográficos visa proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos pelas redes de computadores, assim como dos dados em repouso, armazenados em servidores, microcomputadores, dispositivos móveis e bancos de dados.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Adiado	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/24		CESCO, CINF	STI	80
Atividades							Situação
Implantação de criptografia em notebooks standalone - Bitlocker.							Concluído
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS - Bitlocker.							Concluído
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS - Bitlocker.							Concluído
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.							Concluído
Implantação de criptografia do Portal de acesso externo - escritório remoto.							Concluído
Implantação de criptografia em conexões VPN.							Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Linux.							Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.							Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo							Concluído
Planejamento							Concluído
Mapeamento do processo de certificação de sites e sistemas de informação							Não iniciado
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores de aplicação e de Bancos de dados.							Em andamento
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores							Em andamento
Observações							
O projeto foi adiado em razão do período eleitoral.							

PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC

Descrição							
Definir processos de continuidade de serviços de TI, em caso de eventos de causas naturais, acidentais, tecnológicas ou humanas.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/jul/21	01/jul/21	28/jun/24	18/jul/24	AGSTI	ÓRGÃOS EXTERNOS	100
Atividades							Situação
Elaboração da minuta do documento normativo							Concluído
Estabelecer Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papéis e responsabilidades							Concluído
Estabelecer o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC							Concluído
Implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC							Concluído

PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC

Descrição							
Os projetos de Tecnologia da Informação, deverão passar por análise de riscos de segurança da informação antes de sua implementação.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	01/jul/21	01/jul/21	28/jun/24	18/jul/24	AGSTI	ÓRGÃOS EXTERNOS	100
Atividades							Situação
Planejamento							Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo							Concluído
Mapeamento do processo de trabalho							Concluído
Elaborar, revisar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado com o plano institucional de gestão de riscos							Concluído

PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD

Descrição							
SEI: 24.0.000006783-7							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%

Em homologação		09/ago/22	30/abr/24		CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS	90
----------------	--	-----------	-----------	--	-------	-----------------	----

Atividades							Situação
Análise dos requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD							Concluído
Elaborar / Revisar processo de aquisição/desenvolvimento de software, conforme a ENTIC-JUD.							Em homologação
Observações							
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.							

PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.

Descrição							
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	30/ago/24		CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	30

Atividades							Situação
Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas							Em andamento
Observações							
A CESCO validará o Termo de Abertura do Projeto junto à CINF; O término previsto foi alterado para 30/08/2024.							

PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020

Descrição							
SEI: 24.0.000006783-7 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS	90

Atividades							Situação
Participar de curso oferecido pelo CNJ							Concluído
Adequar os padrões de desenvolvimento e a arquitetura de sistemas do Tribunal aos padrões estabelecidos na Res. 335/2020 (PDPJ), justificando a adoção de arquiteturas alternativas, se for o caso							Em homologação
Observações							
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.							

PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas

Descrição							
SEI: 24.0.000006783-7							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS	90

Atividades							Situação
Definir modelos de contrato de aquisição e de desenvolvimento de software em que constem cláusula que determine o depósito da documentação dos sistemas, além dos requisitos de direitos autorais etc							Em homologação
Observações							
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.							

PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33

Descrição							



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 02/08/2024, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 02/08/2024, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 05/08/2024, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 20/08/2024, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **AUGUSTO CÉSAR DE CASTRO OVELAR, COORDENADOR(A)**, em 20/08/2024, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0875505** e o código CRC **706513E0**.
