



ATA

Reunião CTGTI - 17/2024

1. Identificação

Data: 16/08/2024	Início: 14:40 Término: 16:09	Local: Sala de reunião da STI
Finalidade: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados.

5. Participantes

Nome	Cargo	Email
Augusto César de Castro Ovelar	Coordenador de Sistemas Corporativos	augusto.overlar@tre-go.jus.br
Frank Wendell Ribeiro	Secretário de Tecnologia da Informação	frank.ribeiro@tre-go.jus.br

Marcelio Zaccarelli Bersaneti	Coordenador de Infraestrutura	marcelio.bersaneti@tre-go.jus.br
Márcio Antônio Duarte Oliveira	Coordenador de Sistemas Eleitorais - substituto	marcio.duarte@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	Assessor de Planejamento, Governança e Gestão	paulo.taira@tre-go.jus.br


6. Encaminhamentos

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas;
- A respeito da renovação do Tenable.sc ou nova ARP por parte do TSE (CIBER-JE), a ACIBER do TRE-GO, ficou de verificar junto ao grupo nacional de segurança do TSE;
- O projeto PDI-22-R1-N-58 - Aquisições e contratações STI 2024 foi excluído do PDTIC 21-24 revisão 2024 por se tratar de um acompanhamento interno das contratações de responsabilidade da STI. Foi criado na ferramenta Jira, o projeto: **Acompanhamento das contratações** que será utilizado para acompanhar as contratações da STI de maneira agrupada por ano;
- O projeto ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA) foi concluído;
- As demandas apresentadas pela CESCO na reunião do dia 19/07/2024, serão inseridas nos respectivos programas do PDTIC 22-24 revisão 2024, conforme tabela abaixo:


Demanda	Programa	Observações
ENS-24-R1-01 - Implementação dos planos de ação pós-avaliação do CISControls	ENSEC	
ENS-24-R1-02 - ENS-24-R1-02 - Execução da ARP TSE nº 2/2023 - Avaliação de vulnerabilidade	ENSEC	SEI: 23.0.000017605-2
ENS-24-R1-03 - Implementação de Política de Gestão de Dados no âmbito da STI	ENSEC	
PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes	PDI	Não necessitará de priorização pelo CGTIC
PDI-24-R1-05 - Desenvolvimento de nova versão do sistema Siapexo	PDI	
PDI-24-R1-06 - Implantação do SEI Federação	PDI	SEI: 24.0.000007689-5

- **A próxima reunião foi agendada para o dia 30/08/2024.**

7. Portfólio de projetos

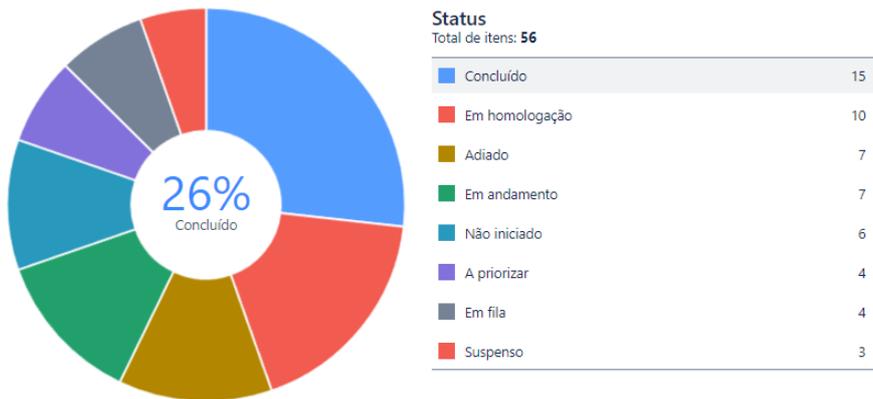

Total: 56 . Gráfico por: Status



Total: 56 . Gráfico por: Unidade responsável

7.1. Programa: Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos em Andamento/Homologação

Demanda	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
PDI-24-R1-05 - Desenvolvimento de nova versão do sistema Siapexo	Em andamento	10	CESCO	SAO
PDI-22-R1-N-66 - Desenvolvimento de Sistema de Diplomação	Em andamento	10	CESCO	STI
PDI-22-R1-N-62 - Implantação do Sistema SERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social	Em andamento	10	CESCO	SJD
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	30	CESCO	STI
PDI-22-R1-N-33 - Reparcelhamento da rede sem fio	Em andamento	60	CINF	STI
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	50	CESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS

PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto	Em andamento	10	CESCO	EJE
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI	Em homologação	80	CESCO	DG
PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO	Em homologação	90	STI	SAO
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em homologação	80	CESCO	SAO
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação	90	CESCO	SGP
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO	SGP

12 itens

7.2. Programa: Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos em Andamento/Homologação

Projeto	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Em homologação	90	CESCO	STI

1 item

7.3. Programa: Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos em Andamento/Homologação

Projeto	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	80	CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Em homologação	90	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Em homologação	90	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Em homologação	90	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Em homologação	90	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS

5 itens

7.4. Projetos adiados, não iniciados, a priorizar e suspensos

Projeto	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
PDI-24-R1-01 - Implementação da nova Legislação Compilada, com as melhorias acrescentadas pelo TSE	A priorizar		CESCO	SGI
PDI-24-R1-02 - Criar a Central de Atendimento Virtual ao Eleitor (CAVE)	A priorizar		CESCO	VPCRE
PDI-24-R1-03 - Plenário Virtual	A priorizar		CESCO	SJD
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40	CESCO, CINF	STI
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70	ACIBER, CESCO, CINF	STI
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40	CINF	STI
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Adiado	40	CINF	STI
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Adiado	90	CINF, STI	STI
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Adiado	80	CESCO, CINF	STI
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Adiado	30	CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Suspensão	10	CESCO	SGP
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Suspensão	30	CESCO	VPCRE
PDI-22-R1-N-67 - Implantação do sistema Atena	Suspensão	70	CESCO	SJD
ENS-24-R1-01 - Implementação dos planos de ação pós-avaliação do CISControls	Não iniciado		ACIBER, CESCO, CINF	STI
ENS-24-R1-02 - Execução da ARP TSE nº 2/2023 - Avaliação de vulnerabilidade	Não iniciado		ACIBER, CESCO, CINF	STI
ENS-24-R1-03 - Implementação de Política de Gestão de Dados no âmbito da STI	Não iniciado		AGSTI, CESCO, CINF, CSEL, STI	STI
PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes	Não iniciado		CESCO	STI
PDI-24-R1-06 - Implantação do SEI Federação	Não iniciado		CESCO	STI
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Não iniciado		CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS

19 itens

7.5. Projetos em fila

Projeto	Situação	Unidade responsável	Unidade demandante
PDI-21-R1-22 - SIS07 - Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Licenças Médicas	Em fila	CESCO	SGP

PDI-22-R1-05 - Implantar Banco de Talentos (Portal TSE)	Em fila	CESCO	SGP
PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos	Em fila	CESCO	EJE
PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição	Em fila	CESCO	PRES, SGP

4 itens

7.6. Projetos/macro atividades em andamento com término previsto de até 60 dias

Projeto	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante	Término previsto
PDI-22-R1-N-62 - Implantação do Sistema SERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social	Em andamento	10	CESCO	SJD	14/ago/24
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	80	CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	30/ago/24
PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votanet/E-voto	Em andamento	10	CESCO	EJE	02/set/24
PDI-22-R1-N-66 - Desenvolvimento de Sistema de Diplomação	Em andamento	10	CESCO	STI	14/out/24

4 itens

7.7. Projetos concluídos

Projeto	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas	Concluído	100	CSEL	STI
ELE24-22-R1-05 - Infraestrutura para o fechamento do cadastro 2024	Concluído	100	CINF	DG
ELE24-22-R1-06 - Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2024	Concluído	100	CSEL	DG
ELE24-22-R1-07 - 14º Simulado Nacional de Hardware (14SNH)	Concluído	100	CSEL	DG
ENS-22-R1-08 - Solução de Antivirus	Concluído	100	CINF	STI
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Concluído	100	CINF	STI
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Concluído	100	CINF	STI
PDI-22-R1-N-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS)	Concluído	100	CESCO	DG
PDI-22-R1-N-57 - Eleição Suplementar de Turvelândia	Concluído	100	CSEL	PRES

PDI-22-R1-N-63 - Eleitor do Futuro: Prefeito Estudantil - UNIALFA	Concluído	100	CSEL	DG
PDI-22-R1-N-64 - Eleitor do Futuro: Escola Municipal - Godofredo Perfeito - Ipameri - GO	Concluído	100	CSEL	DG
PDI-22-R1-N-65 - Eleitor do Futuro: 10 Escolas - Vereador Mirim	Concluído	100	CSEL	DG
PDI-22-R1-N-68 - Eleitor do Futuro: CEPI Maria Rosilda Rodrigues (Eleição Simulada das Personalidades Goianas)	Concluído	100	CSEL	DG
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Concluído	100	AGSTI	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Concluído	100	AGSTI	ÓRGÃOS EXTERNOS

15 itens

8. Detalhamento dos projetos

PDI-24-R1-05 - Desenvolvimento de nova versão do sistema Siapexo

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
A priorizar					CESCO	SAO	10

Atividade	Situação
Planejamento	Não iniciado
Levantamento de requisitos	Não iniciado
Criação e configuração dos ambientes de desenvolvimento, teste e homologação	Não iniciado
Implementação das funcionalidades priorizadas	Não iniciado
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

PDI-22-R1-N-66 - Desenvolvimento de Sistema de Diplomação

Descrição
Será agendada reunião com a equipe do TSE para verificar a possibilidade de integração do diploma no DivulgaCand.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	10/mai/24	10/mai/24	14/out/24		CESCO	STI	10

Atividade	Situação
Planejamento	Em andamento
Levantamento de requisitos	Em andamento
Criação e configuração dos ambientes de desenvolvimento, teste e homologação	Não iniciado
Implementação das funcionalidades priorizadas	Não iniciado

Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
TSE não planeja a disponibilização do diploma diretamente no DivulgaCand. Deverá ser desenvolvida aplicação própria deste TRE.

PDI-22-R1-N-62 - Implantação do Sistema SERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social

Descrição
SEI nº: 24.0.000000946-2

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Órgão demandante	Execução%
Em andamento	10/jun/24	10/jun/24	14/ago/24		CESCO	TRE-GO	10

Atividade	Situação
Planejamento	Em andamento
Levantamento de requisitos	Não iniciado
Criação e configuração do ambiente de estes	Não iniciado
Realização de testes pela equipe técnica	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
Equipe trabalhando na adequação e instalação do sistema no ambiente do TRE-GO. A versão disponibilizada não foi preparada pelo TRE-SP para se disponibilizada para outros TRES. O término previsto foi alterado para 14/08/2024, após esse período não haverá a necessidade do sistema.

PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle

Descrição
SEI nº*: 24.0.000003648-6 (para capacitação nas ferramentas de segurança da Oracle)
A implantação de ferramentas de segurança e proteção em um SGDB Oracle é fundamental para proteger os dados críticos de uma organização. Tem como objetivo principal garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados armazenados no banco de dados.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
----------	-----------------	-------------	------------------	--------------	---------------------	--------------------	-----------

Em andamento	01/jun/23	01/jun/23	19/dez/24		CESCO	STI	30
--------------	-----------	-----------	-----------	--	-------	-----	----

Atividade	Situação
Instalação/ativação da feature	Concluído
Implementação das primeiras funcionalidades	Não iniciado
Testes em ambiente real	Em andamento
Aplicação em ambiente virtual	Em andamento
Estudos sobre as funcionalidades	Em andamento

Observações
<p>Será agendada uma reunião com a ASPLAN para definição da classificação dos dados a serem protegidos no escopo do projeto.</p> <p>O curso para equipe da SEAID agendado para o período de 24/06 à 05/07 foi concluído.</p>

PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede sem fio

Descrição
<p>SEI nº 23.0.000003147-0</p> <p>Aquisição de Solução de rede cabeada (LAN) e sem fio (Wi-fi) com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral.</p> <p>Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.</p>

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	28/fev/23	28/fev/23	19/dez/24		CINF	STI	60

Atividade	Situação
Elaboração do DOD.	Concluído
Elaboração do ETP.	Concluído
Elaboração do TR.	Em andamento
Adequação das especificações e coleta de preços estimativos.	Em andamento
Processo de licitação.	Não iniciado
Execução da ARP.	Não iniciado
Implementação da solução.	Não iniciado

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Descrição
<p>http://wp.tre-go.jus.br/</p>

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
-----------------	------------------------	--------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------	------------------

Em andamento		07/nov/22	19/dez/24		CESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS	50
--------------	--	-----------	-----------	--	-------	-----------------------------------	----

Atividade	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela equipe de desenvolvimento	Em andamento
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
A demanda foi incluída pela STI no Plano de Gestão 2024-2026. As páginas estáticas foram migradas. Em fase de importação dos documentos. A demanda necessita de uma comissão multidisciplinar com representantes das áreas de negócio para gerir o projeto.

PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto

Descrição
SEI nº: 24.0.000007445-0 Adoção de um sistema de votação online E-voto desenvolvido pelo TRE-SC.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/mai/24	01/mai/24	02/set/24		CESCO	EJE	10

Atividade	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Em andamento
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
Realizaram-se várias intervenções junto ao Coordenador da STI, do TRE-SC, responsável pelo eVoto, após as intervenções foi realizada reunião entre as equipes técnicas. O TRE-SC preparou e disponibilizou os fontes e o projeto do sistema em 26/07/2024, pois a versão disponibilizada anteriormente não estava em condições de ser implantada. O término previsto foi alterado para 02/09/2024.

PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI

Descrição

SEI: 23.0.000016671-5

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	16/fev/24	16/fev/24	30/ago/24		CESCO	DG	80

Atividade	Situação
Planejamento	Concluído
Levantamento de requisitos	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Realização de testes pela equipe técnica	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações

A CESCO encaminhará o SEI para a COAD para definição das classes processuais que deverão constar no módulo de peticionamento externo.
O término previsto foi adiado para o dia 30/08/2024. Aguardando o encaminhamento do SEI para manifestação da COAD.

PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO

Descrição

SEI: 22.0.000012173-1

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	04/mar/24	04/mar/24	30/abr/24		STI	SAO	90

Atividade	Situação
Planejamento	Concluído
Criação de serviços da SAO	Concluído
Configuração do fluxo de atendimento	Concluído
Homologação do ambiente	Em andamento

Observações

O SEI nº 22.0.000012173-1 foi encaminhado à unidade demandante para homologação.

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)

Descrição

Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal.
Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	29/abr/22	29/abr/22	26/abr/24		CESCO	SAO	80

Atividade	Situação
Planejamento	Concluído
Análise de requisitos	Concluído
Desenvolvimento funcionalidades	Concluído
Testes de funcionalidades	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Em andamento

Observações
Em fase de elaboração do termo de homologação para envio à unidade demandante; O término previsto foi alterado para 26/04/2024.

PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições

Descrição
SEI 21.0.000003441-7 Desenvolvimento (Finalização) de Sistema de Substituição de Servidores, que envolve o processo indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança (FC) e Cargos Comissionados (CJ), por prazo determinado ou indeterminado. Visa automatizar o processo de indicação e deferimento de substituições de cargos de direção, chefia e assessoramento no Tribunal Meta: Automação do processo de indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança e Cargos Comissionados até setembro/2022.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	27/abr/22	27/abr/22	31/jan/24		CESCO	SGP	90

Atividade	Situação
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Planejamento	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Homologação do produto	Em andamento

Observações
Os ajustes solicitados pela SGP foram concluídos. Os testes visando a homologação do sistema foram retomados.

PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE

Descrição
SEI: 24.0.000003403-3
Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online dos servidores ao seu próprio dossiê funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/21	07/jan/21	29/mar/24		CESCO	SGP	90

Atividade	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
Aguardando homologação do sistema pela SGP.

ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software

Descrição
SEI nº: 23.0.000004358-3
Possui o intuito de estabelecer padrões de segurança no desenvolvimento de software.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	01/jul/21	01/jul/21	30/abr/24		CESCO	STI	90

Atividade	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Aprovação do normativo pela Diretoria Geral	Em andamento

Observações
Aguardando aprovação pela Diretoria Geral.

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

<p>Descrição</p> <p>Objetivo da demanda: Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.</p> <p>Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta): A falta catalogação dos ativos de TI, tanto <i>hardware</i> quanto <i>software</i>, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataque cibernéticos de qualquer natureza.</p> <p>Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)? Gestão de TI e apoio à Governança Desenvolvimento e administração de soluções de TIC Gestão de infraestrutura de TIC Suporte técnico das soluções de TIC</p> <p>Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução): 1. Visibilidade de todo o parque de <i>hardware</i> do Tribunal. 2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional. 3. Visibilidade de todos os <i>softwares</i> em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.</p> <p>Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada): Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados. Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026</p> <p>Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):</p> <p>Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante? Não</p> <p>Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:</p> <p>Custo (Informe a estimativa de custo do projeto): Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em <i>Software</i> Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.</p>
--

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	30/ago/24		CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	80

Atividade	Situação
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Aquisição da solução	Concluído
Implementação de protocolo seguro SNMP com https no OCS.	Concluído
Instalação e configuração da solução	Concluído
Implantação	Em andamento

Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	Em andamento
---	--------------

Observações
O Coordenador de infraestrutura apresentou a ferramenta de gestão de ativos GLPI a implantada, adiando o prazo previsto para 30/08/2024.

PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33

Descrição
<p>SEI: 24.0.000006783-7</p> <p>ENTIC-JUD: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706</p> <p>Art. 33. Os sistemas de informação deverão atender a padrões de interoperabilidade e outros que venham a ser recomendados pelo Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.</p> <p>Parágrafo único. Os novos sistemas de informação deverão atender aos seguintes requisitos:</p> <p>I - ser portáteis e interoperáveis;</p> <p>II - ser disponíveis para dispositivos móveis e responsivos;</p> <p>III - possuir documentação atualizada;</p> <p>IV - oferecer suporte para assinatura baseado em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil);</p> <p>V - atender ao Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), do Governo Federal.</p> <p>VI - recomenda-se o uso de sistemas de informação já desenvolvidos, disseminados e experimentados no âmbito do Poder Judiciário.</p> <p>VII - recomenda-se o uso do Repositório Nacional para disseminação de boas práticas e compartilhamento de soluções colaborativas de TIC.</p>

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS	90

Atividade	Situação
Reformular ou readequar o processo de desenvolvimento de software	Em homologação

Observações
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.

PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas

Descrição

SEI: 24.0.000006783-7

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS	90

Atividade	Situação
Definir modelos de contrato de aquisição e de desenvolvimento de software em que constem cláusula que determine o depósito da documentação dos sistemas, além dos requisitos de direitos autorais etc	Em homologação

Observações

O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.

PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020

Descrição

SEI: 24.0.000006783-7

<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496>

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS	90

Atividade	Situação
Participar de curso oferecido pelo CNJ	Concluído
Adequar os padrões de desenvolvimento e a arquitetura de sistemas do Tribunal aos padrões estabelecidos na Res. 335/2020 (PDPJ), justificando a adoção de arquiteturas alternativas, se for o caso	Em homologação

Observações

O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.

PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD

Descrição

SEI: 24.0.000006783-7

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação		09/ago/22	30/abr/24		CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS	90

Atividade	Situação
Análise dos requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Concluído
Elaborar / Revisar processo de aquisição/desenvolvimento de software, conforme a ENTIC-JUD.	Em homologação

Observações
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIO ANTÔNIO DUARTE OLIVEIRA, CHEFE DE SEÇÃO**, em 19/08/2024, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 19/08/2024, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 19/08/2024, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 20/08/2024, às 13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **AUGUSTO CÉSAR DE CASTRO OVELAR, COORDENADOR(A)**, em 20/08/2024, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0889785** e o código CRC **38175C52**.
