



## ATA

### Reunião CTGTI - 18/2024

#### 1. Identificação

<b>Data:</b> 30/08/2024	<b>Início:</b> 15:06 <b>Término:</b> 16:08	<b>Local:</b> Sala de reunião da STI
<b>Finalidade:</b> Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2024		

#### 2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

#### 3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

#### 4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados.

#### 5. Participantes

Nome	Cargo	Email
Augusto César de Castro Ovelar	Coordenador de Sistemas Corporativos	augusto.overlar@tre-go.jus.br
Frank Wendell Ribeiro	Secretário de Tecnologia da Informação	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	Coordenador de Sistemas Eleitorais	dory.gonzaga@tre-go.jus.br

Marcilio Zaccarelli Bersaneti	Coordenador de Infraestrutura	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	Assessor de Planejamento, Governança e Gestão	paulo.taira@tre-go.jus.br

## 6. Encaminhamentos

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas;
- O projeto PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes entrou em andamento em 19/08/2024;
- O projeto ENS-24-R1-02 - Execução da ARP TSE nº 2/2023 - Avaliação de vulnerabilidade entrou em andamento;
- O projeto PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem entrou em andamento;
- A próxima reunião foi agendada para o dia 12/09/2024.

## 7. Portfólio de projetos

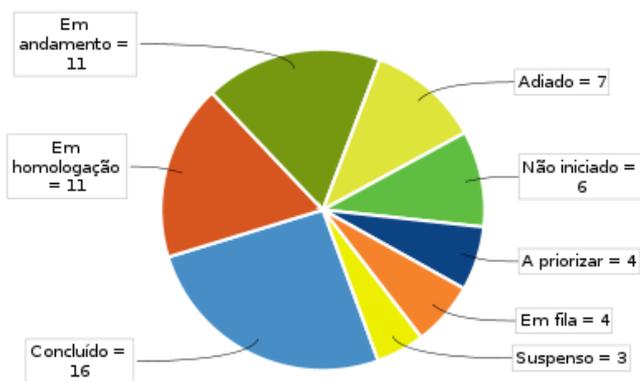


Gráfico por Status  
Total de projetos: 62

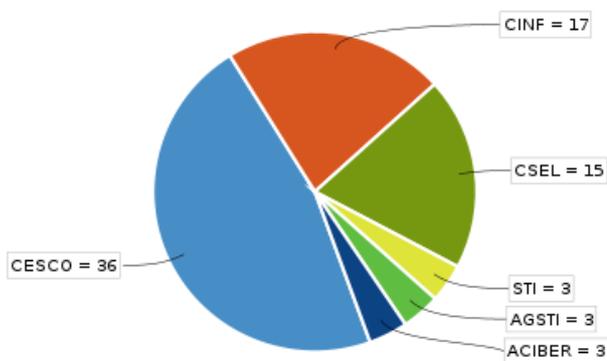


Gráfico por Unidade responsável  
Total de projetos: 62

### 7.1. Programa: Suporte às Eleições 2024 (ELE24) - Projetos Não iniciados/Em Andamento/Em Homologação

<b>Projeto</b>	<b>Situação</b>	<b>Execução%</b>	<b>Unidade responsável</b>	<b>Unidade demandante</b>
ELE24-24-R1-04 - Envio das urnas eletrônicas	Em andamento	70	CSEL	STI
ELE24-24-R1-01 - SNTOTUE2024 - Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna 2024	Em andamento	40	CSEL	STI
ELE24-24-R1-06 - Geração de Mídias	Não iniciado		CSEL	STI
ELE24-24-R1-05 - Carga e Lacre das Urnas	Não iniciado		CSEL	STI
ELE24-24-R1-03 - TDTOT2024-VI - 6º Teste de Desempenho da Totalização 2024	Não iniciado		CSEL	STI

5 itens

## **7.2. Programa: Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos Não iniciados/Em Andamento/Em Homologação**

<b>Projeto</b>	<b>Situação</b>	<b>Execução%</b>	<b>Unidade responsável</b>	<b>Unidade demandante</b>
PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes	Em andamento	10	CESCO	STI
PDI-22-R1-N-66 - Desenvolvimento de Sistema de Diplomação	Em andamento	10	CESCO	STI
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	30	CESCO	STI
PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede sem fio	Em andamento	60	CINF	STI
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	50	CESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS
PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto	Em andamento	30	CESCO	EJE
PDI-24-R1-06 - Implantação do SEI Federação	Não iniciado		CESCO	
PDI-22-R1-N-62 - Implantação do Sistema SERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social	Em homologação	80	CESCO	SJD
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI	Em homologação	80	CESCO	DG
PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO	Em homologação	90	STI	SAO
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em homologação	90	CESCO	SAO
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação	90	CESCO	SGP
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO	SGP

13 itens

## **7.3. Programa: Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos Não iniciados/Em Andamento/Em Homologação**

<b>Projeto</b>	<b>Situação</b>	<b>Execução%</b>	<b>Unidade responsável</b>	<b>Unidade demandante</b>
ENS-24-R1-02 - Execução da ARP TSE nº 2/2023 - Avaliação de vulnerabilidade	Em andamento		ACIBER, CESCO, CINF	STI
ENS-24-R1-01 - Implementação dos planos de ação pós-avaliação do CISControls	Não iniciado		ACIBER, CESCO, CINF	STI
ENS-24-R1-03 - Implementação de Política de Gestão de Dados no âmbito da STI	Não iniciado		AGSTI, CESCO, CINF, CSEL, STI	STI
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Em homologação	90	CESCO	STI

4 itens

#### **7.4. Programa: Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos Não iniciados/Em Andamento/Em Homologação**

<b>Projeto</b>	<b>Situação</b>	<b>Execução%</b>	<b>Unidade responsável</b>	<b>Unidade demandante</b>
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	80	CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Em andamento	40	CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Em homologação	90	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Em homologação	90	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Em homologação	90	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Em homologação	90	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS

6 itens

#### **7.5. Projetos adiados, a priorizar e suspensos**

<b>Projeto</b>	<b>Situação</b>	<b>Execução%</b>	<b>Unidade responsável</b>	<b>Unidade demandante</b>
PDI-24-R1-01 - Implementação da nova Legislação Compilada, com as melhorias acrescentadas pelo TSE	A priorizar		CESCO	SGI
PDI-24-R1-02 - Criar a Central de Atendimento Virtual ao Eleitor (CAVE)	A priorizar		CESCO	VPCRE
PDI-24-R1-03 - Plenário Virtual	A priorizar		CESCO	SJD
PDI-24-R1-05 - Desenvolvimento de nova versão do sistema Siapexo	A priorizar	10	CESCO	SAO

ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40	CESCO, CINF	STI
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70	ACIBER, CESCO, CINF	STI
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40	CINF	STI
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Adiado	40	CINF	STI
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Adiado	90	CINF, STI	STI
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Adiado	80	CESCO, CINF	STI
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Adiado	30	CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Suspensão	10	CESCO	SGP
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Suspensão	30	CESCO	VPCRE
PDI-22-R1-N-67 - Implantação do sistema Atena	Suspensão	70	CESCO	SJD

14 itens

## 7.6. Projetos em fila

Projeto	Situação	Unidade responsável	Unidade demandante
PDI-21-R1-22 - SIS07 - Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Licenças Médicas	Em fila	CESCO	SGP
PDI-22-R1-05 - Implantar Banco de Talentos (Portal TSE)	Em fila	CESCO	SGP
PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos	Em fila	CESCO	EJE
PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição	Em fila	CESCO	PRES, SGP

4 itens

## 7.7. Projetos/macro atividades em andamento com término previsto de até 60 dias

Projeto	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante	Término previsto
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Em andamento	40	CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	19/dez/23
ELE24-24-R1-04 - Envio das urnas eletrônicas	Em andamento	70	CSEL	STI	06/set/24
ELE24-24-R1-01 - SNTOTUE2024 - Simulado Nacional de Totalização e Ecosistema da Urna 2024	Em andamento	40	CSEL	STI	09/set/24
PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto	Em andamento	30	CESCO	EJE	20/set/24
PDI-22-R1-N-66 - Desenvolvimento de Sistema de Diplomação	Em andamento	10	CESCO	STI	14/out/24

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	80	CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	18/out/24
--	--------------	----	------	-----------------	-----------

6 itens

## 7.8. Projetos concluídos

Projeto	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas	Concluído	100	CSEL	STI
ELE24-22-R1-05 - Infraestrutura para o fechamento do cadastro 2024	Concluído	100	CINF	DG
ELE24-22-R1-06 - Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2024	Concluído	100	CSEL	DG
ELE24-22-R1-07 - 14º Simulado Nacional de Hardware (14SNH)	Concluído	100	CSEL	DG
ELE24-24-R1-02 - TDTOT2024-V - 5º Teste de Desempenho da Totalização 2024	Concluído	100	CSEL	STI
ENS-22-R1-08 - Solução de Antivirus	Concluído	100	CINF	STI
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Concluído	100	CINF	STI
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Concluído	100	CINF	STI
PDI-22-R1-N-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS)	Concluído	100	CESCO	DG
PDI-22-R1-N-57 - Eleição Suplementar de Turvelândia	Concluído	100	CSEL	PRES
PDI-22-R1-N-63 - Eleitor do Futuro: Prefeito Estudantil - UNIALFA	Concluído	100	CSEL	DG
PDI-22-R1-N-64 - Eleitor do Futuro: Escola Municipal - Godofredo Perfeito - Ipameri - GO	Concluído	100	CSEL	DG
PDI-22-R1-N-65 - Eleitor do Futuro: 10 Escolas - Vereador Mirim	Concluído	100	CSEL	DG
PDI-22-R1-N-68 - Eleitor do Futuro: CEPI Maria Rosilda Rodrigues (Eleição Simulada das Personalidades Goianas)	Concluído	100	CSEL	DG
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Concluído	100	AGSTI	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Concluído	100	AGSTI	ÓRGÃOS EXTERNOS

16 itens

## 8. Detalhamento dos projetos

### ELE24-24-R1-04 - Envio das urnas eletrônicas

Descrição
SEI nº 24.0.000012742-2

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	08/jul/24	08/jul/24	06/set/24		CSEL	STI	90

Atividade	Situação
Planejamento de Urnas para as Eleições 2024 - Qtde por Zona Eleitoral	Concluído
Planejamento de Rotas de Distribuição das Urnas para as Eleições 2024	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 1 (A-B-C-D) - Qtde UE: 153+159+177+158	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 2 - Qtde UE: 586	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 3 - Qtde UE: 598	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 4 - Qtde UE: 538	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 5 - Qtde UE: 602	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 6 - Qtde UE: 512	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 7 (A-B) - Qtde UE: 167+168	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 8 (A-B) - Qtde UE: 166+165	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 9 - Qtde UE: 599	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 10 - Qtde UE: 516	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 11 (A-B) - Qtde UE: 192+205	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 12 - Qtde UE: 478	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 13 - Qtde UE: 527	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 14 (A-B) - Qtde UE: 181+181	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 15 - Qtde UE: 448	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 16 - Qtde UE: 464	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 17 (A-B) - Qtde UE: 154+99	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 18 (A-B) - Qtde UE: 162+263	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 19 (A-B-C) - Qtde UE: 473+125+138	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 20 - Qtde: 495	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 21 - Qtde: 180	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 22 - Qtde: 498+124	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 23 - Qtde: 478	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 24 - Qtde: 168	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 25 - Qtde: 66	Concluído
Distribuição das Urnas - ROTA 26 - Qtde: 284	Não iniciado
Distribuição das Urnas - ROTA 27 - Qtde: 1.026	Não iniciado

### ELE24-24-R1-01 - SNTOTUE2024 - Simulado Nacional de Totalização e Ecosistema da Urna 2024

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	05/ago/24	05/ago/24	09/set/24		CSEL		70

Atividade	Situação
-----------	----------

1º Turno - Criação do Processo Eleitoral, Arquivos Intercad e Geração de massa de candidatos	Concluído
1º Turno - Importação do processo eleitoral, eleições e publicações.	Concluído
1º Turno - Autorização no Odin3 - TRE (CAND, SISTOT e SEWEB)	Concluído
1º Turno - Autorização no Odin3 - Zonas Eleitorais (CAND, SISTOT)	Concluído
1º Turno - Configuração de Agregação e TTEs no ELO	Concluído
1º Turno - Geração de Dados do Cadastro ( chamado via e-mail 8800@tse.jus.br com cópia para seint@tse.jus.br, solicitando a geração dos demais dados do cadastro)	Concluído
1º Turno - Importação de dados do Sistot (seção e candidatos) e validação no Simon	Concluído
1º Turno - Importação dos dados no GEDAI-UE.	Concluído
1º Turno - Carga nas Seções Eleitorais e Votação	Concluído
1º Turno - Geração de mídias	Concluído
1º Turno - Transmissão de correspondência (TODAS via SEWEB e depois as seções de urna)	Concluído
1º Turno - Gerar (TODOS) os arquivos de urna (RDV, BU, Log, Imagem, Cadastro, Hash)	Concluído
1º Turno - Transmissão dos Arquivos (BUs e BUJs) Atenção: Primeiro os das Urnas	Concluído
1º Turno - Totalização PARCIAL - AUTOMÁTICA (Tratamento: caso seja enviado um BU de SEWEB onde já existe um BU de urna, tratar excluindo o BU do SEWEB.)	Concluído
1º Turno - Totalização FINAL - MANUAL - ZE (Emitir Relatório de Totalização)	Concluído
1º Turno - Migração para o 2º Turno	Concluído
2º Turno - Autorização no Odin3 - TRE (CAND, SISTOT e SEWEB)	Concluído
2º Turno - Importação de dados do Sistot (seção e candidatos) e validação no Simon	Em andamento
2º Turno - Importação dos dados no GEDAI-UE.	Não iniciado
2º Turno - Geração de mídias	Não iniciado
2º Turno - Carga nas Seções Eleitorais e Votação	Não iniciado
2º Turno - Transmissão de correspondência (TODAS via SEWEB e depois as seções de urna)	Não iniciado
2º Turno - Gerar (TODOS) os arquivos de urna (RDV, BU, Log, Imagem, Cadastro, Hash)	Não iniciado
2º Turno - Transmissão dos Arquivos (BUs e BUJs) Atenção: Primeiro os das Urnas	Não iniciado
2º Turno - Totalização PARCIAL - AUTOMÁTICA (Tratamento: caso seja enviado um BU de SEWEB onde já existe um BU de urna, tratar excluindo o BU do SEWEB.)	Não iniciado
2º Turno - Totalização FINAL - MANUAL - ZE (Emitir Relatório de Totalização)	Não iniciado

## ELE24-24-R1-06 - Geração de Mídias

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Não iniciado	18/set/24		27/set/24		CSEL		

Atividade	Situação
Instalação dos Sistemas Eleitorais (SIS, Lista Pública, Java, Certificados P12, Holocron, GEDAI, PADA, FlashBackup, Transportador Desktop)	Não iniciado
Geração das Mídias dos Municípios (Suporte Remoto)	Não iniciado
Geração das Mídias de Anápolis e Aparecida de Goiânia	Não iniciado
Geração das Mídias de Goiânia	Não iniciado

**ELE24-24-R1-05 - Carga e Lacre das Urnas**

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Não iniciado	23/set/24		02/out/24		CSEL		

Atividade	Situação
Carga de Goianésia	Não iniciado
Carga de Uruaçu	Não iniciado
Carga de Niquelândia	Não iniciado
Carga de Rio Verde	Não iniciado
Carga de Mineiros	Não iniciado
Carga de Jataí	Não iniciado
Carga de Planaltina	Não iniciado
Carga de Águas Lindas de Goiás	Não iniciado
Carga de Santo Antônio do Descoberto	Não iniciado
Carga de Formosa	Não iniciado
Carga Cidade Ocidental	Não iniciado
Carga de Valparaíso de Goiás	Não iniciado
Carga de Luziânia	Não iniciado
Carga de Novo Gama	Não iniciado
Carga de Itumbiara	Não iniciado
Carga de Catalão	Não iniciado
Carga de Caldas Novas	Não iniciado
Carga de Anápolis	Não iniciado
Carga de Aparecida de Goiânia	Não iniciado
Carga de Goiânia	Não iniciado
Carga do 1º Dia	Não iniciado
Carga do 2º Dia	Não iniciado
Carga do 3º Dia	Não iniciado
Carga do 4º Dia	Não iniciado
Carga do 5º Dia	Não iniciado

**ELE24-24-R1-03 - TDTOT2024-VI - 6º Teste de Desempenho da Totalização 2024**

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Não iniciado	06/set/24		08/set/24		CSEL		

**PDI-24-R1-05 - Desenvolvimento de nova versão do sistema Siapexo**

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
A priorizar					CESCO	SAO	10

<b>Atividade</b>	<b>Situação</b>
Planejamento	Não iniciado
Levantamento de requisitos	Não iniciado
Criação e configuração dos ambientes de desenvolvimento, teste e homologação	Não iniciado
Implementação das funcionalidades priorizadas	Não iniciado
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

## **PDI-22-R1-N-66 - Desenvolvimento de Sistema de Diplomação**

<b>Descrição</b>
Será agendada reunião com a equipe do TSE para verificar a possibilidade de integração do diploma no DivulgaCand.

<b>Situação</b>	<b>Início previsto</b>	<b>Início real</b>	<b>Término previsto</b>	<b>Término real</b>	<b>Unidade responsável</b>	<b>Unidade demandante</b>	<b>Execução%</b>
Em andamento	10/mai/24	10/mai/24	14/out/24		CESCO	STI	10

<b>Atividade</b>	<b>Situação</b>
Planejamento	Em andamento
Levantamento de requisitos	Em andamento
Criação e configuração dos ambientes de desenvolvimento, teste e homologação	Não iniciado
Implementação das funcionalidades priorizadas	Não iniciado
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

<b>Observações</b>
TSE não planeja a disponibilização do diploma diretamente no DivulgaCand. Deverá ser desenvolvida aplicação própria deste TRE.

## **PDI-22-R1-N-62 - Implantação do Sistema SERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social**

<b>Descrição</b>
SEI nº: 24.0.000000946-2

<b>Situação</b>	<b>Início previsto</b>	<b>Início real</b>	<b>Término previsto</b>	<b>Término real</b>	<b>Unidade responsável</b>	<b>Órgão demandante</b>	<b>Execução%</b>
Em homologação	10/jun/24	10/jun/24	14/ago/24		CESCO	TRE-GO	80

<b>Atividade</b>	<b>Situação</b>
Planejamento	Concluído

Levantamento de requisitos	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Realização de testes pela equipe técnica	Concluído
Homologação do produto	Em homologação
Disponibilização em ambiente de produção	Em andamento

<b>Observações</b>
Equipe trabalhando na adequação e instalação do sistema no ambiente do TRE-GO. A versão disponibilizada não foi preparada pelo TRE-SP para se disponibilizada para outros TREs. O término previsto foi alterado para 14/08/2024, após esse período não haverá a necessidade do sistema.

## **PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle**

<b>Descrição</b>
SEI nº: 24.0.000003648-6 (para capacitação nas ferramentas de segurança da Oracle)
A implantação de ferramentas de segurança e proteção em um SGDB Oracle é fundamental para proteger os dados críticos de uma organização. Tem como objetivo principal garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados armazenados no banco de dados.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jun/23	01/jun/23	19/dez/24		CESCO	STI	30

Atividade	Situação
Instalação/ativação da feature	Concluído
Implementação das primeiras funcionalidades	Não iniciado
Testes em ambiente real	Em andamento
Aplicação em ambiente virtual	Em andamento
Estudos sobre as funcionalidades	Em andamento

<b>Observações</b>
Será agendada uma reunião com a ASPLAN para definição da classificação dos dados a serem protegidos no escopo do projeto. O curso para equipe da SEAID agendado para o período de 24/06 à 05/07 foi concluído.

## **PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede sem fio**

<b>Descrição</b>
SEI nº 23.0.000003147-0
Aquisição de Solução de rede cabeada (LAN) e sem fio (Wi-fi) com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral.
Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	28/fev/23	28/fev/23	19/dez/24		CINF	STI	60

Atividade	Situação
Elaboração do DOD.	Concluído
Elaboração do ETP.	Concluído
Elaboração do TR.	Em andamento
Adequação das especificações e coleta de preços estimativos.	Em andamento
Processo de licitação.	Não iniciado
Execução da ARP.	Não iniciado
Implementação da solução.	Não iniciado

## PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Descrição
<a href="http://wp.tre-go.jus.br/">http://wp.tre-go.jus.br/</a>

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento		07/nov/22	19/dez/24		CESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS	50

Atividade	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela equipe de desenvolvimento	Em andamento
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
A demanda foi incluída pela STI no Plano de Gestão 2024-2026. As páginas estáticas foram migradas. Em fase de importação dos documentos. A demanda necessita de uma comissão multidisciplinar com representantes das áreas de negócio para gerir o projeto.

## PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto

Descrição
SEI nº: 24.0.000007445-0
<b>Adoção de um sistema de votação online</b>
E-voto desenvolvido pelo TRE-SC.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/mai/24	01/mai/24	20/set/24		CESCO	EJE	30

Atividade	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Em andamento
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

5 itens

Observações
<p>O técnico do TRE-SC que desenvolveu o sistema será convidado para fornecer suporte na véspera e no dia da Eleição da OAB, considerando que a tecnologia React utilizada no desenvolvimento do sistema não é o padrão adotado pelo TRE-GO e não há técnico com conhecimento no referido framework. Realizaram-se várias intervenções junto ao Coordenador da STI, do TRE-SC, responsável pelo eVoto, após as intervenções foi realizada reunião entre as equipes técnicas. O TRE-SC preparou e disponibilizou os fontes e o projeto do sistema em 26/07/2024, pois a versão disponibilizada anteriormente não estava em condições de ser implantada. O término previsto foi alterado para 20/09/2024.</p>

### PDI-24-R1-06 - Implantação do SEI Federação

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Não iniciado					CESCO		

Atividade	Situação
Planejamento	Não iniciado
Criação e configuração do ambiente de testes	Não iniciado
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

### PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	19/ago/24	19/ago/24			CESCO	STI	10

Atividade	Situação
Planejamento	Em andamento
Criação e configuração do ambiente de testes em nuvem	Em andamento
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

## PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI

Descrição
SEI: 23.0.000016671-5

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	16/fev/24	16/fev/24	30/ago/24		CESCO	DG	80

Atividade	Situação
Planejamento	Concluído
Levantamento de requisitos	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Realização de testes pela equipe técnica	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
A CESCO encaminhará o SEI para a COAD para definição das classes processuais que deverão constar no módulo de peticionamento externo. O término previsto foi adiado para o dia 30/08/2024. Aguardando o encaminhamento do SEI para manifestação da COAD.

## PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO

Descrição
SEI: 22.0.000012173-1

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	04/mar/24	04/mar/24	30/abr/24		STI	SAO	90

Atividade	Situação
Planejamento	Concluído
Criação de serviços da SAO	Concluído
Configuração do fluxo de atendimento	Concluído
Homologação do ambiente	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Em andamento

Observações
O SEI nº 22.0.000012173-1 foi encaminhado à unidade demandante para homologação.

## PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)

**Descrição**

Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal.

Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	29/abr/22	29/abr/22	26/abr/24		CESCO	SAO	90

Atividade	Situação
Planejamento	Concluído
Análise de requisitos	Concluído
Desenvolvimento funcionalidades	Concluído
Testes de funcionalidades	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Em andamento

**Observações**

Em fase de elaboração do termo de homologação para envio à unidade demandante;  
O término previsto foi alterado para 26/04/2024.

**PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições****Descrição**

SEI 21.0.000003441-7

Desenvolvimento (Finalização) de Sistema de Substituição de Servidores, que envolve o processo indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança (FC) e Cargos Comissionados (CJ), por prazo determinado ou indeterminado.

Visa automatizar o processo de indicação e deferimento de substituições de cargos de direção, chefia e assessoramento no Tribunal

**Meta:** Automação do processo de indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança e Cargos Comissionados até setembro/2022.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	27/abr/22	27/abr/22	31/jan/24		CESCO	SGP	90

Atividade	Situação
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Planejamento	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Homologação do produto	Em andamento

**Observações**

Os ajustes solicitados pela SGP foram concluídos. Os testes visando a homologação do sistema foram retomados.

## **PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE**

<b>Descrição</b>
SEI: 24.0.000003403-3
Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online dos servidores ao seu próprio dossiê funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável.

<b>Situação</b>	<b>Início previsto</b>	<b>Início real</b>	<b>Término previsto</b>	<b>Término real</b>	<b>Unidade responsável</b>	<b>Unidade demandante</b>	<b>Execução%</b>
Em homologação	07/jan/21	07/jan/21	29/mar/24		CESCO	SGP	90

<b>Atividade</b>	<b>Situação</b>
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

<b>Observações</b>
Aguardando homologação do sistema pela SGP.

## **ENS-24-R1-01 - Implementação dos planos de ação pós-avaliação do CISControls**

<b>Descrição</b>
SEI: 24.0.000006319-0

<b>Situação</b>	<b>Início previsto</b>	<b>Início real</b>	<b>Término previsto</b>	<b>Término real</b>	<b>Unidade responsável</b>	<b>Unidade demandante</b>	<b>Execução%</b>
Não iniciado					ACIBER, CESCO, CINF	STI	

<b>Atividade</b>	<b>Situação</b>
Planejamento	Não iniciado
Elaboração dos planos de ação	Não iniciado
Execução das atividades definidas	Não iniciado

## **ENS-24-R1-02 - Execução da ARP TSE nº 2/2023 - Avaliação de vulnerabilidade**

<b>Descrição</b>
------------------

SEI: 23.0.000017605-2

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento					ACIBER, CESCO, CINF	STI	

Atividade	Situação
Planejamento e levantamento de atividades	Em andamento
Abertura da ordem de serviço nº 1	Em andamento

### ENS-24-R1-03 - Implementação de Política de Gestão de Dados no âmbito da STI

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Não iniciado					AGSTI, CESCO, CINF, CSEL, STI	STI	

Atividade	Situação
Planejamento	Não iniciado
Elaboração da minuta do documento normativo	Não iniciado
Mapeamento do processo de trabalho	Não iniciado
Aprovação do documento normativo	Não iniciado
Implantação do documento normativo	Não iniciado

### ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software

Descrição
SEI nº: 23.0.000004358-3 Possui o intuito de estabelecer padrões de segurança no desenvolvimento de software.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/24		CESCO	STI	90

Atividade	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Aprovação do normativo pela Diretoria Geral	Em andamento

Observações
Aguardando aprovação pela Diretoria Geral.

## PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

<p><b>Descrição</b></p> <p><b>Objetivo da demanda:</b>          Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.</p> <p><b>Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):</b>          A falta catalogação dos ativos de TI, tanto <i>hardware</i> quanto <i>software</i>, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataque cibernéticos de qualquer natureza.</p> <p><b>Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?</b>          Gestão de TI e apoio à Governança          Desenvolvimento e administração de soluções de TIC          Gestão de infraestrutura de TIC          Suporte técnico das soluções de TIC</p> <p><b>Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):</b>          1. Visibilidade de todo o parque de <i>hardware</i> do Tribunal.          2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional.          3. Visibilidade de todos os <i>softwares</i> em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.</p> <p><b>Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):</b>          Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados          Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados.          Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026</p> <p><b>Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):</b></p> <p><b>Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?</b>          Não</p> <p><b>Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:</b></p> <p><b>Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):</b>          Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em <i>Software</i> Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.</p>
--

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	18/out/24		CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	80

Atividade	Situação
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Aquisição da solução	Concluído
Implementação de protocolo seguro SNMP com https no OCS.	Concluído
Instalação e configuração da solução	Concluído
Implantação	Em andamento

Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	Em andamento
---	--------------

<b>Observações</b>
O término previsto foi alterado para 18/10/2024 em razão do envolvimento das equipes técnicas nas atividades do período eleitoral.

### PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/24		19/dez/23		CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	40

Atividade	Situação
Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ Resolução 335/2020 na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados	Em andamento
Elaboração do Termo de Referência	Em andamento

### PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33

Descrição
<p><b>SEI: 24.0.000006783-7</b></p> <p>ENTIC-JUD: <a href="https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706">https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706</a></p> <p>Art. 33. Os sistemas de informação deverão atender a padrões de interoperabilidade e outros que venham a ser recomendados pelo Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.</p> <p>Parágrafo único. Os novos sistemas de informação deverão atender aos seguintes requisitos:</p> <p>I - ser portáteis e interoperáveis;</p> <p>II - ser disponíveis para dispositivos móveis e responsivos;</p> <p>III - possuir documentação atualizada;</p> <p>IV - oferecer suporte para assinatura baseado em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil);</p> <p>V - atender ao Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), do Governo Federal.</p> <p>VI - recomenda-se o uso de sistemas de informação já desenvolvidos, disseminados e experimentados no âmbito do Poder Judiciário.</p> <p>VII - recomenda-se o uso do Repositório Nacional para disseminação de boas práticas e compartilhamento de soluções colaborativas de TIC.</p>

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS	90

Atividade	Situação
-----------	----------

Reformular ou readequar o processo de desenvolvimento de software	Em homologação
---	----------------

<b>Observações</b>
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.

**PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas**

<b>Descrição</b>
SEI: 24.0.000006783-7

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS	90

<b>Atividade</b>	<b>Situação</b>
Definir modelos de contrato de aquisição e de desenvolvimento de software em que constem cláusula que determine o depósito da documentação dos sistemas, além dos requisitos de direitos autorais etc	Em homologação

<b>Observações</b>
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.

**PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020**

<b>Descrição</b>
SEI: 24.0.000006783-7
<a href="https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496">https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496</a>

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS	90

<b>Atividade</b>	<b>Situação</b>
Participar de curso oferecido pelo CNJ	Concluído
Adequar os padrões de desenvolvimento e a arquitetura de sistemas do Tribunal aos padrões estabelecidos na Res. 335/2020 (PDPJ), justificando a adoção de arquiteturas alternativas, se for o caso	Em homologação

<b>Observações</b>
--------------------

O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.

## PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD

### Descrição

SEI: 24.0.000006783-7

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação		09/ago/22	30/abr/24		CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS	90

Atividade	Situação
Análise dos requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Concluído
Elaborar / Revisar processo de aquisição/desenvolvimento de software, conforme a ENTIC-JUD.	Em homologação

### Observações

O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 03/09/2024, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 03/09/2024, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 04/09/2024, às 10:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **AUGUSTO CÉSAR DE CASTRO OVELAR, COORDENADOR(A)**, em 06/09/2024, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 26/11/2024, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0903202** e o código CRC **821AD254**.
