



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
PRAÇA CÍVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiânia - GO - www.tre-go.jus.br

ATA

REUNIÃO CTGTI - 21/2024

1. Identificação

Data: 26/11/2024	Início: 14:38 Término: 16 :00	Local: Sala de reunião da STI
Finalidade: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2024		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados.


5. Participantes

Nome	Cargo	Email
Augusto César de Castro Ovelar	Coordenador de Sistemas Corporativos	augusto.overlar@tre-go.jus.br
Frank Wendell Ribeiro	Secretário de Tecnologia da Informação	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	Coordenador de Sistemas Eleitorais	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Marcilio Zaccarelli Bersaneti	Coordenador de Infraestrutura	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	Assessor de Planejamento, Governança e Gestão - Substituto	paulo.taira@tre-go.jus.br


6. Encaminhamentos

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas;
- A próxima reunião foi agendada para o dia 10/12/2024 às 14:30.

7. Portfólio de projetos

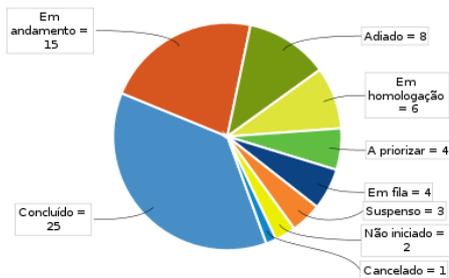

Total: 68 . Gráfico por: Status

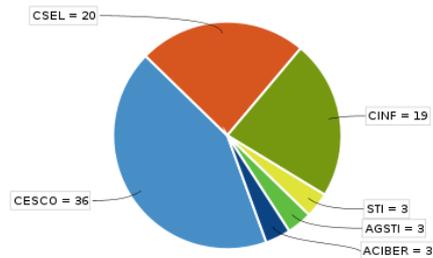

Total: 68 . Gráfico por: Unidade responsável

7.1. Programa: Suporte às Eleições 2024 (ELE24) - Projetos Não iniciados/Em Andamento/Em Homologação

Projeto	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
ELE24-24-R1-07 - Recolhimento das Urnas Eletrônicas	Em andamento	10	CSEL	STI

7.2. Programa: Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos Não iniciados/Em Andamento/Em Homologação

Projeto	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO	SGP
PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto	Em andamento	80	CESCO	EJE
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em homologação	90	CESCO	SAO
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	50	CESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	30	CESCO	STI
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI	Em andamento	80	CESCO	DG
PDI-22-R1-N-66 - Desenvolvimento de Sistema de Diplomação	Em andamento	90	CESCO	STI
PDI-22-R1-N-67 - Implantação do sistema Atena	Em andamento	90	CESCO	SJD
PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes	Em andamento	10	CESCO	STI
PDI-24-R1-07 - Eleição da Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar de GO e DF	Em andamento	20	CSEL	DG

PDI-24-R1-08 - Eleição suplementar de Castelândia	Em andamento	70	CSEL	DG
PDI-24-R1-09 - Reabertura do Cadastro Eleitoral	Em andamento	10	CINF, CSEL	STI
PDI-24-R1-10 - Implantação da ferramenta Varonis	Em andamento	80	CINF	STI

13 itens

7.3. Programa: Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos Não iniciados/Em Andamento/Em Homologação

Projeto	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
ENS-24-R1-01 - Implementação dos planos de ação pós-avaliação do CISControls	Não iniciado		ACIBER, CESCO, CINF	STI
ENS-24-R1-03 - Implementação de Política de Gestão de Dados no âmbito da STI	Não iniciado		AGSTI, CESCO, CINF, CSEL, STI	STI

2 itens

7.4. Programa: Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos Não iniciados/Em Andamento/Em Homologação

Projeto	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Em homologação	90	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	30	CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Em homologação	90	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Em andamento	70	CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Em homologação	90	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Em homologação	90	CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	80	CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS

7 itens

7.5. Projetos adiados, a priorizar e suspensos

Projeto	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
PDI-24-R1-01 - Implementação da nova Legislação Compilada, com as melhorias acrescentadas pelo TSE	A priorizar		CESCO	SGI

PDI-24-R1-02 - Criar a Central de Atendimento Virtual ao Eleitor (CAVE)	A priorizar		CESCO	VPCRE
PDI-24-R1-03 - Plenário Virtual	A priorizar		CESCO	SJD
PDI-24-R1-05 - Desenvolvimento de nova versão do sistema Siapexo	A priorizar	10	CESCO	SAO
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40	CESCO, CINF	STI
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70	ACIBER, CESCO, CINF	STI
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40	CINF	STI
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Adiado	40	CINF	STI
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Adiado	90	CINF, STI	STI
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Adiado	80	CESCO, CINF	STI
PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO	Adiado	90	STI	SAO
PDI-22-R1-N-33 - Reparcelamento da rede sem fio	Adiado	60	CINF	STI
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Suspenso	10	CESCO	SGP
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Suspenso	30	CESCO	VPCRE
PDI-24-R1-06 - Implantação do SEI Federação	Suspenso		CESCO	SJD

15 itens

7.6. Projetos em fila

Projeto	Situação	Unidade responsável	Unidade demandante
PDI-21-R1-22 - SIS07 - Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Licenças Médicas	Em fila	CESCO	SGP
PDI-22-R1-05 - Implantar Banco de Talentos (Portal TSE)	Em fila	CESCO	SGP
PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos	Em fila	CESCO	EJE
PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição	Em fila	CESCO	PRES, SGP

4 itens

7.7. Projetos/macro atividades em andamento com término previsto de até 60 dias

Projeto	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante	Término previsto
PDI-24-R1-08 - Eleição suplementar de Castelândia	Em andamento	70	CSEL	DG	29/nov/24
PDI-22-R1-N-66 - Desenvolvimento de Sistema de Diplomação	Em andamento	90	CESCO	STI	29/nov/24
PDI-24-R1-09 - Reabertura do Cadastro Eleitoral	Em andamento	10	CINF, CSEL	STI	13/dez/24
PDI-24-R1-10 - Implantação da ferramenta Varonis	Em andamento	80	CINF	STI	19/dez/24
PDI-24-R1-07 - Eleição da Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar de GO e DF	Em andamento	20	CSEL	DG	19/dez/24

PDI-22-R1-N-67 - Implantação do sistema Atena	Em andamento	90	CESCO	SJD	19/dez/24
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	30	CESCO	STI	19/dez/24
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	50	CESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS	19/dez/24
PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votantet/E-voto	Em andamento	80	CESCO	EJE	19/dez/24
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	30	CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	19/dez/24

10 itens

7.8. Projetos concluídos

Projeto	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante
ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas	Concluído	100	CSEL	STI
ELE24-22-R1-05 - Infraestrutura para o fechamento do cadastro 2024	Concluído	100	CINF	DG
ELE24-22-R1-06 - Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2024	Concluído	100	CSEL	DG
ELE24-22-R1-07 - 14º Simulado Nacional de Hardware (14SNH)	Concluído	100	CSEL	DG
ELE24-24-R1-01 - SNTOTUE2024 - Simulado Nacional de Totalização e Ecosistema da Urna 2024	Concluído	100	CSEL	STI
ELE24-24-R1-02 - TDTOT2024-V - 5º Teste de Desempenho da Totalização 2024	Concluído	100	CSEL	STI
ELE24-24-R1-03 - TDTOT2024-VI - 6º Teste de Desempenho da Totalização 2024	Concluído	100	CSEL	STI
ELE24-24-R1-04 - Envio das urnas eletrônicas	Concluído	100	CSEL	STI
ELE24-24-R1-05 - Carga e Lacre das Urnas	Concluído	100	CSEL	STI
ELE24-24-R1-06 - Geração de Mídias	Concluído	100	CSEL	STI
ELE24-24-R1-08 - Apuração e Totalização	Concluído	100	CSEL	DG
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Concluído	100	CESCO	STI
ENS-22-R1-08 - Solução de Antivirus	Concluído	100	CINF	STI
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Concluído	100	CINF	STI
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Concluído	100	CINF	STI
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Concluído	100	CESCO	SGP
PDI-22-R1-N-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS)	Concluído	100	CESCO	DG
PDI-22-R1-N-57 - Eleição Suplementar de Turvelândia	Concluído	100	CSEL	PRES
PDI-22-R1-N-62 - Implantação do Sistema CERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social	Concluído	100	CESCO	SJD

PDI-22-R1-N-63 - Eleitor do Futuro: Prefeito Estudantil - UNIALFA	Concluído	100	CSEL	DG
PDI-22-R1-N-64 - Eleitor do Futuro: Escola Municipal - Godofredo Perfeito - Ipameri - GO	Concluído	100	CSEL	DG
PDI-22-R1-N-65 - Eleitor do Futuro: 10 Escolas - Vereador Mirim	Concluído	100	CSEL	DG
PDI-22-R1-N-68 - Eleitor do Futuro: CEPI Maria Rosilda Rodrigues (Eleição Simulada das Personalidades Goianas)	Concluído	100	CSEL	DG
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Concluído	100	AGSTI	ÓRGÃOS EXTERNOS
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Concluído	100	AGSTI	ÓRGÃOS EXTERNOS

25 itens

8. Detalhamento dos projetos

PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE

Descrição							
SEI: 24.0.000003403-3 Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online dos servidores ao seu próprio dossiê funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/21	07/jan/21	29/mar/24		CESCO	SGP	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
Aguardando homologação do sistema pela SGP.	

PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto

Descrição							
SEI nº: 24.0.000007445-0 Adoção de um sistema de votação online E-voto desenvolvido pelo TRE-SC.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/mai/24	01/mai/24	19/dez/24		CESCO	EJE	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
Em homologação pela unidade demandante.

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)

Descrição							
Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal. Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	29/abr/22	29/abr/22	26/abr/24		CESCO	SAO	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Análise de requisitos	Concluído
Desenvolvimento funcionalidades	Concluído
Testes de funcionalidades	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Em andamento
Observações	
Em fase de elaboração do termo de homologação para envio à unidade demandante; O término previsto foi alterado para 26/04/2024.	

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Descrição							
http://wp.tre-go.jus.br/							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento		07/nov/22	19/dez/24		CESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS	50

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela equipe de desenvolvimento	Em andamento
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
A demanda necessita de uma comissão multidisciplinar com representantes das áreas de negócio para gerir o projeto.	

PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle

Descrição
SEI nº:* 24.0.000003648-6 (para capacitação nas ferramentas de segurança da Oracle) A implantação de ferramentas de segurança e proteção em um SGDB Oracle é fundamental para proteger os dados críticos de uma organização. Tem como objetivo principal garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados armazenados no banco de dados.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jun/23	01/jun/23	19/dez/24		CESCO	STI	30

Atividades	Situação
Instalação/ativação da feature	Concluído
Implementação das primeiras funcionalidades	Não iniciado
Testes em ambiente real	Em andamento
Aplicação em ambiente virtual	Em andamento
Estudos sobre as funcionalidades	Em andamento
Observações	
Será agendada uma reunião com a ASPLAN para definição da classificação dos dados a serem protegidos no escopo do projeto.	

PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI

Descrição							
SEI: 23.0.000016671-5							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	16/fev/24	16/fev/24	28/mar/25		CESCO	DG	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Levantamento de requisitos	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Realização de testes pela equipe técnica	Em andamento
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
O módulo de peticionamento desenvolvido pela Anatel apresenta vulnerabilidades. Vários TRES e o TSE deixaram de utilizá-lo. A equipe da CESCO está testando solução que está em desenvolvimento no TSE para o peticionamento. O sistema retornou para o status Em andamento em razão dos motivos acima. O término previsto foi alterado para 28/03/2025.	

PDI-22-R1-N-66 - Desenvolvimento de Sistema de Diplomação

Descrição							
Será agendada reunião com a equipe do TSE para verificar a possibilidade de integração do diploma no DivulgaCand.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	10/mai/24	10/mai/24	29/nov/24		CESCO	STI	90

Atividades	Situação
Planejamento	Em andamento
Levantamento de requisitos	Em andamento
Criação e configuração dos ambientes de desenvolvimento, teste e homologação	Em andamento
Implementação das funcionalidades priorizadas	Em andamento
Realização de testes pela unidade demandante	Em andamento

Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
O sistema será disponibilizado para testes pela equipa da CSEL no dia 14/11. O término previsto foi alterado para 29/11/2024.	

PDI-22-R1-N-67 - Implantação do sistema Atena

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	06/mai/24	06/mai/24	19/dez/24		CESCO	SJD	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente	Em andamento
Realização de testes pela equipe técnica	Em andamento
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
Agendada reunião para o dia 26/11 às 16:00 com a unidade demandante (ASPLAN) para definição das atividades relacionadas à implantação do sistema.	

PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	19/ago/24	19/ago/24	14/mar/25		CESCO	STI	10

Atividades	Situação
Planejamento	Em andamento
Criação e configuração de ambiente de teste interno	Em andamento
Criação e configuração do ambiente de testes em nuvem	Suspenso
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
A reunião que estava agendada para o dia 20/11 entre as equipes da CINF e CESCO será reagendada para a partir do dia 10/12, em razão do comprometimento das equipes com o desenvolvimento do sistema de diplomação.	

PDI-24-R1-06 - Implantação do SEI Federação

Descrição							
SEI: 24.0.000007689-5 Trata-se de um projeto gerenciado pelo TSE, onde existe uma sequência de disponibilização para os Regionais.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Suspenso					CESCO	SJD	

Atividades	Situação
Planejamento	Em andamento

Atualização do SEI para a versão 4.1	Em andamento
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
O projeto foi suspenso pois está aguardando a integração por parte do TSE. O TRE-GO é o 12º da lista a ser atendida pelo TSE.	

PDI-24-R1-07 - Eleição da Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar de GO e DF

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	02/out/24	02/out/24	19/dez/24		CSEL		30

Atividades	Situação
Ofício DG - enviar para o TSE - Confirmação da Eleição Suplementar	Concluído
Planejamento - Logística de Suporte à Eleição	Concluído
Configuração da Eleição - CFE	Concluído
Solicitação Publicação do Processo e Sistemas Eleitorais	Concluído
Solicitação das Senhas Oficiais	Concluído
Liberação de Acesso aos Sistemas	Concluído
Plantão de Suporte aos Sistemas Eleitorais	Em andamento
Suporte ao Registro de Candidaturas	Concluído
Suporte ao Sorteio do Horário Eleitoral	Concluído
Suporte à Agregação de Seções	Concluído
Suporte à TTE (Ex: Mesário)	Concluído
Solicitação da impressão dos Cadernos de Votação	Concluído
Suporte à Convocação de Mesários	Concluído
Fechamento do CAND	Concluído
Preparação das Urnas Eletrônicas	Concluído
Auditoria dos sistemas - Evento de Geração de Mídias (GEDAI, HotSwap, SIS)	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Evento de Carga e Lacre das Urnas	Concluído
Auditoria das Urnas - Evento de Carga e Lacre	Concluído
Suporte à Montagem de Seção	Concluído
Auditoria das Urnas - Evento - Dia da Eleição	Concluído
Suporte à Urna no dia da Eleição	Concluído
Suporte à Transmissão, Apuração e Totalização dos Resultados	Concluído
Suporte à Prestação de Contas	Em andamento
Diplomação dos Candidatos	Em andamento

PDI-24-R1-08 - Eleição suplementar de Castelândia

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	16/set/24	16/set/24	29/nov/24		CSEL		90

Atividades	Situação
------------	----------

Ofício DG - enviar para o TSE - Confirmação da Eleição Suplementar	Concluído
Planejamento - Logística de Suporte à Eleição	Concluído
Configuração da Eleição - CFE	Concluído
Solicitação Publicação do Processo e Sistemas Eleitorais	Concluído
Solicitação das Senhas Oficiais	Concluído
Liberação de Acesso aos Sistemas	Concluído
Plantão de Suporte aos Sistemas Eleitorais	Em andamento
Suporte ao Registro de Candidaturas	Concluído
Suporte ao Sorteio do Horário Eleitoral	Concluído
Suporte à Agregação de Seções	Concluído
Suporte à TTE (Ex: Mesário)	Concluído
Solicitação da impressão dos Cadernos de Votação	Concluído
Suporte à Convocação de Mesários	Concluído
Fechamento do CAND	Concluído
Preparação das Urnas Eletrônicas	Concluído
Auditoria dos sistemas - Evento de Geração de Mídias (GEDAI, HotSwap, SIS)	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Evento de Carga e Lacre das Urnas	Concluído
Auditoria das Urnas - Evento de Carga e Lacre	Concluído
Suporte à Montagem de Seção	Concluído
Auditoria das Urnas - Evento - Dia da Eleição	Concluído
Suporte à Urna no dia da Eleição	Concluído
Suporte à Transmissão, Apuração e Totalização dos Resultados	Concluído
Suporte à Prestação de Contas	Em andamento
Diplomação dos Candidatos	Em andamento

PDI-24-R1-09 - Reabertura do Cadastro Eleitoral

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	21/out/24	21/out/24	13/dez/24		CINF, CSEL		10

Atividades	Situação
Planejamento da Distribuição dos Kit Novos para as 66 Zonas Eleitorais	Concluído
Instalação e Treinamento - Central de Atendimento - Aparecida de Goiânia (ZEs: 119, 132 e 145)	Concluído
Suporte às Zonas Eleitorais na 1ª Semana de Reabertura do atendimento ao eleitor	Concluído
Rota 1 - Distribuição dos Kits Novos (ZEs: 011, 024, 026, 028, 029, 044, 047, 099, 105, 123 e 143)	Em andamento
Rota 2 - Distribuição dos Kits Novos (ZEs: 004, 014, 019, 027, 031, 033, 036 e 087)	Em andamento
Rota 1 - Instalação de 01 kit (ZEs: 011, 024, 026, 028, 029, 044, 047, 099, 105, 123 e 143)	Não iniciado
Rota 2 - Instalação de 01 kit (ZEs: 004, 014, 019, 027, 031, 033, 036 e 087)	Não iniciado
Rota 3 - Distribuição dos Kits Novos (ZEs: 005, 007, 025, 032, 038, 040 e 045)	Não iniciado
Rota 4 - Distribuição dos Kits Novos (ZEs: 018, 020, 021, 043, 046, 066, 068, 096, 097, 106 e 128)	Não iniciado
Rota 1 - Instalação de TODOS os demais KITS (ZEs: 011, 024, 026, 028, 029, 044, 047, 099, 105, 123 e 143)	Não iniciado
Rota 2 - Instalação de TODOS os demais KITS (ZEs: 004, 014, 019, 027, 031, 033, 036 e 087)	Não iniciado

Rota 3 - Instalação de 01 kit (ZEs: 005, 007, 025, 032, 038, 040 e 045)	Não iniciado
Rota 4 - Instalação de 01 kit (ZEs: 018, 020, 021, 043, 046, 066, 068, 096, 097, 106 e 128)	Não iniciado
Rota 5 - Distribuição dos Kits Novos (ZEs: 006, 034, 035, 049, 053, 063, 079 e 102)	Não iniciado
Rota 6 - Distribuição dos Kits Novos (ZEs: 012, 013, 015, 077, 094, 101 e 110)	Não iniciado
Rota 3 - Instalação de TODOS os demais KITs (ZEs: 005, 007, 025, 032, 038, 040 e 045)	Não iniciado
Rota 4 - Instalação de TODOS os demais KITs (ZEs: 018, 020, 021, 043, 046, 066, 068, 096, 097, 106 e 128)	Não iniciado
Rota 5 - Instalação de 01 kit (ZEs: 006, 034, 035, 049, 053, 063, 079 e 102)	Não iniciado
Rota 6 - Instalação de 01 kit (ZEs: 012, 013, 015, 077, 094, 101 e 110)	Não iniciado
Rota 7 - Distribuição dos Kits Novos (ZEs: 017, 039, 041, 050, 072, 074, 076, 085, 088, 125 e 130)	Não iniciado
Rota 5 - Instalação de TODOS os demais KITs (ZEs: 006, 034, 035, 049, 053, 063, 079 e 102)	Não iniciado
Rota 6 - Instalação de TODOS os demais KITs (ZEs: 012, 013, 015, 077, 094, 101 e 110)	Não iniciado
Rota 7 - Instalação de 01 kit (ZEs: 017, 039, 041, 050, 072, 074, 076, 085, 088, 125 e 130)	Não iniciado
Rota 7 - Instalação de TODOS os demais KITs (ZEs: 012, 013, 015, 077, 094, 101 e 110)	Não iniciado
Rota 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 - Instalação dos KITs no Postos de Atendimento e Vapt-Vupt (ZEs: 004, 005, 007, 011, 012, 018, 019, 021, 026, 028, 036, 038, 040, 043, 049, 068, 076, 079, 087, 096, 097 e 101)	Não iniciado

PDI-24-R1-10 - Implantação da ferramenta Varonis

Descrição							
sei nº 23.0.000017600-1							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Órgão demandante	Execução%
Em andamento	06/nov/24	06/nov/24	19/dez/24		CINF	TRE-GO	80

ENS-24-R1-01 - Implementação dos planos de ação pós-avaliação do CISControls

Descrição							
SEI: 24.0.000006319-0							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Não iniciado					ACIBER, CESCO, CINF	STI	

Atividades	Situação
Planejamento	Não iniciado
Elaboração dos planos de ação	Não iniciado
Execução das atividades definidas	Não iniciado

ENS-24-R1-02 - Execução da ARP TSE nº 2/2023 - Avaliação de vulnerabilidade

Descrição							
SEI: 23.0.000017605-2							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Cancelado					ACIBER, CESCO, CINF	STI	

Atividades	Situação
Planejamento e levantamento de atividades	Cancelado
Abertura da ordem de serviço nº 1	Cancelado

Observações
O projeto foi cancelado em razão de demandas das eleições 2024. Realizar o cancelamento dos restos a pagar referente ao empenho 2023.

ENS-24-R1-03 - Implementação de Política de Gestão de Dados no âmbito da STI

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Não iniciado					AGSTI, CESCO, CINF, CSEL, STI	STI	

Atividades	Situação
Planejamento	Não iniciado
Elaboração da minuta do documento normativo	Não iniciado
Mapeamento do processo de trabalho	Não iniciado
Aprovação do documento normativo	Não iniciado
Implantação do documento normativo	Não iniciado

PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD

Descrição							
SEI: 24.0.000006783-7							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação		09/ago/22	30/abr/24		CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS	90

Atividades	Situação
Análise dos requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Concluído
Elaborar / Revisar processo de aquisição/desenvolvimento de software, conforme a ENTIC-JUD.	Em homologação

Observações
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.

PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.

Descrição							
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	19/dez/24		CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	30

Atividades	Situação
Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	Em andamento

Observações
A reunião que estava agendada para o dia 14/11/2024 entre as equipes da CINF e CESCO não ocorreu e será reagendada.

PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020

Descrição

SEI: 24.0.000006783-7 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS	90

Atividades	Situação
Participar de curso oferecido pelo CNJ	Concluído
Adequar os padrões de desenvolvimento e a arquitetura de sistemas do Tribunal aos padrões estabelecidos na Res. 335/2020 (PDPJ), justificando a adoção de arquiteturas alternativas, se for o caso	Em homologação
Observações	
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.	

PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/24		21/fev/25		CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	70

Atividades	Situação
Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ Resolução 335/2020 na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados	Concluído
Elaboração do Termo de Referência	Concluído
Realização da licitação	Em andamento
Observações	
O término previsto foi alterado para 21/02/2025.	

PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas

Descrição							
SEI: 24.0.000006783-7							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS	90

Atividades	Situação
Definir modelos de contrato de aquisição e de desenvolvimento de software em que constem cláusula que determine o depósito da documentação dos sistemas, além dos requisitos de direitos autorais etc	Em homologação
Observações	
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.	

PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33

Descrição

SEI: 24.0.000006783-7

ENTIC-JUD: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706>

Art. 33. Os sistemas de informação deverão atender a padrões de interoperabilidade e outros que venham a ser recomendados pelo Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.

Parágrafo único. Os novos sistemas de informação deverão atender aos seguintes requisitos:

I - ser portáteis e interoperáveis;

II - ser disponíveis para dispositivos móveis e responsivos;

III - possuir documentação atualizada;

IV - oferecer suporte para assinatura baseado em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil);

V - atender ao Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), do Governo Federal.

VI - recomenda-se o uso de sistemas de informação já desenvolvidos, disseminados e experimentados no âmbito do Poder Judiciário.

VII - recomenda-se o uso do Repositório Nacional para disseminação de boas práticas e compartilhamento de soluções colaborativas de TIC.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	ÓRGÃOS EXTERNOS	90

Atividades	Situação
Reformular ou readequar o processo de desenvolvimento de software	Em homologação
Observações	
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.	

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

Descrição
<p>Objetivo da demanda: Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.</p> <p>Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta): A falta catalogação dos ativos de TI, tanto <i>hardware</i> quanto <i>software</i>, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataque cibernéticos de qualquer natureza.</p> <p>Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)? Gestão de TI e apoio à Governança Desenvolvimento e administração de soluções de TIC Gestão de infraestrutura de TIC Suporte técnico das soluções de TIC</p> <p>Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução): 1. Visibilidade de todo o parque de <i>hardware</i> do Tribunal. 2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional. 3. Visibilidade de todos os <i>softwares</i> em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.</p> <p>Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada): Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados. Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026</p> <p>Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico): Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante? Não</p> <p>Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:</p> <p>Custo (Informe a estimativa de custo do projeto): Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em <i>Software</i> Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.</p>

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	28/mar/25		CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Aquisição da solução	Concluído
Implementação de protocolo seguro SNMP com https no OCS.	Concluído
Instalação e configuração da solução	Concluído
Implantação	Concluído
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	Em andamento

Observações
O término previsto foi alterado para o dia 28/03/2025.



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 27/11/2024, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 28/11/2024, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 06/12/2024, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 13/12/2024, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0988268** e o código CRC **B605325E**.
